



nota houdende de principiële beslissing door de betrokken overheden en actoren over het integraal uitvoeringsprogramma voor de Demervallei van Diest tot Rotselaar.

DE VLAAMSE REGERING,

- Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
- Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken
- Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
- Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

BEKKENBESTUUR DEMERBEKKEN

DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

HET COLLEGE VAN BURGERMEESTER EN SCHEPENEN VAN

DE STAD DIEST

DE STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM

DE STAD AARSCHOT


DE GEMEENTE BEGIJNENDIJK

DE GEMEENTE ROTSELAAR



Inhoud

1. Situering
2. Historiek en situering van de voorliggende plannen en projecten
 - op Vlaams niveau
 - op provinciaal niveau
 - op gemeentelijk niveau
 - a. Diest
 - b. Scherpenheuvel-Zichem
 - c. Aarschot
 - d. Begijnendijk
 - e. Rotselaar
3. Visie Demervallei
4. Doelstellingen en krachtlijnen bij het operationaliseren van de visie
5. Uitvoeringsprogramma
6. Overlegstructuur
7. Procedure (fases en mogelijk tijdspad)
8. Communicatiestrategie
9. Beslissing

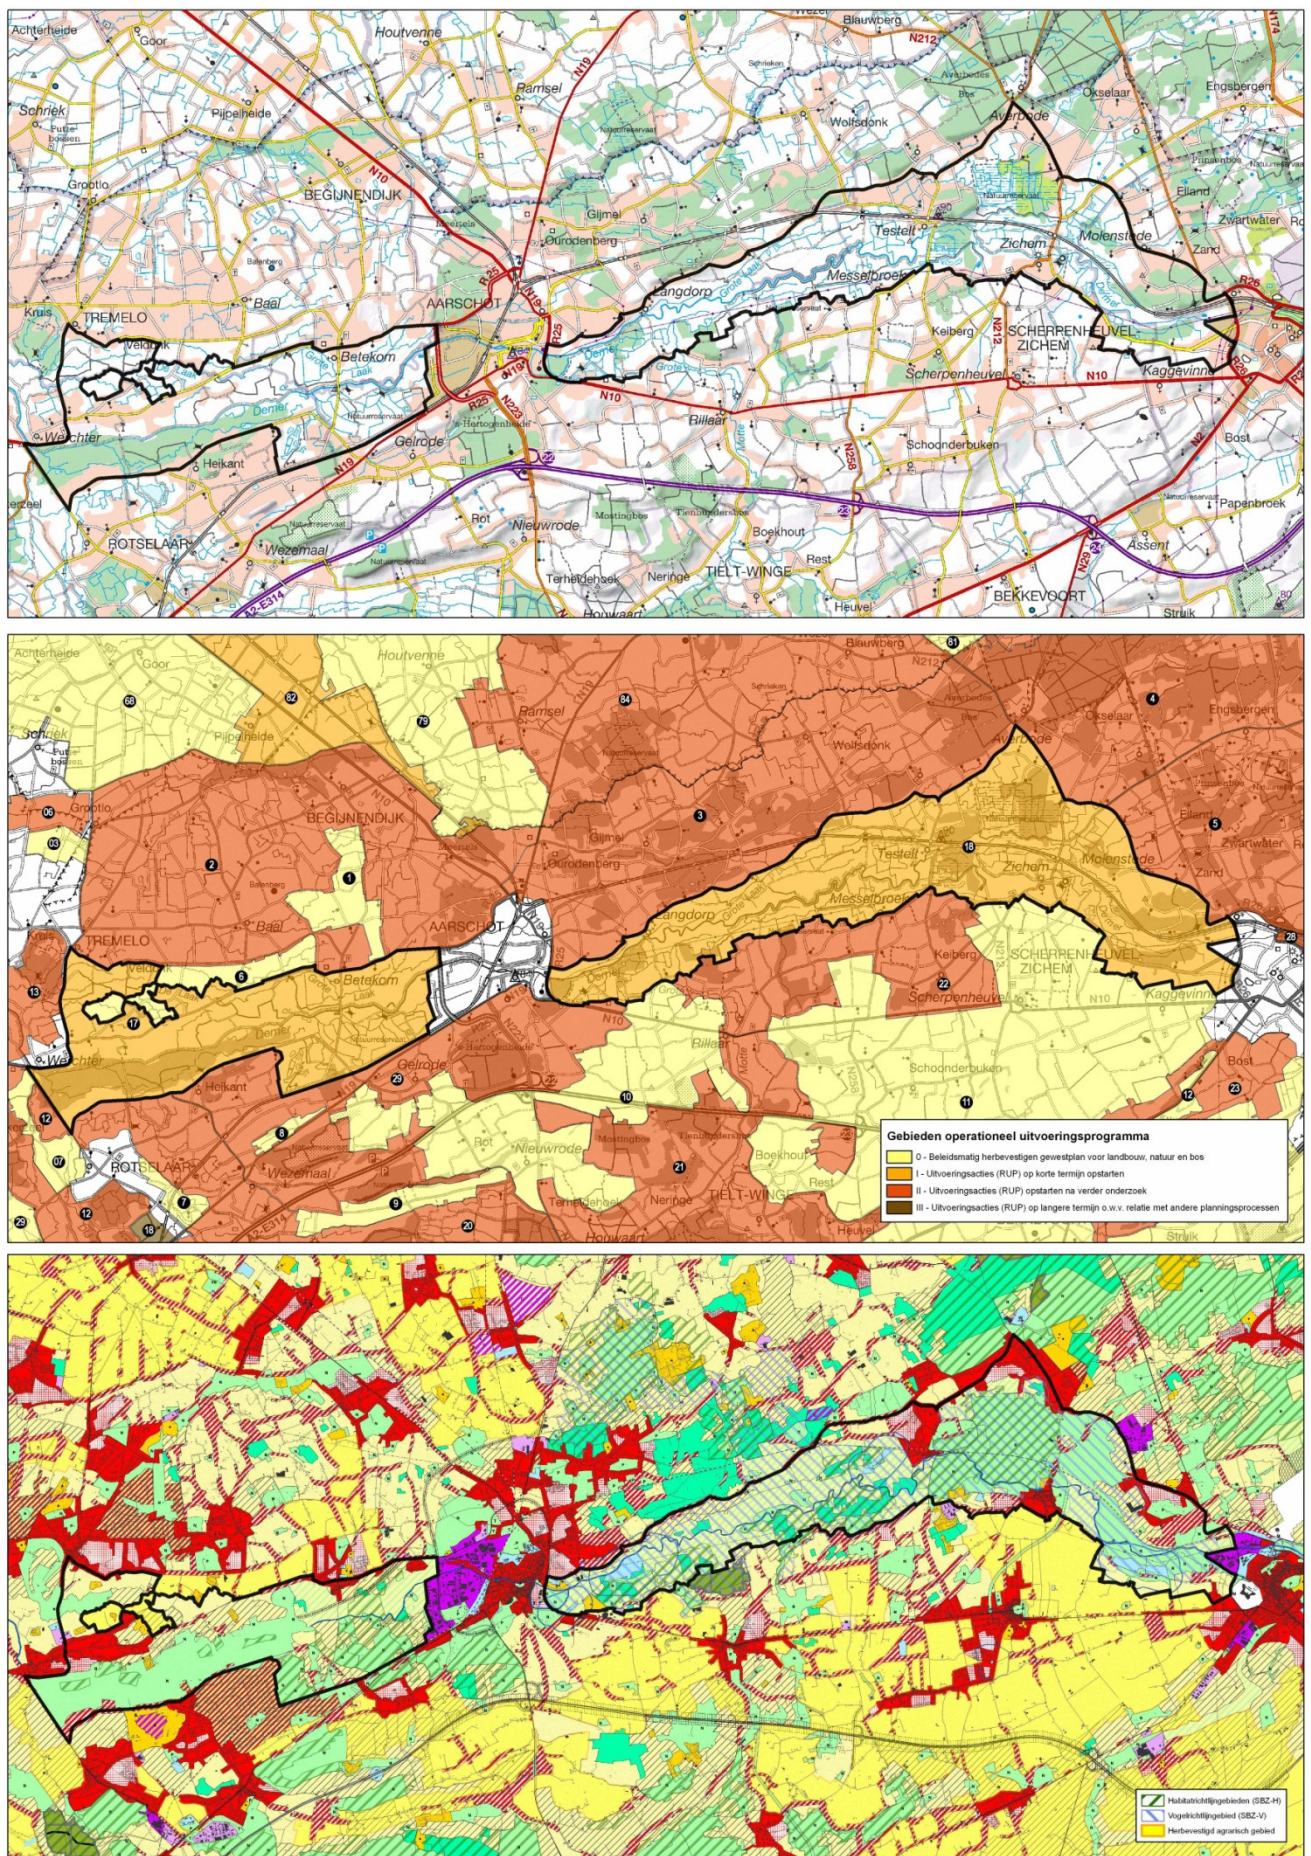

Figuur 1: Situering van het plangebied "Demervallei"

1. Situering

Het plangebied “Demervallei” omvat de vallei van de Demer, gelegen in de gemeenten Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar (zie figuur 1).

In de periode 2005-2010 werden door de verschillende overheden diverse planningsprocessen gevoerd in de Demervallei. Sinds mei 2007 werd het overleg over de verschillende initiatieven gebundeld in het door het Departement RWO, Afdeling Ruimtelijke Planning (RWO-ARP) gesubsidieerde Strategisch Project Demervallei. Sindsdien is er veel werk geleverd in het afstemmen van verschillende beleidsplannen en projecten in de Demervallei.

Op 12 juni 2009 ondertekenden de 5 Demergemeenten, de provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw het zogenaamde Demercharter. Hiermee engageerden de lokale Demeractoren zich om hun projecten en activiteiten in de Demervallei op elkaar af te stemmen en samen te werken rond concrete acties. In dit charter werd afgesproken om concrete jaaractieprogramma's uit te werken.

Op Vlaams niveau werd in het kader van de evaluatie van de wateroverlast in november 2010 het rapport “Globale evaluatie overstromingen 2010” in mei 2011 voorgesteld. Dit rapport bevat concrete maatregelen voor een versnelde uitvoering van projecten ter bestrijding ervan.¹ Concreet werd daarbij ook de relatie gelegd met de werkwijze en principes die in de ‘Visienota voor het versnellen van investeringsprojecten’ worden vooropgesteld.² Hierin werd deelactie 14.82 “Uitvoeren van het Ontwikkelingsplan Demer (OPD)” opgenomen. Initiatiefnemer voor deze actie is W&Z, in samenwerking met ANB voor natuurontwikkeling. De link met de actie A30, 31, 32 uit het bekkenbeheerplan van de Demer werd eveneens gemaakt.

Op 8 oktober 2010 werd de visienota “Versnellen van investeringsprojecten” meegedeeld aan de leden van de Vlaamse Regering, waarin verder gebouwd wordt op de aanbevelingen van de Commissies Berx en Sauwens. In deze visienota wordt voorgesteld om een projectproces 5 processtappen en 3 beslissingsmomenten te laten doorlopen, met name:

- startbeslissing
- voortraject
- voorkeurbesluit
- uitwerking
- projectbesluit.

Voorliggende principiële beslissing kan dan ook worden beschouwd als een “startbeslissing” avant la lettre.

¹ Mededeling aan de Vlaamse Regering van 14 januari 2011, betreffende het eerste evaluatierapport CIW overstromingen 13-16 november 2010.

² Mededeling aan de Vlaamse Regering van 8 oktober 2010 betreffende de “Visienota versnellen van investeringsprojecten”

Met bovenstaande engagementenwerder een breed politiek en maatschappelijk draagvlak opgebouwd om gezamenlijk te werken rond natuur, water, recreatie en andere belangrijke aspecten die in de Demervallei spelen. Gezien het feit dat het Strategisch Project Demervallei het eerste strategisch project is in het buitengebied en dat het de eerste keer is dat de principes voor het versnellen van investeringsprojecten toegepast worden in het buitengebied, kan gesproken worden van een pilootproject, een eerste geïntegreerd investeringsproject in de Vlaamse open ruimte.

Finaliteit van de voorliggende beslissing

Voorliggende principiële beslissing bouwt verder op het geleverde werk en heeft als doelstelling om de strategie voor de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Demervallei tussen Diest en Werchter te concretiseren. De drie betrokken bestuurniveaus geven via deze beslissing groen licht om een gezamenlijke weg af te leggen door middel van een concreet uitvoeringsprogramma, waarin de verschillende acties en initiatieven in de Demervallei optimaal op elkaar worden afgestemd. Deze beslissing betekent een engagement van de verschillende partners om het uitvoeringsprogramma te realiseren. In een latere fase zal aldus kunnen worden beslist over een meer concreet voorkeursalternatief.

2. Historiek en situering van de voorliggende plannen en projecten

2.1. Op Vlaams niveau

Ontwikkelingsplan Demer

In september 2007 is de studie Ontwikkelingsplan Demer (kortweg OPD) afgerond. Het OPD beoogt maatregelen in de Demervallei tussen Diest en Werchter, waarbij een toename van de veiligheid en natuurontwikkeling samengaan. De risico's op overstromingen van vergunde of vergund geachte gebouwen worden zodoende teruggedrongen en verdroging wordt tot op zekere hoogte ongedaan gemaakt. De Demer krijgt opnieuw een natuurlijker loop en de natuurlijke wisselwerking tussen zomer- en winterbed wordt in de mate van het mogelijke hersteld.

Deze studie resulteerde in een aantal kerngedachten voorgesteld in het FIN-scenario.

In het kader van het OPD, werden eveneens volgende studies uitgevoerd:

- Omgevingsanalyse en sectorale analyse
- Bosrapport: Inventarisatie en analyse
- Landbouweffectrapportage
- Hydrologie van de Demer tussen Diest en Werchter
- Hydrodynamische modellering van het Demerbekken: Bestaande toestand
- Hydrodynamische modellering van het Demerbekken: Scenarioanalyse
- Analyse grondwaterpeildata
- Hydrogeologische modellering
- Bosrapport: Toetsing van het FIN-scenario
- Natuurontwikkelingsplan Demer tussen Diest en Testelt
- Technisch verslag monsternamen en analyse tussen Diest en Testelt
- Opmaak van een natuurvisie voor de Demervallei tussen Diest en Werchter
- Visie op recreatieve ontwikkelingen in de Demervallei tussen Diest en Werchter
- Opmaak van een geïntegreerd eindstreefbeeld

Volgende studies werden in dit kader in opdracht van de Waterwegen en Zeekanaal NV (WenZ) uitgevoerd (en afgerond):

- Opmaak van een hydrodynamische modellering van het FIN-scenario en morfologische aspecten: In deze studie werd het FIN-scenario fijngesteld tot het FIN+ scenario, werden er overstromingskaarten en peilhydrogrammen gemaakt voor het FIN+ scenario, en is het effect van hermeandering op sedimentatie- en erosieprocessen onderzocht. Er blijkt enerzijds dat er minder erosie optreedt in de Demer zelf, en anderzijds dat de erosie in de meanders erg hoog kan zijn, waardoor de morfologie op korte termijn kan wijzigen.
- Een studie ter opmaak van uitvoeringsprogramma's: In deze studie wordt voor verschillende scenario's de uitvoeringskosten en tijdsfasering uitgerekend.
- Opmaak van hydrodynamische modellering van variantscenario's: In deze studie werden overstromingskaarten en peilhydrogrammen opgemaakt voor een aantal scenario's.
- Opmaak van een technisch verslag tussen Rotselaar en Testelt
- Een studie waarbij de verschillende terug aan te sluiten meanders gepeild worden.

De resultaten van deze studies vormen de basis van het plan-MER-proces.

Bekkenbeheerplan Demer

Het bekkenbeheerplan van de Demer werd op 29 augustus 2007 door het Bekkenbestuur goedgekeurd en op 30 januari 2009 door de Vlaamse Regering vastgesteld. Het onderschrijft en beschrijft het FIN-scenario van het OPD als visie (hoofdstuk 3) en vermeldt drie acties, gezamenlijk te ondernemen door WenZ en ANB, als uitvoeringsmodaliteit voor die visie. Met name de acties 30, 31 en 32 die telkens een geografisch onderdeel van de herinrichting van de Demervallei betreffen. Deze acties behoren tevens tot de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan en zijn acties ter verdere concretisering. Het bekkensecretariaat krijgt in actie 156 de opdracht om een integraal project op te starten in dit gebied, en heeft dat tot nu toe ingevuld door actief mee te werken aan het strategisch project Demervallei.

Natuurrichtplan

Het Natuurrichtplan 'Demervallei tussen Diest en Aarschot' werd ministerieel goedgekeurd op 5 februari 2008. Dit plan geeft aan wat er op het vlak van natuur in deze vallei wordt beoogd. Het omvat een toekomstvisie en specifieke maatregelen voor de bossen, moerassen en weilanden in de Demervallei tussen Diest en Aarschot. De algemene gebiedsvisie is richtinggevend voor overheden, de specifieke gebiedsvisie bevat bindende en niet-bindende bepalingen voor overheden. Het Natuurrichtplan kwam tot stand in overleg met belangengroepen en gemeenten, en onderging een openbaar onderzoek. Het Natuurrichtplan streeft naar het behoud en de ontwikkeling van een gevarieerd halfopen tot open valleilandschap met aandacht voor herstel van vochtige graslanden en rietmoerassen als broedplaats voor Europees zeldzame vogels en verspreide kwalitatief hoogstaande bossen. Dit streefbeeld bouwt verder op de ontwerp instandhoudingsdoelstellingen (2006) en op het rivierherstelproject "Ontwikkelingsplan Demer", waarin een verhoogde waterveiligheid voor de woonkernen en natuurherstel in de vallei hand in hand gaan.

Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000

Het ontwerprapport is afgewerkt en is besproken op een wetenschappelijk leescomité op 30 november 2010. Op basis van hun bemerkingen wordt het rapport verder aangepast op wetenschappelijke correctheid.

Voor het deel van de vallei tussen Diest en Aarschot vormt het Natuurrichtplan de basis voor de vertaling van de Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Voor het deel van de vallei tussen Aarschot en Werchter zal het Bovenlokaal Overleg (BOLOV) van 8 februari en 22 maart 2011, en de voorlopige goedkeuring door de Vlaamse regering medio 2011, afgewacht moeten worden om de vertaling van de specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD) in een ruimtelijk uitvoeringsplan te kunnen omzetten. Materiaal dat nu al ter beschikking is, zijn de geactualiseerde habitatkaarten evenals de potentiekaarten. Ook in dit deel heeft het voorbereidend werk vanuit het Ontwikkelingsplan Demer een belangrijke rol gespeeld in de bepaling en afweging van doelstellingen voor habitats en soorten.

Op basis van deze plannen kan parallel aan de opmaak van de plan-MER worden nagegaan welke concrete projecten dienen gerealiseerd te worden in functie van de versterking van de natuurlijke structuur in de Demervallei.

Afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

Voor de buitengebiedregio Hageland werd het afbakeningsproces voor de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) opgestart in februari 2005. Op 19 juli 2007 keurde de Vlaamse Regering de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 37.100 ha agrarisch gebied in de regio Hageland goed. Daarnaast werd een operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de Vlaamse Regering de beleidsmatige prioriteiten voor het opstarten van de uitvoeringsacties bepaalde. Op 9 december 2010 besliste het coördinatieplatform AGNAS om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) van de Demervallei op te nemen in het gebiedsgericht programma 2011 en het planningsproces te formaliseren. De doelstelling van het (de) op te maken gewestelijk(e) ruimtelijk(e) uitvoeringsplan(nen) is uitvoering geven aan de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur.

Op 22 november 2010 is er overlegd met de diensten Milieueffectrapportage (MER) en Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (BGP) van het Departement LNE om na te gaan of een plan-MER noodzakelijk is voor de opmaak van één of meerdere RUP's voor de Demervallei. Tijdens deze vergadering zijn afspraken gemaakt tussen WenZ, ANB, RWO-ARP en Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) over de te volgen planning.

Ankerplaatsen

De procedure voor de vertaling van de ankerplaats 'Demervallei tussen Aarschot en Zichem' naar erfgoedlandschap zal in 2011 kunnen meesporen met de procedure voor de opmaak van het RUP.

De procedure voor de vertaling van de ankerplaats 'Samenvloeiing van Dijle en Demer' wordt opgestart van zodra meer duidelijkheid bestaat over de instandhoudingsdoelstellingen voor de Demervallei tussen Aarschot en Werchter.

Uitvoering veiligheidswerken WenZ

Ter hoogte van Rotselaar (Hellicht) wordt op de linkeroever van de Demer momenteel een winterdijk aangelegd. In 2010 werd de bouw van een dwarsdijk afwaarts Scherpenheuvel-Zichem aanbesteed.

2.2. Op provinciaal niveau

Afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden Diest en Aarschot

Op initiatief van de provincie Vlaams-Brabant werd er in mei 2007 gestart met de afbakeningsprocessen voor de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Diest en Tienen. Het plan-MER-proces voor deze projecten is lopende. Het openbaar onderzoek over de nota publieke consultatie liep van 3 mei 2010 tot en met 1 juni 2010. Parallel zijn er masterplannen voor Aarschot en Diest opgemaakt met telkens 4 strategische projecten.

In het kader van dit planningsproces worden verschillende deelgebieden meer in detail onderzocht, onder meer in het lopende plan-MER, om extra ruimte te creëren voor bedrijventerreinen (bijvoorbeeld voor het gebied Nieuwland), wonen of recreatie. Vanuit deze plannen is een verdere afstemming met de Demervallei nodig.

Provinciaal project 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen-fase 2'

Planningstaak clusters weekendverblijven: De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen rond de problematiek van het permanent wonen is een uitvoering van de bindende en richtinggevende bepalingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Met het provinciaal project 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 2' wil de provincie hier werk van maken. Binnen het project zijn verschillende deelruimtes afgebakend. De deelruimte Demer, met hierin vervat de gemeenten Tremelo, Rotselaar, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest, is hier één van.

Strategisch project voor de landschappelijke poorten van de Demervallei

De provincie heeft de intentie een provinciaal project op te starten voor de invulling van de recreatieve en landschappelijke poorten van de Demervallei als deel van de toeristische regio Hageland. Na goedkeuring van de projectomschrijving door de Deputatie kunnen er middelen voorzien worden om in 2011 een studiebureau aan te stellen.

Stationsomgevingen van Diest en Aarschot

De provinciaal strategische projecten rond stationsomgevingen van Diest en Aarschot, respectievelijk 'Poort van Diest en Demer' en 'Aarschot op sporen'. In deze projecten zit de uitwerking van een stedelijke toegangspoort tot de Demervallei vervat. Deze strategische projecten zijn eveneens opgenomen in de masterplannen voor de kleinstedelijke gebieden.

Recreatief netwerk

De provincie neemt initiatieven op het vlak van toerisme en recreatie. De Demervallei is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant geselecteerd als een toeristisch-recreatief netwerk. Hierin zitten vervat en worden verder uitgebouwd, naast de poorten van de Demervallei:

- ⇒ eenfietsnetwerk (waartoe het Demerfietspad behoort)
- ⇒ verschillende wandelnetwerken en -gebieden (Hagelandse Heuvels, De Merode, Demervallei)
- ⇒ ruiterspaden
- ⇒ mountainbike infrastructuur
- ⇒ hengelsport
- ⇒ watersporten zoals kajak
- ⇒ provinciale domeinen (de Halve Maan)
- ⇒ kleinschalige verblijfsaccommodatie als kampeerwagenterreinen, paalkamperen, trekkershutten,
- ⇒ bestaande verblijfsaccommodatie
- ⇒ ...

2.3. Op gemeentelijk niveau

Volgende acties, opgedeeld per gemeente/stad, hebben een link met de plannen in de Demervallei en worden aldus meegenomen in de opmaak van de principiële beslissing.

Stad Diest

Project 'Demer en Diest'. Voor dit project werkt de stad Diest samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) om de Demer terug door Diest te laten stromen. In het plan wordt aandacht besteed aan de verfraaiing van de stad en wordt gezorgd voor de uitbouw van de verbindingen voor het langzame wegverkeer. Op het vlak van waterbeheer zorgt dit voor een extra buffercapaciteit voor het Demerbekken.

Project 'Poort van Diest en Demer' (zie ook provinciaal niveau)

Stad Scherpenheuvel-Zichem

De weekendverblijven in de weekendverblijfplaats Roebos hebben geen vergunning en/of zijn zonevreed en liggen bovendien bijna allemaal in het natuurlijk overstromingsgebied van de Demer. Om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken is er een werkgroep opgestart met als betrokken partijen de stad, de provincie, ANB, WenZ en de coördinator van het Strategisch Project Demervallei.

Er moet rekening gehouden worden met het RUP zonevreedde woningen fases I en II.

Stad Aarschot

In Aarschot loopt het Laakproject. Met dit project wil de stad de bedding van de Laak terug watervoerend maken met als een resultaat een opwaardering van de Laak (rivier en vallei) en de creatie van een blauw lint door de stad.

Betrokken actoren: stad Aarschot, ANB, provincie, Bekkenssecretariaat van de Demer, provinciale visserijcommissie, Regionaal Landschap Noord-Hageland, WenZ en Natuurpunt.

Project 'Aarschot op sporen' (zie ook provinciaal niveau).

Gemeente Begijnendijk

De Laak stroomt op het grondgebied van de gemeente Begijnendijk. De uitvoering van het project heeft dan ook belangrijke consequenties voor de gemeente en wordt van nabij opgevolgd.

Gemeente Rotselaar

Ook in de gemeente Rotselaar bevinden zich deels illegale weekendverblijfsplaatsen in het natuurlijk overstromingsgebied van de Demer. Voor de weekendverblijven Olifant, Leybos en Guldentop moet er een oplossing gevonden worden. Betrokken actoren: gemeente Rotselaar, provincie, ANB, WenZ, Regionaal Landschap Noord-Hageland. Het provinciaal project 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen - fase 2' zal hier een oplossing voor zoeken.


3. Visie voor de Demervallei

De globale visie voor het gebied werd vanuit de verschillende bestaande plannen opgebouwd en werkt rond **drie krachtlijnen**:


1. Versterken van de ruimtelijke samenhang tussen Demer en Demervallei *Demervallei als blauw-groen lint*

De Demervallei op de kaart zetten als *blauw-groen lint*:

Blauw... De Demervallei heeft een belangrijke functie op vlak van waterberging en -afvoer. Integraal waterbeheer en preventie van wateroverlast zijn belangrijke Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsthema's. Integraal waterbeleid in de Demervallei schept mee de randvoorwaarden voor een doorgedreven biodiversiteitsbeleid.

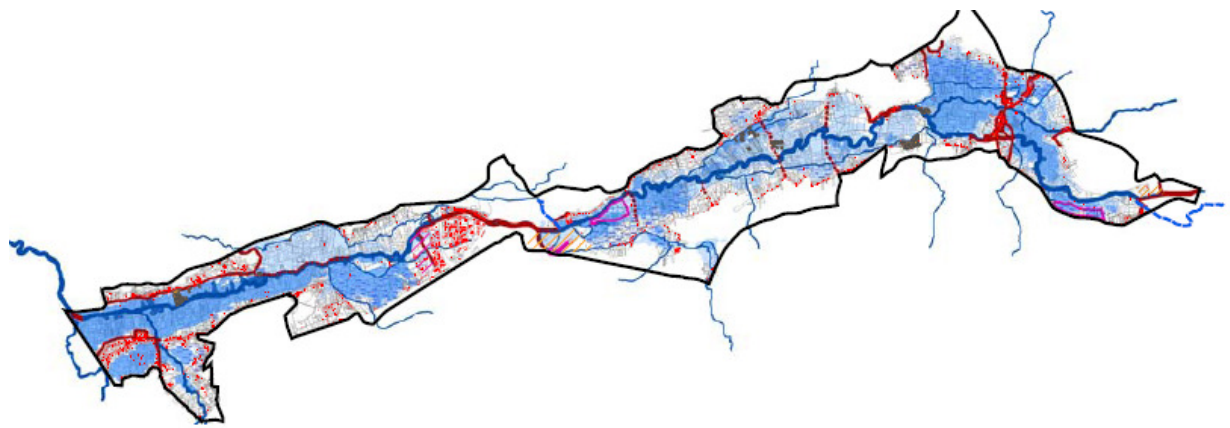


Groen... De Demervallei is een groot, uniek gebied met een hoge natuur- en landschapswaarde en met grote potenties op vlak van natuurontwikkeling gekoppeld aan waterveiligheid.

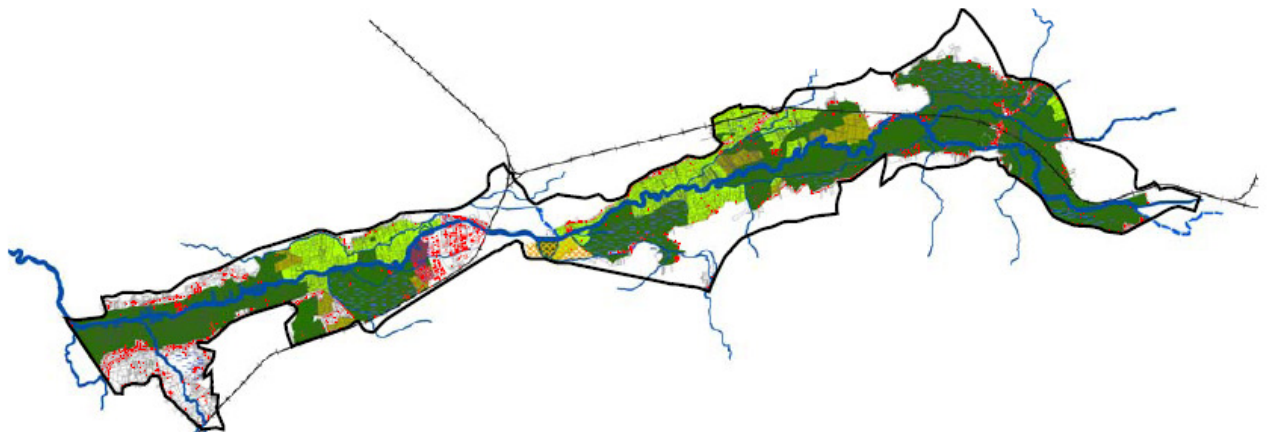

2. Duurzaam toerisme en recreatie in de Demervallei kansen geven

Demervallei als oranje lint

De vallei herbergt niet alleen heel wat kansen als blauw-groen lint, maar biedt met haar unieke landschappen en natuur een mooi kader voor natuurgerichte recreatie. Ook de aanwezigheid van een aantal cultuurhistorische steden, dorpskernen of gehuchten en historische monumenten, onderstreept de unieke troeven in de Demervallei voor de ontwikkeling van allerlei vormen van zachte recreatie.

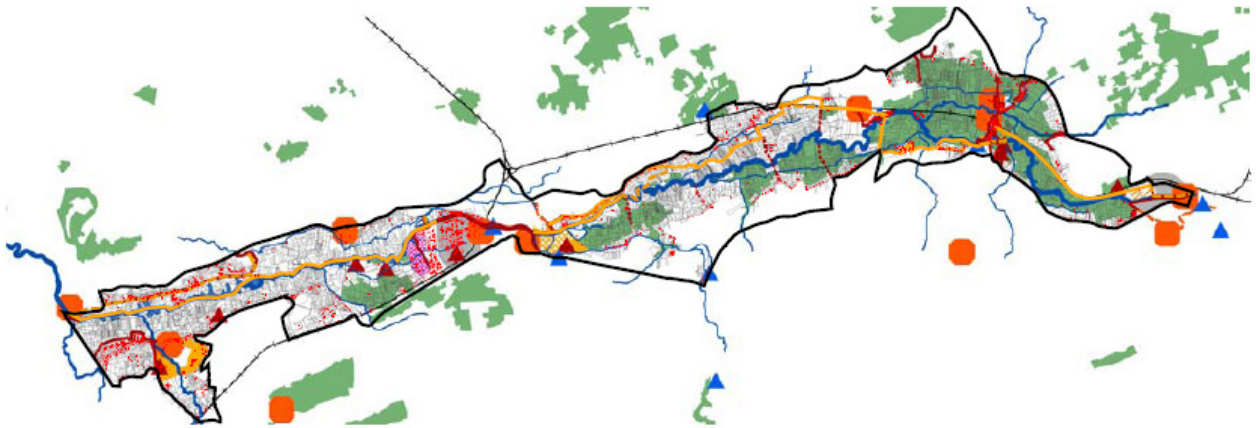

3. Versterken van de streekidentiteit

Een dynamisch lint van alle Demeractoren

De hoge natuur- en landschapswaarden van de Demer en de Demervallei kunnen een maatschappelijke meerwaarde betekenen voor meerdere domeinen buiten de eigenlijke sector: recreatie, toerisme, verhoging van de woonkwaliteit, schaalvoordelen en verbeteren van het investeringsklimaat. Het duurzaam voortbestaan van deze maatschappelijke meerwaarde is slechts verzekerd als alle actoren actief meewerken aan de bescherming en ontwikkeling van die hoge natuur- en landschapswaarden.

Daartoe moeten alle betrokken lokale besturen, andere overheden en diverse partners samenwerken in een hecht Demernetwerk. Deze samenwerking levert schaalvoordelen zoals een eenduidige communicatie, een effectievere, snellere en meer klantgerichte dienstverlening vanuit de diverse overheden en een meer kwaliteitsvolle besluitvorming.

De verschillende plannen voor de Demervallei kunnen slechts verfijnd en gerealiseerd worden binnen een participatief proces. Het Demercharter dat op 12 juni 2009 werd ondertekend door de provincie, de Demergemeenten en het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw (Strategisch Project Demervallei) vormt hiervoor de katalysator. Ook andere bestaande overeenkomsten, zoals de Hagelandse erfgoedconvenant, dragen bij aan die dynamiek.

Deze krachtlijnen worden verder doorvertaald in volgende **ruimtelijke concepten**:³

- Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met ruimte voor waterberging. Natuurwaarden worden behouden en versterkt. Er wordt gestreefd naar de ontwikkeling van grote, aaneengesloten halfnatuurlijke valleilandschappen. Bestaande, vergunde recreatieve infrastructuur kan behouden blijven, in verweving met de natuur- en landschapswaarden. De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte te voorzien voor de waterloop. Potenties voor waterberging worden afgestemd op de natuurfunctie, land-en bosbouw en recreatie.
- Behoud en versterking van gevarieerde open tot halfopen valleilandschappen met ruimte voor waterberging. Gevarieerde, halfopen valleilandschappen worden behouden met ruimte voor grondgebonden landbouw, populierenteelt, grasland- en bosontwikkeling. De natuurwaarden aanwezig in bos-, kleine landschapselementen, grasland- en kleine moerasrelictten worden beschermd en opgewaardeerd. De structuurkenmerken van de waterlopen worden verbeterd door meer ruimte te voorzien voor de waterloop. Potenties voor waterberging worden afgestemd op de landbouw- bosbouw- en natuurfunctie en recreatie
- Behoud en versterking van landbouw met ruimte voor ontwikkeling voor landschappelijk waardevolle elementen. De kleinere landbouwgebieden, vaak versnipperd door bebouwing worden gevrijwaard voor de grondgebonden landbouw. Kleine landschapselementen worden behouden, hersteld en beheerd.
- Vrijwaren en versterken van waardevolle landschappen en erfgoedwaarden. De gave valleilandschappen met kenmerkende erfgoedelementen zoals historische gebouwen, oude nederzettingen, watermolens, kastelen, oude meanders, historische perceelspatronen,... worden behouden en waar mogelijk (via stimulerende maatregelen) hersteld. De landschappelijke verscheidenheid en het historisch erfgoed vormen een belangrijk aanknopingspunt voor de uitbouw van het toeristisch-recreatief netwerk.

³Uit het 'Eindvoorstel Gewenste Ruimtelijke Structuur AGNAS', regio Hageland, juni 2006

4. Doelstellingen en krachtlijnen bij het operationaliseren van de visie

In lijn met de beslissing van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 over de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur, regio Hageland en de vaststelling van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 van het Bekkenbeheerplan van de Demer, zal in de toekomst het natuurlijk karakter van de Demervallei versterkt worden, waarbij ruimte gegeven wordt aan water en waarbij bescherming geboden wordt tegen wateroverlast. Deze hoofddoelstelling zal een toeristisch – recreatieve ontwikkeling op een duurzame manier bevorderen. Daarnaast zullen doelstellingen voor landbouwactiviteiten en verstedelijking op deze hoofddoelstelling afgestemd worden.

Bovenstaande doelstellingen worden als volgt geformuleerd:

- uitvoering geven aan de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio Hageland;
- uitvoering geven aan de doelstellingen inzake integraal waterbeleid en natuurontwikkeling zoals vastgelegd in het Bekkenbeheerplan van de Demer;
- realiseren van de werken en maatregelen die nodig zijn om de risico's op wateroverlast te minimaliseren;
- realiseren van maatregelen ter versterking van de natuurlijke structuur zoals onder meer vanuit de instandhoudingsdoelstellingen voor dit plangebied en het Natuurrichtplan 'Demervallei tussen Diest en Aarschot' worden voorzien;
- uitbouw van een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve aanbod voor de Demervallei als poort naar de toeristische regio Hageland, in overeenstemming met de ecologische draagkracht van het gebied;
- de kleinere landbouwgebieden in het gevarieerde, halfopen valleilandschap worden in de eerste plaats gevrijwaard voor de grondgebonden landbouw. De landbouw wordt ondersteund en biedt ruimte aan de ontwikkeling van landschappelijk waardevolle elementen;
- uitvoering geven aan de vertaling van de ankerplaatsen 'Demervallei tussen Aarschot en Zichem' en 'Samenvloeiingsgebied van Dijle en Demer' naar erfgoedlandschappen;
- afstemmen en coördineren van de voorstellen voor het ruimtelijk stedelijk beleid voor de stedelijke gebieden Diest en Aarschot. Dit beleid is erop gericht de stedelijke kern en het stedelijk functioneren te consolideren en te versterken door het creëren van ruimte voor bijkomend aanbod. Dit betreft ook de strategische projecten die gedefinieerd zijn voor de stedelijke gebieden en die de bedoeling hebben de stedelijke kernen te versterken en de open ruimte erbuiten en ertussen te vrijwaren; deze afstemming vereist dat in de verschillende planprocessen rekening wordt gehouden met de beleidskeuzes voor de kleinstedelijke gebieden (bijvoorbeeld de inplanting van bedrijvenszones). Dit betekent concreet dat er dan afspraken gemaakt moeten worden over de doorvertaling van de keuzes, bijvoorbeeld bij de afweging in alternatieven;
- de geïntegreerde uitvoering van alle acties door de betrokken overheden en actoren in de Demervallei.

5. Uitvoeringsprogramma

Om de streefdoelen die omschreven zijn in de visie voor de Demervallei te bereiken, werd een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Dit uitvoeringsprogramma omvat een reeks van acties waarin alle plannen en projecten die een rechtstreekse of onrechtstreekse invloed hebben op de Demervallei, zijn opgenomen. Het gaat om een niet-limitatieve lijst die in functie van het verloop en de resultaten van de acties kan aangevuld en gewijzigd worden. De acties zullen worden gerealiseerd onder verantwoordelijkheid van de aangegeven 'trekkers', zoveel mogelijk in de periode tussen de principiële beslissing en het voorkeursbeslissing. Op basis van de reeds bekomen resultaten van alle onderzoeken en acties zullen de drie bestuurniveaus immers een keuze maken van het voorkeursalternatief, hier voorkeursbeslissing genoemd, en de doorvertaling daarvan in meer concrete projecten.

Elk van onderstaande acties zal ingepast worden in de opgezette overlegstructuur (zie hoofdstuk 6 *Overlegstructuur*). In onderstaande beschrijvingen wordt aangegeven welke partijen betrokken worden bij de concrete uitwerking van deze acties.

ACTIES BLAUW – GROEN LINT

- Opstarten van het integrale project Demer tussen Diest en Werchter (OPD) in uitvoering van actie 156 van het bekkenbeheerplan van de Demer
Trekker: **Bekkensecretariaat Demer** in samenspraak met WenZ, ANB, VMM, provincie Vlaams-Brabant en de Demergemeenten.
- Parallel aan de opmaak van de plan-MER zal een integratie en concretisering van de maatregelen inzake wateroverlast en -veiligheid worden voorbereid. Deze maatregelen worden meegenomen in het planproces van het RUP.
Trekkers: **WenZ** in samenspraak met ANB, Bekkensecretariaat Demer, VMM, Provincie Vlaams-Brabant ende Demergemeenten.
- Voortbouwend onder meer op het Natuurrichtplan (tussen Diest en Aarschot), de Instandhoudingsdoelstellingen, de beheerplannen van reservaten en parallel aan de opmaak van de plan-MER worden nagegaan welke concrete projecten dienen gerealiseerd te worden in functie van de versterking van de natuurlijke structuur in de Demervallei.

Invulling van de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones (Natura 2000) Voor het deelgebied tussen Diest en Aarschot zitten deze elementen al vervat in het natuurrichtplan Demervallei.

Het Bovenlokaal Overleg (BOLOV), waarbij het rapport aan middenveldorganisaties (Boerenbond, VOKA, Natuurpunt, ...) wordt voorgelegd, is doorgegaan op 8 februari 2011. Simultaan met dit eerste BOLOV wordt het rapport ook voorgelegd aan Vlaamse administraties, gemeenten en provincie voor overleg. Een tweede BOLOV vond plaats op 22 maart 2011. Nadien wordt het rapport afgewerkt en kritisch nagelezen, alvorens het medio 2011 aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd voor voorlopige goedkeuring.

Trekker: **Agentschap Natuur en Bos** in samenspraak met de kerngroep.

- De vertaling van de ankerplaatsen 'Demervallei tussen Aarschot en Zichem' en 'Samenvloeiing van Dijle en Demer' zal met de RUP-procedure kunnen meesporen. Het onderzoek naar de vertaling van de ankerplaats 'Samenvloeiing van Dijle en Demer' naar erfgoedlandschap zal pas kunnen starten in 2012 en kan meesporen met de RUP-procedure voor het deel van de vallei tussen Aarschot en Werchter, dat in een tweede fase opgestart kan worden.
Trekker: Ruimte en Erfgoed Vlaanderen in samenspraak met gemeenten, provincie, Natuurpunt,...

ACTIES ORANJE LINT

- **Uitwerking toeristisch-recreatief netwerk Demervallei als poort naar de toeristische regio Hageland:**

Het project zal voortbouwen op wat geïdentificeerd werd als landschappelijk-recreatieve poorten in de Demervallei (geïntegreerd streefbeeld van OPD), maar zal ruimer gaan dan dit. De Demervallei is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant geselecteerd als een toeristisch-recreatief netwerk.

De provincie wil in het projectvoorstel werken rond:

- bekijken of de toeristisch-recreatieve activiteiten bijkomende impulsen kunnen krijgen in de regio in zoverre deze rekening houden met de landschappelijke kwaliteiten, dit voortbouwend op de selectie van Diest en Aarschot als kleinstedelijke gebieden en de selectie van Scherpenheuvel-Zichem en Rotselaar als toeristisch-recreatief knooppunt
- afhankelijk van het alternatievenonderzoek worden voorstellen uitgewerkt voor het verder uitbouwen van het recreatief medegebruik van de open ruimte elementen (vb. bossen, waterlopen...) en de effectieve aanleg van verbindingen tussen deze elementen door versterking van een netwerk van provinciale en lokale infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open ruimte:
 - fietsvoorzieningen (onder andere fietspaden)
 - wandelvoorzieningen
 - overige recreatie: hengelsport, ruitersport, mountainbike, kajak,...
 - kleinschalige verblijfsaccommodatie zoals kampeerwagenterreinen, paalkamperen, trekkershutten,
 - bestaande verblijfsaccommodatie
- promotie van de Demervallei op toeristisch-recreatief vlak als poort naar het Hageland.

Trekker: Provincie Vlaams-Brabant in samenspraak met het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw (RLNH), de Demergemeenten, ANB, WenZ

- Oplossing uitwerken voor de weekendverblijfplaatsen waar een problematiek van permanent wonen heerst: Roebos (Scherpenheuvel-Zichem), Olifant (Rotselaar), Leybos (Rotselaar), Guldentop (Rotselaar) en andere weekendverblijvenclusters in de Demervallei

Momenteel wordt door de provincie een studie uitgevoerd voor verschillende clusters in de Demervallei. Voor Roebos (Scherpenheuvel-Zichem) is los daarvan een werkgroep opgestart. Indien de ontwikkelde visie overeenstemt met de globale visie van de provincie kan deze cluster meegenomen worden in de provinciale studie
Trekker: **Provincie Vlaams-Brabant** in samenspraak met de betrokken gemeenten en **Vlaamse overheid (ANB, WenZ,...)**

ACTIES DYNAMISCH LINT

- Versterken van de streekidentiteit door samenwerking tussen de lokale besturen en overige spelers in de Demervallei in afstemming met de regiowerking in het Hageland. Specifiek gaat het om draagvlakbevorderende acties zoals de oprichting van een erfgoeddatabase voor de Demervallei en provinciaal project 'je hebt meer burens dan je denkt'.
Trekker: **Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw** in samenspraak met de Demergemeenten, provincie Vlaams-Brabant en andere lokale partners

ALGEMENE ACTIES

- Vooronderzoek om te komen tot een gepaste inzet van inrichtings- en grondbeleidsinstrumenten (bv. ruilverkaveling, lokale grondenbanken, beheerovereenkomsten, natuurinrichting, landinrichting, ...) voor een gebiedsgerichte en geïntegreerde uitvoering van deelacties van de visie
Trekker: **Vlaamse Landmaatschappij** in samenspraak met ANB, WenZ, RWO-ARP, DLV, provincie en gemeenten
- Vooronderzoek ter invulling van de verweving landbouw-natuur-bos waarbij de vroegere landbouwstudies geactualiseerd worden. Er wordt een aanzet gegeven tot het latere detailonderzoek op perceelsniveau naar de ligging van de bestaande landbouwbedrijfszetels, huiskavels en landbouwgebruikspercelen om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande landbouwbedrijfszetels in het gedrang zou komen.
Trekker: **Departement Landbouw en Visserij** in samenspraak met VLM, ANB, WenZ, RWO-ARP in de werkgroep landbouw/natuur.
- Doorvertaling door middel van onderzoek naar de milieueffecten van de verschillende alternatieven die op basis van het gevoerde scenario-onderzoek worden geformuleerd in een plan-MER. Deze plan-MER volgt het zogenaamde integratiespoor hetgeen betekent dat de opmaak van het RUP, waarvoor het departement RWO trekker zal zijn, maximaal gekoppeld is aan de plan-MER-procedure. Dit is in overeenstemming met de beslissing van het coördinatieplatform AGNAS van 9 december 2010. De formele procedure voor de opmaak van één of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het gebied kan pas na de definitieve goedkeuring van het plan-MER.
Trekker: **Waterwegen en Zeekanaal NV** (WenZ) in samenspraak met ANB, RWO-ARP, Bakkensecretariaat Demerbekken, VMM en LNE (dienst MER en dienst BGP).

- Integreren en bekrachtigen van afspraken inzake herbestemming, inrichting of beheer van de open ruimte in de Demervallei binnen één of meerdere gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en instaan voor afstemming met gemeentelijke of provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Trekker: **RWO afdeling Ruimtelijke Planning** in samenspraak met de gemeenten, de provincie, Vlaamse administraties (ANB, DLV, WenZ, VMM, Bekkenssecretariaat) en andere betrokken organisaties (Natuurpunt, Boerenbond, RLNH...)

ACTIES STEDELIJKE GEBIEDEN

- Afbakening kleinstedelijke gebieden Diest en Aarschot en uitvoering via de masterplannen voor Diest en Aarschot
Trekker: **Provincie Vlaams-Brabant** in samenspraak met Diest en Aarschot
- ‘Laak-project’: Onderzoek naar de mogelijkheid tot herwaarderen van de Laak en haar valleigebied in Aarschot, Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. Het terug watervoerend maken van deze beek met Demerwater stroomopwaarts de stad Aarschot is één van de te onderzoeken acties.

Trekker: **Regionaal Landschap Noord-Hageland** in samenspraak met het Bekkenssecretariaat, stad Aarschot, provincie Vlaams-Brabant, Natuurpunt, ANB, WenZ, provinciale visserijcommissie

- ‘Demer en Diest’: het opnieuw openleggen van de Demer in Diest. Dit zorgt ervoor dat een belangrijk landschappelijk element doorheen de stad Diest wordt hersteld en versterkt

Trekker: **VMM** in samenspraak met stad Diest, Regionaal Landschap Noord-Hageland, Ruimte en Erfgoed Vlaanderen

- Restauratie Maagdentoren in Zichem. De donjon wordt een uitkijktoren in het Demerlandschap

Trekker: **Ruimte en Erfgoed Vlaanderen** in samenspraak met stad Scherpenheuvel-Zichem

- Uitbouw van een recreatieve en landschappelijke poort aan de Sint-Niklaasberg in Aarschot als groene verbinding tussen de Demervallei en ‘s Hertogenheide.

Trekker: **stad Aarschot**

Actiefiches

De lijst van acties kan aangepast en aangevuld worden naar gelang de behoefte en voortgang van de plannen en projecten. Over de reeds gedefinieerde acties wordt thans beslist teneinde de gebiedsgerichte ontwikkeling van de Demervallei te kunnen realiseren. Deze acties worden door de projectmatige werkgroep verder uitgewerkt en opgevolgd door middel van aparte actiefiches. In deze actiefiches, en in de loop van het verdere proces, worden de resterende aandachtspunten van de actoren meegenomen. De actiefiches hebben een dynamisch karakter en worden indicatief als bijlage bij deze nota gevoegd. Voor iedere fiche ziet de opdeling er als volgt uit:

- | | |
|----------------------|--------------------------------------|
| • Titel | • Status |
| • Doelstelling | • Gebiedsbeschrijving |
| • Werkwijze | • Randvoorwaarden - uitgangssituatie |
| • Trekker(s) | • Mogelijk tijdspad |
| • Mogelijke partners | • Financiering |
| • Overlegorgaan | |

6. Overlegstructuur

Prioriteit is dat de acties van het uitvoeringsprogramma uitgevoerd worden. Daarom zijn vooral de niveaus van uitvoering en uitwerking belangrijk. Regelmatige afstemming blijft natuurlijk noodzakelijk maar is ook de verantwoordelijkheid van iedere trekker van een actie

Gezien de positieve ervaringen uit het verleden ende nauwe link in de projecten (zowel inhoudelijk als geografisch) wordt de overlegstructuur met betrekking tot de Demervalleiegekoppeld aan de reeds bestaande overlegstructuur van het geactualiseerde Sigmaplan enerzijds en wordt er een continuïteit beoogd rond de bestaande samenwerking in het strategisch project Demervallei anderzijds.

De overlegstructuur omvat een overkoepelende en een projectgebonden structuur. De **overkoepelende structuur** omvat een reeds bestaande (SIGMA-plan) met zowel een klankbordgroep als een multifunctionele beleidsdomeinoverschrijdende werkgroep (stuurgroep). Ook een terugkoppeling in het coördinatieplatform AGNAS is voorzien.

Voor de Demervallei wordt een gebiedsgerichte **projectgebonden** overlegstructuur opgericht. De opzet en de samenstelling worden hieronder toegelicht:

Dagelijks bestuur

Bij de realisatie van de verschillende SIGMA projecten is gebleken dat een direct samenwerking tussen de uitvoerende partners noodzakelijk is. Teneinde de effectieve realisatie op het terrein te waarborgen wordt dan ook een dagelijks bestuur opgericht met in eerste instantie een afvaardiging van W&Z, ANB, RWO-ARP, het bekkensecretariaat Demerbekken en het provinciebestuur. Op basis van de evolutie van het project zal, voor zover het in de projectmatige werkgroep niet wordt geregeld, de frequentie van het overleg worden afgestemd.

Het dagelijks bestuur instaan zal instaan voor de algemene coördinatie, de voorbereiding van de vergaderingen van de projectmatige en thematische werkgroepen en de terugkoppeling met het politieke niveau.

Projectmatige werkgroep Demervallei

In de projectmatige werkgroep zetelen de kernactoren van het project. De taakomschrijving voor de projectmatige werkgroep is als volgt vastgelegd:

- Instaan voor de opvolging en maatschappelijke kwaliteitsbewaking,
- Voeren van de algemene coördinatie over de uitvoering van het actieprogramma,
- Aansturing van de thematische werkgroepen en terugkoppeling van de resultaten,

De projectmatige werkgroep bestaat uit een afvaardiging van het RLNH (vertegenwoordiging gemeenten), Bekkenssecretariaat Demer, RWO ARP, ANB, W&Z, provincie Vlaams-Brabant (diensten Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Toerisme), VLM, Departement Landbouw en Visserij afdeling Duurzame Landbouwwontwikkeling en het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Thematische werkgroepen

Voor relevante thema's worden wanneer noodzakelijk thematische werkgroepen opgericht, waarin – naast de vertegenwoordigers van de projectmatige werkgroep – experts met terreinkennis kunnen opgenomen worden. Op die manier kan de specifieke kennis en ervaring in de latere inrichtingsplannen en verdere uitwerking van het project meegenomen worden. De volgende thematische werkgroepen zouden kunnen worden onderscheiden:

- Subwerkgroep Natuur en Landschap:
- Subwerkgroep Landbouw.
- Subwerkgroep Toerisme en recreatie:
- Subwerkgroep Communicatie: communicatie-experten van de verschillende partijen.

In deze werkgroepen zetelen naast vertegenwoordigers van de projectmatige werkgroep ook andere (ambtelijke) vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse entiteiten, de provincie Vlaams-Brabant, de betrokken gemeenten en het georganiseerde middenveld, zoals: VMM, Agentschap Onroerend Erfgoed, Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant, Natuurpunt, Boerenbond, Landelijk Vlaanderen, Provinciale Visserijcommissie, Wildbeheereenheid Demervallei, Bosgroep Noord-Hageland, wateringen, etc,...

Ten minste op de voorziene overlegmomenten en indien noodzakelijk kunnen de verschillende sub werkgroepen worden samengebracht in een samengestelde werkgroep, dat dan onder meer functioneert als een klankbordgroep. De taakomschrijving van dergelijke groep is als volgt:

- instaan voor de opvolging en maatschappelijke kwaliteitsbewaking
- terugkoppeling over de voorstellen over de onderzoeksresultaten en voorstellen vanuit de thematische werkgroepen

Een **Interbestuurlijk overleg** (tussentijds politiek overleg) gebeurt via het bekkenbestuur onder voorzitterschap van de voorzitter het Bekkenbestuur, zijnde de gouverneur van de provincie Vlaams Brabant. Hierin zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en mandatarissen van de provincies en deelbekkens. Desgewenst kan het bekkenbestuur uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de Demergemeenten.

Daarnaast wordt uiteraard ook voorzien in het nodige bilaterale overleg.

7. Procedure – fases en mogelijk tijdspad

Op dit moment zijn verschillende acties reeds afgerond, andere worden voorzien en sommige moeten nog worden opgestart. De acties gedefinieerd in het uitvoeringsprogramma zijn in meer of mindere mate gekoppeld aan en afhankelijk van de globale visie voor de Demervallei. Er moet echter onderstreept worden dat verschillende acties hun eigen procedure en timing volgen. In de actiefiches wordt daarom per actie een mogelijk tijdspad meegegeven.

In de periode na de principiële beslissing zal de timing en procedure voor de opmaak van de plan-MER als kader dienen voor de koppeling met verschillende acties van het uitvoeringsprogramma, voornamelijk deze die zich afspelen in het buitengebied. Dit volgens het zogenaamde integratiespoor, hetgeen betekent dat de opmaak van het gewestelijk RUP maximaal gekoppeld is aan de plan-MER-procedure. Op basis van de resultaten van de onderzoeken en acties zal eind 2012 beslist worden over het voorkeursalternatief en de wijze waarop dit verder kan worden gerealiseerd. Deze beslissing wordt de voorkeursbeslissing genoemd.

Voorafgaand aan deze beslissing zal binnen deze periode op twee momenten een brede terugkoppeling plaatsvinden:

- Tijdens de plan-MER-procedure zal de nota die voor de publieke consultatie wordt geschreven in ontwerpvorm reeds worden besproken met de actoren en worden toegelicht. In deze nota staat onder andere een beschrijving van de verschillende alternatieven en een beschrijving van het verdere proces ("Procesnota"). Door op basis van een ontwerpnota dit moment te organiseren is het mogelijk rekening te houden met de inbreng van lokale actoren, georganiseerde bevolking en het middenveld (bijvoorbeeld Natuurpunt of Boerenbond). Hiermee komen op voorhand zoveel mogelijk de 'redelijke' alternatieven in beeld, die nog kunnen worden verwerkt in de nota die ingediend wordt voor de publieke consultatie.
- Nadat de resultaten van alle studies bekend zijn, is het de bedoeling tot één alternatief te komen. Er wordt dan gemotiveerd waarom dit voorkeursalternatief eigenlijk het beste is en wat dat allemaal zal inhouden in de praktijk. Om dit te bereiken zal opnieuw een actorenoverleg en informatiemoment plaats vinden. Dit zal voorafgaan aan een volgende beslissing: de voorkeursbeslissing.

De belangrijkste stappen zijn hieronder opgesomd en hebben een mogelijk tijdsad meegekregen (zie ook schema in bijlage):

Januari – april 2011

- Voorbereiding en uitwerken principiële beslissing
- Bestendiging en versterking van de organisatie met voorbereiding van de werkgroepen
- Beslissing over het fysisch programma WenZ

April – juni 2011

- Opmaak van een bestek voor de plan-MER

Juni 2011

- Goedkeuring principiële beslissing

Juni – augustus 2011

- Opstarten of voortzetten van de onderzoeken

September – oktober 2011

- Gunning en opstart van de plan-MER

November – december 2011

- Eerste actorenoverleg
- Informatiemoment op basis van ontwerpnota publieke consultatie
- Publieke consultatie en richtlijnenvergadering voor de plan-MER

Januari – december 2012

- Heroriëntatie en/of afronden van een aantal onderzoeken
- Opmaak plan-MER

Januari – maart 2013 (rekening houdend met gemeenteraadsverkiezingen 2012)

- Tweede actorenoverleg en bilateraal overleg in functie van een voorkeursbeslissing

Juni 2013

- Voorkeursbeslissing

8. Communicatiestrategie

De geïntegreerde werking in de Demervallei (en de regio Hageland) moet ook als geïntegreerd project naar alle actoren, besturen en de (georganiseerde) bevolking gecommuniceerd worden. Op die manier wordt één verhaal gebracht en wordt duidelijk aangetoond dat er 'samen' wordt gewerkt. Het is dan ook essentieel dat alle partners samen zorg dragen voor een maximale coördinatie en afstemming van de communicatie over de Demervallei. Bij de opstart van de verschillende onderzoeken zal vanuit de kerngroep afspraken worden gemaakt om de overkoepelende communicatiestrategie verder op punt te zetten en te implementeren. Een belangrijk onderdeel van deze communicatiestrategie zal het vergroten van het maatschappelijk draagvlak zijn.

Binnen de voorziene procedures kunnen de volgende **communicatiemomenten** worden onderscheiden:

Startmoment

Communicatie over deze beslissing en over de “start” van de uitvoering van de acties.

Breed infomoment vóór de publieke consultatie.

In de opdracht voor de plan-MER zal er ruimte voorzien worden om op basis van een toegankelijke samenvatting van de ontwerpnota vóór de publieke consultatie een infomoment te organiseren.

Communicatie naar aanleiding van de richtlijnen plan-MER.

Na de publieke consultatie worden er richtlijnen bepaald door de dienst MER. Het is belangrijk dat de conclusies, bijvoorbeeld over de weerhouden alternatieven/scenario's, dan worden bekend gemaakt en teruggekoppeld.

Communicatie naar aanleiding van het voorstel van voorkeursbeslissing.

Afhankelijk van de inzichten die uit verschillende onderzoeken komen, zal moeten worden nagedacht over hoe en op welk moment zal worden gecommuniceerd over de verdere keuzes naar aanleiding van het voorkeursalternatief.

Permanente procesbewaking

Afspraken over de wijze waarop informatie zal worden bijgehouden omtrent de vooruitgang van alle relevante plannen zullen worden gemaakt in de interne projectmatige werkgroep. Deze communicatie kan eveneens verlopen via de bestaande kanalen en contacten van het geactualiseerde Sigmaplan en de verschillende partners.

Bovendien kunnen verschillende communicatiekanalen open gehouden worden, zoals:

- Demerkrant (bestaande, kan worden op verder gebouwd)
- een elektronische nieuwsbrief
- luikje op de website van het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
- website Demerbekken en websites van de verschillende partners
- gemeentelijke infobladen en websites
- provinciale website en nieuwsbrieven leefmilieu/water/toerisme/landbouw
- persberichten voor regionale en nationale pers

Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de promotie van de Demervallei als deel van het Hageland op toeristisch-recreatief vlak (cf. actie toeristisch-recreatief netwerk Demervallei en Hageland).

Financiële of budgettaire impact van deze beslissing

Voor wat betreft beslissingen die op krachtlijnen voorafgaan aan een definitieve beslissing, zoals goedkeuring van conceptnota's, visienota's, groen- of witboeken is voor wat betreft de beslissing door de Vlaamse Regering een advies van de Inspecteur van Financiën niet vereist. Ook deze principiële beslissing houdt immers geen enkel bijkomend financieel of budgettair engagement in, en bouwt voort op de middelen die in de begroting reeds zijn voorzien. In een volgende fase zullen, in functie van een voorkeursbeslissing, de financiële aspecten verder worden uitgewerkt, onder meer vanuit een maatschappelijke kosten batenanalyse.

BESLISSING

- De Vlaamse Regering
- De Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV
- De Deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant
- Het bekkenbestuur van het Demerbekken
- Het College van burgemeester en schepenen van de stad Diest
- Het College van burgemeester en schepenen van de stad Scherpenheuvel-Zichem
- Het College van burgemeester en schepenen van de stad Aarschot
- Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Begijnendijk
- Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente Rotselaar


... beslist om de engagementen die vanuit de eigen bevoegdheid relevant zijn en worden aangegeven in het uitvoeringsprogramma, te realiseren;

... beslist op basis van de resultaten van de verschillende acties en studies te komen tot een gecoördineerde besluitvorming over het voorkeursalternatief en de wijze waarop die kan worden gerealiseerd;

... beslist de procesregie te koppelen aan de overlegstructuur van het geactualiseerde Sigmaplan en een gebiedsgerichte **projectgebonden** overlegstructuur op te richten, bestaande uit een Dagelijks Bestuur, een Projectmatige werkgroep en thematische werkgroepen.

VOOR DE VLAAMSE REGERING

Vlaamse Regering



Brussel,

28 NOV. 2011

Minister-president van de Vlaamse Regering, en Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid

Kris PEETERS

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Hilde CREVITS

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur

Joke SCHAUVLIEGE

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport

Philippe MUYTERS


VOOR WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV

Willebroek,

De Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV



ir. Leo Clinckers
gedelegeerd bestuurder




Albert Absillis
Voorzitter Raad van Bestuur

voor het bekkenbestuur van het Demerbekken

Leuven,

Het bekkenbestuur van het Demerbekken

Lodewijk De Witte

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' and 'D' followed by 'Witte'.

provinciegouverneur Vlaams-Brabant

VOOR DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT


Leuven,

De deputatie van de Provincie Vlaams-Brabant




Monique Swinnen

gedeputeerde



Jean-Pol Olbrechts

gedeputeerde




Julien Dekeyser

gedeputeerde

VOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD DIEST


Diest,

Dhr. Jan Laurys

A handwritten signature consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Burgemeester Stad Diest

Mevr. Liesbeth Van Rompaey

A handwritten signature with a large, stylized 'L' and 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.

Secretaris Stad Diest

VOOR DE STAD SCHERPENHEUVEL-ZICHEM


Scherpenheuvel-Zichem,

College van Burgemeester en Schepenen van de stad Scherpenheuvel-Zichem


De Secretaris
Liesbeth Verdeyen




De Burgemeester,
Manu Claes

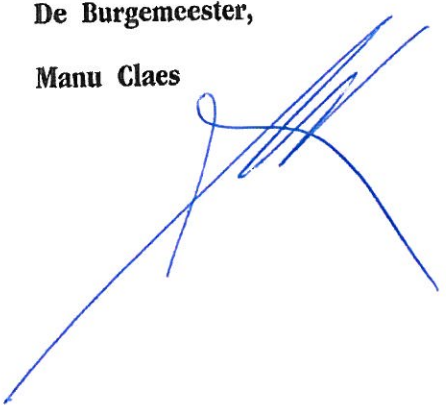

VOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD AARSCHOT


Aarschot,

Dhr. André Peeters

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

Burgemeester Stad Aarschot

Mevr. Christi Van Calster

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' with a vertical line to its left and a horizontal line at the bottom.

Secretaris Stad Aarschot

**VOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE
BEGIJNENDIJK**

Begijnendijk, 21 november 2011

Dhr. Willy Michiels



Burgemeester Gemeente Begijnendijk



Mevr. Sonia Goriëns




Secretaris Gemeente Begijnendijk

VOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE GEMEENTE ROTSELAAR

Rotselaar,

Dhr. Dirk Claes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'D' followed by 'Claes' and a long horizontal stroke extending to the right.

Burgemeester Gemeente Rotselaar



Mevr. An Craninckx

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'A' and 'C' with a horizontal line through them, all enclosed within a blue oval.

Wvd Secretaris Gemeente Rotselaar
