

Bijlage 1: Fiches lopende acties

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.0.
Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie

	Communicatie strategisch project 'veerkracht in de vallei van de Kleine Nete'
	Het opzetten van een globale communicatie over de gebiedsontwikkeling in de vallei van de Kleine Nete en de ambitie om tot een veerkrachtig valleisysteem te komen, vormt een overkoepelende output. Om een (groter) draagvlak voor de veranderingen in de vallei te bekomen, is een brede en laagdrempelige communicatie essentieel. Vandaag bestaat een overkoepelende website (www.kleinenete.be) en een overkoepelend aanspreekpunt (info@kleinenete.be). Bedoeling is om deze basiscommunicatie op te laden tot een wervende en brede communicatiestrategie voor de vallei in verandering. De expertise van o.a. de regionale landschappen zal ingezet worden voor het uitwerken van publicaties en publieksactiviteiten (zoals bv. het organiseren van Netedag(en) voor een breed publiek...). 0.1 Opvolgingscommissie OC: 2x/jaar 0.2 Procesbeheercomité PBC: 4x/jaar 0.3 Projectbureau PB: maandelijks 0.4a Opmaak communicatiestrategie 0.4b Uitvoeren communicatie 0.5 a Netedag 2018: Le Paige aan de Kleine Nete 0.5 b Netedag 2019 Lier
TREKKER CONTACTPERSOON	Acties 0.1 en 0.2 Cathy Berx Cathy.berx@provincieantwerpen.be gouverneur Antwerpen acties 0.3., 0.4. en 0.5.: Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project
PARTNERS	alle betrokken partners op Vlaams, provinciaal, gemeentelijk niveau, middenveld
LOCATIE	/
AFSPRAKEN FINANCIERING	werkingsmiddelen strategisch project en afhankelijk van project cofinanciering partners
TERMIJN	gedurende volledige termijn van het SP

MIJLPALEN (detailleerde termijn)	• Opleveren logo, huisstijl, website • Netedag 2018: Le Paige aan de Kleine Nete, • Netedag 2019: Pallieterland en Molternetebrug (7 locaties) •
GENOMEN BESLISSINGEN	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• OC, PBC, PB doorlopend • Opmaak communicatiestrategie: opmaak website, huisstijl en logo is bezig • 2 Netedagen afgerond: Le Paige aan de Kleine Nete en Pallieterland/Molternete • Website opgeleverd • Uitvoeren communicatie: doorlopend
VERDERE PLANNING	• Zie fiches
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx • Communicatie Gebiedsgericht Beleid provincie Antwerpen • Communicatie Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete • Communicatie van alle partners op PBC en OC
COMMUNICATIE	• Via overlegmomenten • Gebruik logo, huisstijl bij elke communicatie • Website • Organiseren van evenementen

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.4. communicatieplan
Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie

HEFBOOMPROJECT	Projectcoördinatie en -communicatie	
ACTIE NR. 0.4.	Communicatie strategisch project 'veerkracht in de vallei van de Kleine Nete'	
	<u>Actie 0.4.a. opmaak communicatiestrategie</u> <u>Actie 0.4.b. uitvoeren communicatie</u>	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens Koen.eyskens@provincieantwerpen.be Programmacoördinator Kleine Nete	
PARTNERS		
LOCATIE		
AFSPRAKEN FINANCIERING	Werkingsmiddelen strategisch project	
TERMIJN	Actie 0.4.a. – 2018 Actie 0.4.b. – volledige projectduur	
MIJLPALEN		
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Communicatiestrategie werd opgemaakt • Logo en huisstijl zijn ontwikkeld • De website is opgeleverd en online (verschillende thema's zijn: welkomspagina, projectpagina's, informatieve pagina over de Kleine Nete, wat er te beleven valt in de vallei van de Kleine Nete en een nieuwspagina)	
VERDERE PLANNING	• afgerond	

AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx • Communicatie Gebiedsgericht Beleid provincie Antwerpen • Communicatie Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete • Communicatie van alle partners op PBC en OC
COMMUNICATIE	• Gebruik logo, huisstijl bij elke communicatie • Website als communicatiemiddel

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.5a. Netedag Herentals
Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie

HEFBOOMPROJECT	Projectcoördinatie en -communicatie
ACTIE NR. 0.5 a	Netedag: Le Paige aan de Kleine Nete De Netedagen zijn publieksactiviteiten en bieden een uitgelezen kans om het strategische project zichtbaar te maken voor een breed publiek. Er wordt getracht om voor elk hefboomproject een Netedag (eventueel 2 overlappende hefboomprojecten in 1 Netedag) te organiseren. Voor de eerste Netedag werd het hefboomproject 'Groenblauwe dooradering Herentals' gekozen omdat er in Herentals al verschillende acties gelinkt aan het strategische project zijn afgerond of uitgewerkt (beheerplan Le Paige, 1ste fase rivierherstelproject Hellekens, wandeling Natuurpunt en Natuurgidsen). Tijdens de Netedag wordt de nadruk gelegd op de samenwerking met de verschillende partners en de vele acties die lopende zijn in het projectgebied. Programma Netedag: 13u: plechtige opening Sprekers: • Cathy Berx (gouverneur provincie Antwerpen) • Mien Van Olmen (schepen ruimtelijke ordening, milieu en groenvoorzieningen, monumenten en landschappen, landbouw en plattelandsontwikkeling, stad Herentals) • Bernard De Potter (administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij) • Jo Haentjens afdelingshoofd Sportpromotie van Sport Vlaanderen 14u tot 18u: activiteiten • Doorlopend: rondgang door domein Le Paige - wateronderzoekjes op kindermaat – infostanden • Om 14, 15 en 16 uur: architect Herman toont Le Paige • Om 14 en 15.30 uur: wandeling langs Spaans Hof naar rivierherstelproject Hellekens • Om 14 en 15.30 uur: natuur- en erfgoedwandeling - Tussen Abroek en Maasloop • Om 14, 15 en 16 uur: kindervertellings - Speur mee met Mies en Moos Muis • Van 14 tot 17 uur: initiaties Stand Up Paddling (SUP) en kajakken • Van 14 tot 17 uur: tentoonstelling Baboon! Eat Roots van Frédéric Castiau in het kasteel
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project



PARTNERS	VMM, Natuurpunt, Natuurgidsen, IOED, Ter Vesten, RLKGN, VLM, Sport Vlaanderen, de Kempen (ATP), provincie Antwerpen, de Waterral, vrijwilligers
LOCATIE	Herentals
AFSPRAKEN FINANCIERING	Stad Herentals: receptie, werkingsmiddelen strategisch project: catering vrijwilligers
TERMIJN	Evenement op 7 oktober 2018
MIJLPALEN (detailleerde termijn)	/
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Evenement goed verlopen, veel positieve reacties
VERDERE PLANNING	Afgerond
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx • Culturele dienst Stad Herentals • Deelnemende partners
COMMUNICATIE	• Stadskrant Herentals/lichtkrant stad/websites partners

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 0.5. Netedag Lier, Ranst, Zandhoven, Nijlen
 Uitvoering projectcoördinatie en -communicatie

HEFBOOMPROJECT	Projectcoördinatie en -communicatie
ACTIE NR. 0.5 b	Netedag - Zondag 22/9/2019 - Hefboomproject 1 en 2
	De Netedagen zijn publieksactiviteiten en bieden een uitgelezen kans om het strategische project zichtbaar te maken voor een breed publiek. Er wordt getracht om voor elk hefboomproject een Netedag (eventueel 2 overlappende hefboomprojecten in 1 Netedag) te organiseren. Voor de tweede Netedag werden de hefboomprojecten 'Landschapspark Pallieterland en Molternetebrug' gekozen. Tijdens de Netedag wordt de nadruk gelegd op de samenwerking met de verschillende partners en de vele acties die lopende zijn in het projectgebied. Programma Netedag 22/9/2019: Zeer uitgebreid programma met 40 activiteiten op 7 verschillende locaties (evenementenweide Lier, halte Sionsbrug, halte 't Oud Lier, halte jachthaven, Badhuis, Steenbeemden, watersportweide te Emblem en natuurweide te Nijlen). Verschillende locaties worden met elkaar verbonden via fietslus (http://bit.ly/VeleauNetedag), treintjes en boot. • Officieel gedeelte in Lier om 11u Ankatrien Boulanger, coördinator Regionaal Landschap Rivierenland • Cathy Berx, gouverneur provincie Antwerpen • Frank Boogaerts, burgemeester Lier • Jan De Haes, gedeputeerde provincie Antwerpen • Bernard De Potter, administrateur-generaal VMM en op watersportweide om 13u: • Yves Royackers, voorzitter roeiclub The OAR • Jan De Haes, gedeputeerde provincie Antwerpen • Johan De Ryck, burgemeester Ranst • Philippe Paquay, administrateur-generaal Sport Vlaanderen • Hubert de Witte, Voorzitter Vlaamse Roeiliga Op de infomarkten en tijdens de begeleide wandelingen (14 aangeboden wandelingen op 4 verschillende start plaatsen) werden de deelnemers geïnformeerd over het strategisch project en het onthardingsproject en het belang van natuur, water en onroerend erfgoed in de vallei. Een infokrant met een druk van 1500 exemplaren werd op de 3 weides verspreid en toegelicht https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/in-de-kijker/infokrant-water-aan-zet-in-de-vallei-van-de-kleine-nete)



TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens Koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete Bekkensecretariaat Netebekken Sandra Franck s.franck@vmm.be trekker hefboomproject vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier
PARTNERS	Vorbereidende werkgroep was samengesteld uit: Regionale landschappen (Rivierenland, Voorkempen en Grote en Kleine Nete), VMM, provincie Antwerpen, De Vlaamse Waterweg, ANB, Sport Vlaanderen, Departement Omgeving, Agentschap onroerend erfgoed, stad Lier, gemeenten Nijlen, Ranst, Zandhoven, Natuurpunt, Roeiclub Emblem.
LOCATIE	Centrale locatie: Lier - Evenementenweide 2^{de} hub: Roeiclub Emblem 3^{de} hub: Molternetebrug
AFSPRAKEN FINANCIERING	onderlinge afspraken werden gemaakt voor de financiering van het evenement. Financiële bijdragen vanuit VMM, regionale landschappen Rivierenland, Voorkempen en Grote en Kleine Nete, ANB, stad Lier, provincie Antwerpen. Bijdrage in Natura vanuit DVW, Agentschap onroerend Erfgoed, gemeenten Ranst en Nijlen, Natuurpunt en Sport Vlaanderen.
TERMIJN	Evenement op 22 september 2019
MIJLPALEN (detailleerde termijn)	/

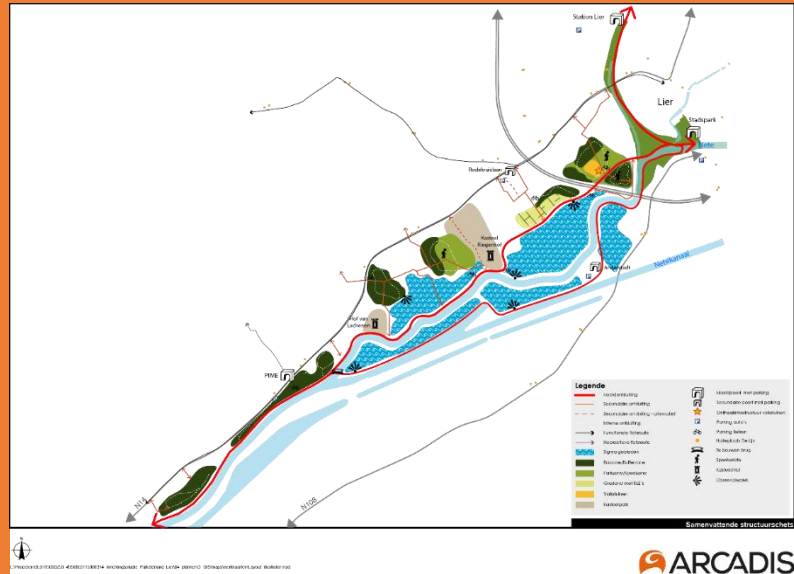
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Toelichting voorstel locatie Netedag 2019 op OC 30/1/2019; akkoord van de OC-leden • 12/2/2019 – Startoverleg met de partners • 15/3/2019 – Vervolgoverleg met de partners
VERDERE PLANNING	kort evaluatieoverleg met kernpartners? Enkele duizenden deelnemers over de verschillende locaties heen. Zeer positieve feedback vanuit de deelnemers: blij dat de overheid dit organiseert, werk verder aan natuur en water in de vallei.
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Communicatie coördinatieopdracht gouverneur Cathy Berx • Evenementenagenda van Stad Lier • Deelnemende partners • Landschapsdag Regionaal landschap Rivierenland. Voorstel is om deze twee evenementen samen te organiseren. → Afstemming communicatie op volgend PBC en OC.
COMMUNICATIE	• Communicatiewerkgroep werd getrokken door Bart Vermeylen van regionaal landschap Rivierenland. Actieve publicatie vanuit deelnemende partners. Ook ruim opgepikt in de media/overige websites van partners/facebook/... • Website kleinenete.be • Via website RLRL, RLDV en RLKGN

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.0.

Uitvoering Hefboomproject 'Landschapspark Pallieterland'

HEFBOOMPROJECT	Landschapspark Pallieterland
	Landschapspark Pallieterland omvat de ontwikkeling van een randstedelijk groengebied langs de Beneden-Nete stroomafwaarts Lier. Het omvat het ruimer gebied van de Beneden-Nete ten zuiden van Lier. Pallieterland omvat de natuurgebieden van het Sigmaproject Nete en Kleine Nete. De verder te ontwikkelen deelgebieden binnen Pallieterland zijn de vesten, het stadsrandbos (woonuitbreidingsgebied en deel woongebied dat aansluit bij de R16) uitgebreid met onder meer de omgeving van het Kasteel Ringenhof, het Hof van Lachenen, het PIME (Provinciaal Instituut voor MilieuEducatie) en het provinciaal groendomein Neteland. Voor het gebied stelde de Vlaamse Regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) definitief vast op 1 maart 2019. Dit GRUP voert de nodige herbestemmingen door voor de realisatie van het landschapspark en de overstromingsgebieden en wetlands die langs de Beneden-Nete in het kader van het Sigmaplan ontwikkeld worden. Hierdoor worden een aantal overstromingsgevoelige en niet te ontwikkelen woon- en woonuitbreidingsgebieden (signaalgebieden) geschrapt. De stad Lier, ANB en het Regionaal Landschap Rivierenland zetten reeds een samenwerkingsverband op en er werd via overlegprocessen een inrichtingsstudie en visienota voor het landschapspark opgesteld. Deze visie is afgestemd met de natuur- en veiligheidsopties van het Sigmaplan en werkt een overkoepelende visie uit voor de toeristisch-recreatieve ontsluiting van de open ruimte ten zuidoosten van Lier. Voor elk van de deelgebieden binnen het landschapspark zal een verfijnd inrichtingsplan uitgewerkt worden. Binnen het landschapspark zal er naast natuurontwikkeling, ruimte zijn voor de ontwikkeling van een speelbos, speel- en leernatuur, een avonturenpad, volkstuintjes en verbetering van de ontsluiting voor zacht recreatief verkeer via een brug over de Nete. Er wordt eveneens onderzocht in hoeverre gebouwen in het gebied een maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen (opportuniteit woning Elzenhof aan Lachenebeek). Er wordt o.a. gedacht aan horeca en ontmoetingsruimte. Op die manier wordt een multifunctionele groene long van formaat hij het kleinstedelijk gebied Lier gerealiseerd die zowel inspeelt op de behoefte aan toegankelijk recreatief groen, het versterken van de biodiversiteit, het beveiligen tegen overstromingen en het creëren van aaneengesloten onbebouwde groenblauwe aders die ook een bufferende en regulerende functie hebben ten aanzien van grote verkeersaders in de omgeving (geluidsbuffering, luchtzuivering ...). 1.1 Natuurbeheerplan Neteland

- 1.2 Erfgoedbeheerplan Vesten
- 1.3 Toegangspoorten
- 1.4 Inrichtingsstudie speelbos en uitvoering speelbos
- 1.5 Inrichting volkstuintjes en uitvoering volkstuintjes
- 1.6 Inrichting speelnatuur en uitvoering speelnatuur
- 1.7 Ontsluiting wandel- en fietsroutes lokaal en bovenlokaal
- 1.8 Fietsbrug thv PIME
- 1.9 Bebossingsmogelijkheden en compensaties uit Sigmaplan
- 1.10 Sanering Neteland



**TREKKER
CONTACTPERSOON**

Stad Lier – www.lier.be

Gino Verbiest

Gino.verbiest@lier.be

Consulent Ruimtelijke Planning

Regionaal Landschap Rivierenland – www.rlrl.be

Ankatrien Boulanger

Ankatrien.boulanger@rlrl.be

Coördinator Regionaal Landschap Rivierenland

Agentschap voor Natuur en Bos – www.natuurenbos.be

Jop Hermans

Jop.hermans@vlaanderen.be

PARTNERS

Stad Lier, Regionaal Landschap Rivierenland, Agentschap voor Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Departement Omgeving, Toerisme Provincie Antwerpen, Provincie Antwerpen (PIME, PGRM), Polder van Lier, OCMW Lier

LOCATIE

Zuiden van Lier

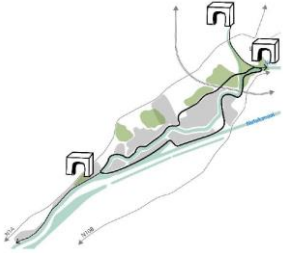
**HUIDIGE STAND
VAN ZAKEN**

- Op de OC van 29 mei 2018 werd afgesproken om in september 2018 een nieuwe bijeenkomst van de stuurgroep Pallieterland te organiseren om de acties in het gebied meer te stroomlijnen → SG heeft niet plaatsgevonden in september 2018.

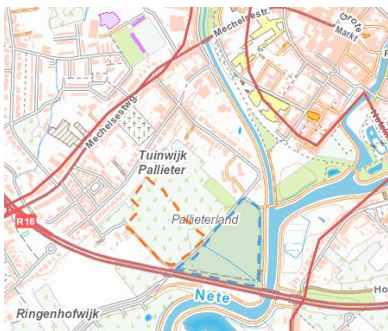
	• Ambitie is om deze SG 1x jaar te laten doorgaan. • De stuurgroep kwam samen op 24 mei 2019. Een volgende stuurgroep wordt georganiseerd op 25 oktober 2019. • Op de Netedag (22/9) werd het speelbos officieel geopend. De komende maanden zal het speelbos verder vorm krijgen. • Velt VZW werd aangesteld voor de opstart van het volkstuinproject “Den Hof van Pallieter” (deelgebied 2) Landschapspark Pallieterland. • De stand van zaken Landschapspark Pallieterland wordt gepubliceerd op: Website Stad Lier • 18/2/2019: Toelichting strategisch project, landschapspark Pallieterland en visienota aan de nieuwe stadsbestuur: 18/2/2019
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	• Mogelijke link met het hefboomproject Molternetebrug leggen. In de inrichtingsvisie Pallieterland wordt hier naar verwezen. • Link met lopend Sigmaplan. • Link met opmaak GRUP. • Link met strategisch project ORIOM 2.0. • Link met strategisch project De zuidrand 2.0.
COMMUNICATIE	• Via overlegmomenten • Via PBC en OC • Via SG • Website Stad Lier • Website RLRL

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.3. toegangspoorten
Uitvoering Hefboomproject 'Landschapspark Pallieterland'

HEFBOOMPROJECT	Landschapspark Pallieterland	
ACTIE NR. 1.3.	Toegangspoorten	
	Het verzorgen van toegang tot het landschapspark Pallieterland gebeurt niet enkel door het voorzien van recreatieve ontsluitingen. De toegang tot het gebied moet ondersteund worden door infrastructuur. Deze infrastructuur moet de bezoeker van het gebied begeleiden door het gebied. De infrastructuur kan minimaal zijn (vb. een informatiebord) of kan specifiek als een poort tot het gebied ontwikkeld worden (vb. onthaalcentrum). Voor de ontwikkeling van het landschapspark Pallieterland in het gebied van de Beneden-Nete onderscheiden we drie typen van toegangen: 1. Hoofdpoorten 2. Secundaire poorten 3. Overige toegangen Binnen het landschapspark Pallieterland worden er drie hoofdpoorten voorzien. Het betreft: - Het station van Lier - Het stadspark - PIME De hoofdpoorten voor het landschapspark Pallieterland krijgen met uitzondering van de stationsomgeving, twee functies: - Het is de plaats waar de bezoeker van het gebied onthaald wordt en van waaruit hij het landschapspark kan verkennen. - Het is een plaats waar ook een attractor, een doel voor een uitstap, voorzien wordt. De hoofdpoort zelf is een locatie waar de bezoeker het gebied kan bereiken via het openbaar vervoer (trein en/of bus) of waar hij zijn auto of fiets kan parkeren om vervolgens het gebied te voet of per fiets te verkennen. De hoofdpoort vormt dan ook het startpunt van recreatieve routes door het landschapspark. De hoofdpoort kan ondersteund worden door één of meerdere horecavoorzieningen, een onthaalcentrum, een attractie. De hoofdpoort bevat parkeermogelijkheden en er is informatie aanwezig over het landschapspark. Niet elke hoofdpoort heeft dezelfde mogelijkheden en mate van intensiteit. De invulling van de hoofdpoort is afhankelijk van het type deelgebied waarin ze gelegen is, de bestaande situatie, de mogelijkheden die het gebied bieden. Het is dus maatwerk per locatie. <u>Actie 1.3.a visie ontwikkelen op toegangspoorten</u> <u>Actie 1.3.b opmaak plan per toegangspoort</u> <u>Actie 1.3.c uitvoering</u>	
TREKKER CONTACTPERSOON	Voor actie 1.3.a, PIME: Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens Koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	

PARTNERS	Voor actie 1.3a PIME: provincie Antwerpen (PIME, PGRM, TPA), Regionaal Landschap Rivierenland Voor actie 1.3 b: projectcoördinator SP, provincie Antwerpen
LOCATIE	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Nog te bepalen
TERMIJN	Nog te bepalen
MIJLPALEN	Nog te bepalen
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	- Binnen de provinciale diensten werd overleg opgestart over de ontwikkeling van PIME als onthaalpoort voor Pallieterland. - Te bespreken op stuurgroep Pallieterland (eind april – begin mei 2019, 25 oktober 2019): signalisatie parking PIME, plannen van provincie Antwerpen binnen Pallieterland (algemeen) en infoborden. - Terreinbezoek met partners op de landschapsdag van 24 /09/2019
VERDERE PLANNING	- Te bespreken op stuurgroep Pallieterland (eind april – begin mei 2019, 25 oktober 2019): signalisatie parking PIME, plannen van provincie Antwerpen binnen Pallieterland (algemeen) en infoborden. - Opmaak van een inrichtingsschets voor PIME en Neteland door PIME en PGRM met betrokkenheid van TPA en RLRL. Nagaan of er binnen het strategisch project budget voor procesbegeleiding mogelijk is. - Nagaan bij DMN of het interessant zou zijn om PIME ook op te nemen in het beheerplan voor Neteland. → lijkt geen interessante piste - Te onderzoeken: composttoilet → Aanwezig in provinciaal domein Hertberg en op CSA Grondsmaak in Kontich - Stad Lier ziet een mogelijkheid voor stationsomgeving als onthaalpoort → Te onderzoeken - Overleg met PIME en PGRM op 29/3/2019 - PGRM plant dit najaar (2019) de realisatie van een verbindingspad. Deze werken gebeuren in overleg met De Vlaamse Waterweg.
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: - Zuidrand 2.0 - Actie 1.8 - Strategisch project ORIOM 2.0
COMMUNICATIE	- Via werkgroep - Via SG

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.4. inrichting speelbos
 Uitvoering Hefboomproject 'landschapspark Pallieterland'

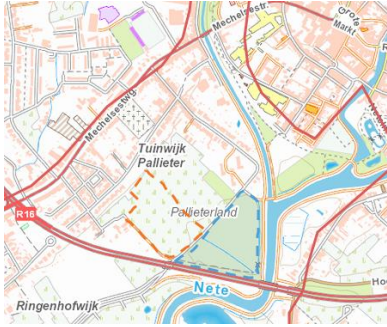
HEFBOOMPROJECT	Landschapspark Pallieterland	
ACTIE NR. 1.4.a / 1.4.b	Inrichting speelbos	
	<u>Actie 1.4.a. inrichtingsstudie speelbos</u> <u>Actie 1.4.b. uitvoering speelbos:</u> Uitgangspunten: - Gericht op bewoners, jeugdverenigingen, scholen - Bij voorkeur in nabijheid van de stad - Keuze voor quick-win = geen nieuw bos, maar vertrekken van bestaand bos	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Rivierenland – www.rlrl.be Ankatrien Boulanger Ankatrien.boulanger@rlrl.be Coördinator Regionaal Landschap Rivierenland Elly Vaes Elly.vaes@rlrl.be Coördinator An-Katrien Cuypers An-Katrien.cuypers@rlrl.be Coördinator	
PARTNERS	Regionaal Landschap Rivierenland, stad Lier, OCMW Lier, Polder van Lier	
LOCATIE	Blauwe contour 	
AFSPRAKEN FINANCIERING	- Budget Stad Lier - Subsidie Natuur in je buurt (2018): 250.000 € - Zo veel mogelijk realiseren met natuurlijke materialen van beheerswerken	
TERMIJN	Actie 1.4.a: januari 2018– mei 2020 Actie 1.4.b: september 2018 – mei 2020	

MIJLPALEN	/
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	- Afstemming tussen stad, OCMW en polderbestuur (grondeigenaars) over gebruik van dit bos als speelbos. Opmaken inrichtingsstudie, ontwerpschets. <u>Uitgevoerd 2018</u> 10/04/2018: start bevraging jeugd + opruimactie met speelpleinwerking De speelmicroob en Stuw Lier 16/04/2018: plannen worden voorgelegd aan jeugdraad Lier met oog op inspraak 03/05/2018: overleg tussen projectpartners rond ontwikkeling speelbos en volkstuinten 3/12/2018: overleg 1 veiligheidscontrole speelbos → Noodzaak veiligheidskap; toewijzing taken en inplannen veiligheidskap; korte bespreking ontwerpschets speelbos - Rondgang 1 veiligheidskap om zieke essen te markeren (zichtbaar in herfst/winter) ism boswachter ANB <u>Uitgevoerd 2019</u> Beheer - Start beheer/onderhoud- en veiligheidswerken (kappen zieke essen, vrijmaken locatie wilgentunnel, aanplant natuurlijke afscheiding van meidoorn als grens van het speelbos, opruimen stormschade) door Polder van Lier - Aanvraag kapmachtigingen voor populierenrij in kader van beheer van knotwilgen 3/04/2019: Overleg 2 en rondgang 2 veiligheidscontrole speelbos → beslissing om veiligheidsredenen alle essen preventief te kappen en kunstmatig te verjongen met andere boomsoorten - Opstellen plan met locatie zieke essen en aanvraag van een vergunning voor noodkap bij ANB - Start uitvoering noodkap na schoontijd door Polder van Lier - Opstellen van een herbplantingsplan ism Bosgroep Antwerpen-Zuid Inrichting met speelaanleidingen - Finale terugkoppeling van het opgestelde plan naar jeugdraad Lier - Aanvraag wijziging bosbeheerplan OCMW Lier bij ANB - goedgekeurd - Opstellen en uitsturen van de offertezaak voor het maken en plaatsen van de speelaanleidingen en gunning van de werken aan Onetwotree boomverzorging (RLRL) - Terreinbezoeken met Onetwotreeboomverzorging, Polder van Lier en stad Lier om prioriteiten te bepalen voor realisaties tegen de Netedag in Lier (22/09) en locaties van de speelaanleidingen te bepalen inspelend op lopend bosbeheer. - Opstellen en uitsturen van de offertezaak voor het maken en plaatsen van houtsculpturen (waarvan 1 live zal gemaakt worden op de Netedag 22/09) en gunning van de werken aan Arboleo houtsculpturen. - Inrichting van het speelbos met een eerste deel speelaanleidingen en infrastructuur, namelijk: 2 takkentijs, reuzenmikado, hoogteparcours, evenwichtsparcours met stelten en boomstammen, boomstambank, 1 picknickbank, natuurlijke fietsenstalling en toegangspoort
VERDERE PLANNING	<u>Verdere planning najaar 2019 – voorjaar 2020</u> - Verder zetten van het bosbeheer (kappen essen) - Uitvoeren van het herbplantingsplan - Inrichting van het speelbos met de overige geplande speelaanleidingen wanneer bosbeheer en heraanplant voltooid zijn, namelijk: vertelhoekje, klimhut, wilgentunnel, 3 picknickbanken en houtsculpturen (eventueel met educatief bordje) - Wedstrijd rond naamgeving voor het bos

	• Aanbrengen bebording speelbos: speelzone en spelregels; opening speelbos met publieksactiviteit (speeldag)
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 1.5. inrichting volkstuinen • Actie 1.6. inrichting speelnatuur
COMMUNICATIE	• Infomarkt Sigma, Pallieterland en RUP (22/05/2018) • Officiële bekendmaking project 'Natuur in je buurt' • Via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.5. inrichting volkstuintjes en nr. 1.6. inrichting speelnatuur
 Uitvoering Hefboomproject 'landschapspark Pallieterland'

HEFBOOMPROJECT	Landschapspark Pallieterland	
ACTIE NR. 1.5.a / 1.5.b / 1.5.c / 1.6.a / 1.6.b	Inrichting volkstuintjes Inrichting speelnatuur	
	<u>Actie 1.5.a. voorbereiding inrichtingsstudie volkstuintjes, waterpartijen</u> <u>Actie 1.5.b. inrichtingsstudie volkstuintjes, waterpartijen</u> <u>Actie 1.5.c. uitvoering volkstuintjes, waterpartijen</u> Uitgangspunten: - Wegwerken van de bestaande wachtlijst van ca. 40 kandidaat tuinders. - Terrein in de nabijheid van de stad (goed bereikbaar met fiets en openbaar vervoer, ontsluitbaar met de auto) - Naar een nieuwe invulling van de volkstuinten: volkstuinten 2.0 - o Aandacht voor groepstuinen, maar ook individuele volkstuinten - o Gebundelde accommodatie - o Een ontmoetingslokaal met een sociaal-culturele functie (meer dan enkel volkstuinten) - o Beperkte parkeerfaciliteiten (o.a. ifv mindervaliden, toeleveren materiaal, ...) - o Voldoende fietsparkeerplaats - Evolueren van een klassieke indeling naar een groene, organische inkleding van de volkstuinten met gedeelde plekken - Geen afzonderlijke bergingen, alles samen in één lokaal. Ook andere functies: afdak, picknickplek, ontmoetingsruimte, sanitair. - Locatie: keuze voor quick-win: gebruik maken van gronden OCMW in nabijheid van de stad. <u>Actie 1.6.a. inrichtingsstudie speelnatuur</u> <u>Actie 1.6.b. uitvoering speelnatuur</u> Uitgangspunten: - Gericht op bewoners, jeugdverenigingen, scholen - Bij voorkeur in nabijheid van de stad - Aansluitend bij speelbos - Nabijheid accommodatie van volkstuinten = mogelijkheid voor sanitair	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Rivierenland – www.rlrl.be Ankatrien Boulanger Ankatrien.boulanger@rlrl.be Coördinator Regionaal Landschap Rivierenland Elly Vaes Elly.vaes@rlrl.be Coördinator An-Katrien Cuypers An-Katrien.cuypers@rlrl.be Coördinator	
PARTNERS	stad Lier, OCMW Lier	

LOCATIE	Oranje contour 
AFSPRAKEN FINANCIERING	- Budget Stad Lier - Subsidie Natuur in je buurt (2018); Start subsidie 31/12/2019 – Einde 31/12/2024 - Subsidie Volkstuinen (toegekend eind 2017, realisatie moet binnen de drie jaar starten)
TERMIJN	
MIJLPALEN	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• In 2017 ontving de stad twee subsidies, namelijk subsidie volkstuinen (VLM) van 15.000 € en Vlaams laureaat Natuur in je Buurt (250.000 €). • In 2018 werd een offerte voor begeleiding nieuwe volkstuindersgroep opgesteld en uitgestuurd. CBS Lier nam geen beslissing voor participatieve begeleiding volkstuinproject o.b.v. offerte-aanvragen en vergelijkend verslag (ingediend: Velt, TuinHier, Blenders). De offerteaanvragen worden beschouwd als marktbevraging en werden als input gebruikt worden voor een nieuwe aanbesteding. • In 2019 werd een nieuwe, gedetailleerde prijsvraag voor volkstuinbegeleiding opgemaakt: Velt vzw en TuinHier vzw dienden in. Offertes en interpretatie werden bezorgd aan Stad Lier voor de selectie op CBS. CBS gunde op 24/06/2019 de opdracht aan Velt vzw. De gevraagde dienstverlening bevat een voorbereidende fase en twee teeltseizoenen, start op 2 september 2019 en eindigt op 30 november 2021. De opdracht bestaat uit: - o Medeorganisatie infoavond opstart nieuwe volkstuin - o Deelname aan en organisatie van overleg met projectpartners en volkstuiniers - o Lesgeven: basiscursus ecologisch tuinieren - o Praktijkdemonstraties en -begeleiding in de volkstuin - o Organisatie referentiebezoek - o Adviesverlening • Eerste overleg met Velt vzw, RLRL en Stad Lier op 9/9/2019. Presentatie aanpak Velt aan CBS Lier op 23/9. • De grond waarop de volkstuinen en speelnatuur gerealiseerd zal worden, is in eigendom van OCMW Lier. De pachter is niet akkoord met stopzetten pacht, er loopt een gerechtelijke procedure over de pachtverbrekkingsvergoeding bij de vrederechter. De zaak zal behandeld worden in de zitting van 14/01/2020. De infoavond voor nieuwe volkstuiniers en het verdere traject kan pas doorgaan na afwikkeling van deze zaak en zodra Stad Lier zicht heeft op een datum waarop de pacht stopgezet kan worden.

VERDERE PLANNING	• Start begeleidingstraject nieuwe volkstuinten: infoavond, evaluatie kandidaat-volkstuiniers, cursus ecologisch tuinieren,... • Offerteaanvragen en inrichtingswerken nieuwe volkstuinten 'Den Hof van Pallieter' (grondwerken, aanplantingen) • Start bewerken volkstuintpercelen met nieuwe volkstuiniersgroep. Planning was voorzien voor voorjaar 2020. • Bovenstaande planning kan i.f.v. uitspraak vrederechter afwijken (procedure vrederechter opzeg pacht percelen OCMW).
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 1.4. inrichting speelbos • Actie 1.6. inrichting speelnatuur
COMMUNICATIE	• Infomarkt Sigma, Pallieterland en RUP • Officiële bekendmaking project 'Natuur in je buurt' • Via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.8. fietsbrug ter hoogte van PIME
Uitvoering Hefboomproject 'landschapspark Pallieterland'

HEFBOOMPROJECT	Landschapspark Pallieterland	
ACTIE NR. 1.8.	Fietsbrug ter hoogte van PIME	
	In de periode 2007-2008 werden er plannen opgemaakt om een fiets- en wandelbrug aan te leggen over de Beneden-Nete ter hoogte van PIME / sluizen van Duffel. Deze brug zou toelaten om het gebied tussen de Beneden-Nete en het Netekanaal toegankelijk te maken. Waterwegen & Zeekanaal maakten een plan voor deze brug. Financiering zou gebeuren door de gemeente Duffel, stad Lier, provincie Antwerpen en Waterwegen & Zeekanaal. De bouwaanvraag voor de brug werd afgekeurd wegens een niet rolstoeltoegankelijke aanloophelling op de linkeroever. Daarna verdween het dossier van de agenda. In de visie voor het landschapspark Pallieterland kwam de brug weer op de kaart. <u>Actie 1.8.a – fietsbrug ter hoogte van PIME: studie</u> In kaart brengen van de huidige visie van de verschillende actoren. <u>Actie 1.8.b – fietsbrug ter hoogte van PIME: uitvoering</u>	
TREKKER CONTACTPERSOON	Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens Koen.Eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	
PARTNERS	Stad Lier, gemeente Duffel, De Vlaamse Waterweg, provincie Antwerpen (TPA, DMOB, PIME, PGRM)	
LOCATIE	Beneden-Nete, ter hoogte van PIME 	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Nog te bepalen	
TERMIJN	Actie 1.8.a : te bepalen	

	Actie 1.8.b: te bepalen
MIJLPALEN	Nog te bepalen
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Lier, PIME en PGRM zijn voorstander van de brug. • Overleg op 6/3/2019: De Vlaamse Waterweg is bereid om mee aan dit project te werken indien gelijk verdeling van de kosten tussen de verschillende partners. • Terreinbezoek met partners op landschapsdag van 24/09/2019
VERDERE PLANNING	• Overleg met Duffel. • Overleg met al de partijen. • Prijsraming • Alternatief? Bv. Pontje onderzoeken
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 1.3: toegangspoorten
COMMUNICATIE	• Via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 1.10. sanering Neteland
 Uitvoering Hefboomproject 'landschapspark Pallieterland'

HEFBOOMPROJECT	Landschapspark Pallieterland	
ACTIE NR. 1.10.	Sanering Neteland	
	In het noordelijk deel van provinciaal Groendomein Neteland, aangrenzend aan het PIME-terrein is een voormalige stortplaats van de stad Lier aanwezig. Het stort werd momenteel afgesloten zodat het ontoegankelijk is voor leerlingen en recreanten. Op termijn is een sanering aan de orde.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Stad Lier – www.lier.be Michiel Dons michiel.dons@lier.be Consulente omgeving	
PARTNERS	Stad Lier, Provinciale Groendomeinen Regio Mechelen, Provinciaal Instituut voor Milieu-educatie	
LOCATIE	Noordelijk deel groendomein Neteland, aangrenzend aan terrein PIME. Paarse contour op kaart. 	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Nog te bepalen	
TERMIJN	Maart 2018: heropstart dossier met overleg over aanbesteding onderzoek. Dit onderzoek heeft tot doel om de contour van het voormalig stort nauwkeurig af te bakenen. Maart 2019: Onderzoek perimeter is gebeurd, bijkomend onderzoek is noodzakelijk omdat de vervuiling buiten de perimeter loopt.	
MIJLPALEN		

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Heropstart overleg • Studiebureau zal aangesteld worden voor het verdere bodemonderzoek op de site van PIME, zodat uitsluitsel gegeven kan worden over de afbakening en ernst van de verontreiniging. • Maart 2019: Onderzoek perimeter is gebeurd, bijkomend onderzoek is noodzakelijk omdat de vervuiling buiten de perimeter loopt. Hiervoor wordt een aanbesteding uitgewerkt.
VERDERE PLANNING	Timing van de aanbesteding van het bijkomend onderzoek zal afhankelijk zijn van de budgetbesprekingen van de stad Lier (gekend eind 2019).
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	• Actie 1.8: fietsbrug ter hoogte van PIME
COMMUNICATIE	• Via werkgroep • Via SG pallieterland

HEFBOOMPROJECT	Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier
	Tussen het Albertkanaal en Lier vormen de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak samen een effectief overstromingsgevoelig valleigebied van ongeveer 6 km lang en 1 km breed. In dit valleigebied ontwikkelde zich in de loop der jaren en sterk gefragmenteerd recreatielandschap met kunstmatige vijvers en weekendverblijven, ophogingen allerhande... De vallei ligt hier op de grens van verschillende gemeenten zodat er nood is aan een bovenlokale aanpak van de knelpunten in het gebied. Een grensoverschrijdende visie en gecoördineerde herinrichting bieden enorme kansen om (1) heel wat extra waterberging te realiseren in het valleigebied, (2) bijkomende natuurwaarden te creëren, (3) het gebied beter te ontsluiten op het vlak van recreatie. Doel van het hefboomproject is dus om op basis van een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak, te komen tot concrete realisaties op het terrein. Het hefboomproject sluit aan bij een aantal lopende projecten: - In uitvoering van het stroomgebiedbeheerplan (bekkenspecifieke deel Netebekken) werd eind 2016 het integraal project Molenbeek-Bollaak opgezet (speerpuntgebied). Eén van de werkvelden binnen dit project is de opmaak van een gemeenteoverschrijdend masterplan voor het valleigebied tussen het Albertkanaal en Lier. - Waterwegen & Zeekanaal bereid momenteel de heraanleg van de Molternetebrug over het Netekanaal voor. - In het kader van het Life+-project Kleine Netevallei (Natuurpunt en VMM) werd voor dit gebied reeds heel wat voorbereidend studiewerk (waaronder een ecohydrologische studie) verricht, en werden al een aantal natuur- en inrichtingswerken uitgevoerd. 2.1 Opmaak gebiedsvisie 2.2 Strategie resterende weekendverblijven 2.3 Opmaak RUP Signaalgebied Netevallei Emblem 2.4 Verblijfsrecreatie Kloosterheide 2.5 Uitvoeren RUP Oostmalsesteenweg 2.6 Uitvoeren BPA site Goormans 2.7 Vestiging roeiclub aan Emblem-brug 2.8 Algemene visie recreatie 2.9 Onthaalpoorten 2.10 Hermeandering Bollaak 2.11 Technisch ontwerp en uitvoering hermeandering Bollaak

	2.12 Structuurherstel Tappelbeek 2.13 Actualisatie van de studie 'Hydrologische en hydraulische studie van het stroomgebied van de Krekelbeek en de Laak' met het oog op het vernatuurlijken van de loop van de Krekelbeek. 2.14 Opmaak van een plan van aanpak voor de gebouwen zonder aansluiting op riolering of andere afvalwatervoorziening in het projectgebied	
TREKKER CONTACTPERSOON	Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck sfranck@vmm.be Planningsverantwoordelijke Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	
PARTNERS	Bekkensecretariaat Netebekken, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap voor Natuur en Bos, departement Omgeving, gemeente Nijlen, gemeente Ranst, gemeente Zandhoven, Natuurpunt, provincie Antwerpen (DIW, PGRA), Toerisme Provincie Antwerpen, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland, stad Lier, Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg, OVAM, departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond	
LOCATIE	Grensgebied Ranst, Nijlen, Zandhoven en Lier	
AFSPRAKEN FINANCIERING	/	
GENOMEN BESLISSINGEN	Goedkeuring visienota door de leden van het OC (12/3/2019)	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	- Aanpak weekendverblijven: Overleg en uitwisseling gegevens met Departement Omgeving Afdeling handhaving, Agentschap Binnenlands bestuur, toelichting op overlegplatform handhaving. Gepland overleg met Agentschap Wonen op 25/10. - Opruimen site Goormans: dossier ingediend proeftuin ontharding 2^{de} oproep om ontharden van de site mede te financieren na aankoop door DVW. Dossier werd niet weerhouden. Andere mogelijke financieringspistes? - Opmaak en bekrachtiging visienota: Toelichting strategisch project en visienota aan de nieuwe gemeentebesturen. Bekrachtiging visienota door de verschillende besturen (procedure nog lopende voor stad Lier) - Plenaire vergaderingen met werkgroep op 26/04/2018 en 26/06/2018. - Indienen onthardingssubsidies oproep 1 'Ontharding en waterberging in de vallei van de Kleine Nete' – deadline 09/11/2018.	

	• Opstart subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme (14/12/2018) • 2^{de} Subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme met terrein bezoek (28/05/2019) • Communicatie aan brede publiek van strategisch project en onthardingsproject – Netedag 22/09/2019.
VERDERE PLANNING	•
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	• Integraal project Molenbeek-Bollaak
COMMUNICATIE	• Zie fiches

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.1. opmaak ruimtelijke visie
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.1	Opmaak ruimtelijke visie	
	<u>Actie 2.1: opmaak ruimtelijke visie voor het volledige gebied</u> Tussen het Albertkanaal en Lier vormden de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak samen een effectief overstromingsgevoelig valleigebied van ongeveer 6 km lang en 1 km breed. In dit valleigebied ontwikkelde zich in de loop der jaren en sterk gefragmenteerd recreatielandschap met kunstmatige vijvers en weekendverblijven, ophogingen allerhande, ... De vallei ligt op de grens van verschillende gemeenten zodat er nood is aan een bovenlokale aanpak van de knelpunten in het gebied. Een grensoverschrijdende visie en gecoördineerde herinrichting bieden enorme kansen om (1) heel wat extra waterberging te realiseren in het valleigebied, (2) bijkomende natuurwaarden te creëren en (3) het gebied beter te ontsluiten op het vlak van recreatie. Doel van het hefboomproject is dus om op basis van een integrale landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal, en de Molenbeek-Bollaak, te komen tot concrete realisaties op het terrein. Doel van deze actie is het opmaken van de ruimtelijke visie voor het hele gebied.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	
PARTNERS	Bekkensecretariaat Netebekken, Natuurpunt, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland, Toerisme Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, gemeente Ranst, gemeente Nijlen, stad Lier, gemeente Zandhoven, departement Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, De Vlaamse Waterweg	
LOCATIE	Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-Bollaak.	

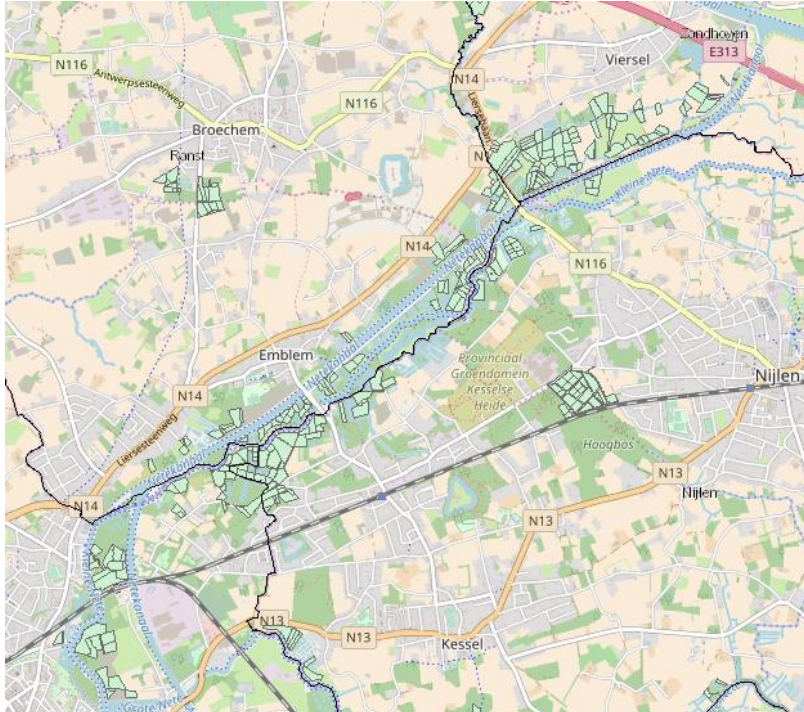
AFSPRAKEN FINANCIERING	/
TERMIJN	2018 - 2019
MIJLPALEN	• Goedkeuring visienota OC-leden (12/3/2019) • Goedkeuring visienota door de verschillende bestuursniveaus
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Voorbereiding werkgroep met alle betrokkenen. ○ Voorbereidende vergadering met regionale landschappen en Natuurpunt ○ Terreinbezoek met Natuurpunt ○ Afstemmingsvergadering met regionale landschappen ○ Vergadering met Vlaamse overheid en gemeente Nijlen over Goormans ○ Vergadering met Vlaamse overheid over handhaving • 26/04/2018: workshop voorbereiding visie dmv 'Visionary' • 26/06/2018: vergadering werkgroep aftoetsen visie • 14/12/2018: 1^{ste} Subwerkgroep water, natuur, weekendverblijven en toerisme • Toelichting strategisch project en visienota aan de nieuwe gemeentebesturen ○ 14/2/2019: College Ranst ○ 18/2/2019: College Lier ○ 25/3/2019: college Nijlen • 12/3/2019: Goedkeuring visie OC-leden
VERDERE PLANNING	• Communicatie van de visie naar het brede publiek via Netedag en infokrant 'Water aan zet in de vallei van de Kleine Nete'
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Integraal project Molenbeek-Bollaak • Zuidrand 2.0
COMMUNICATIE	• Via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.2 WEEKENDVERBLIJVEN
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.2	Weekendverblijven	
	<u>Actie 2.2.a. Bepalen van strategie en inzet van instrumenten voor de resterende weekendverblijven</u> Natuurpunt kocht de afgelopen jaren een groot aantal weekendverblijven op, brak deze af en dempte de vijvers met de oorspronkelijke grond, deze werd immers gebruikt om de rest van het terrein te verhogen. De afgelopen jaren kon Natuurpunt daarvoor beroep doen op de subsidies van het LIFE+-project Kleine Nete. Dit project is nu afgelopen. Om de weekendverblijven op te kopen treden medewerkers (vrijwilligers en beroepskrachten) in contact met de eigenaars en trachten hen te overhalen om te verkopen. Het lijkt momenteel echter moeilijk om nog weekendverblijven op te kopen. In de gemeente Nijlen werd de taks op tweede verblijven sterk verhoogd waardoor er verschillende weekendverblijven te koop werden aangeboden aan Natuurpunt. Deze actie moet een strategie bepalen voor de verwerving van de resterende weekendverblijven. Deze strategie zal samen ontwikkeld worden met actie 2.1, opmaak van een ruimtelijke visie voor het volledige gebied. Deze strategie bestaat uit: - Inventarisatie van de weekendverblijven: eigenaars, statuut, huidige toestand (goed, vervallen, ...), huidig gebruik, ... - Lijst van instrumenten die ingezet kunnen worden. - Een overzicht van wie de percelen zal verwerven en met welke middelen. <u>Actie 2.2.b. aankoop resterende weekendverblijven, vijvers, ... (± 5 per jaar)</u> Gedurende de loop van het strategisch project zal Natuurpunt (of andere partners), waar mogelijk, percelen verwerven. <u>Actie 2.2.c afbraak aangekochte weekendverblijven tussen 2016 en 2019</u> De aangekochte weekendverblijven worden afgebroken.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Natuurpunt – www.natuurpunt.be Wout Opdekamp Wout.opdekamp@natuurpunt.be Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	 

	Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	
PARTNERS	Natuurpunt, VMM	
LOCATIE	Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-Bollaak. Zone met weekendverblijven.	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN	Actie 2.2.a: 2018 Acties 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d: 2018-2020	
MIJLPALEN	- Eerste bespreking op WG 26/06. - Inventaris: - Er werd een inventaris op hoofdlijnen gemaakt van het gebied. Hieruit blijkt dat er tussen 5 en 7 permanente bewoningen zijn in de zone tussen Molterneteburg en Emblem-brug. Het merendeel van de particuliere percelen betreft visvijvers en/of weekendverblijven. In sommige zones zijn in het verleden al heel wat verwervingen gebeurd, ondermeer thv Zomerklokje en Steenbeemden. Andere zones blijven achter. Wat de gemiddelde verkoopprijzen in het gebied betreft, zijn deze soms onrealistisch hoog. De notarissen hebben informatieplicht, maar veel mensen lezen dit niet en weten niet wat ze juridisch gezien aankopen. - Heel wat van de weekendverblijven zijn in zeer slechte staat (zie ook foto's ppt) en dateren uit lang vervlogen tijden. Het vermoeden bestaat dat een aantal van deze percelen op korte termijn kan verworven worden. Bij de permanente bewoning moet bekeken worden wat de eigenlijke woonkwaliteit is. Sommige van deze woningen kunnen mogelijks onbewoonbaar verklaard worden, waarbij in samenwerking met het OCMW een alternatieve woonst kan aangeboden worden. - Instrumenten: - Handhaving - Nieuwe wetgeving codex RO met ingang van 1 maart 2018: Voor inbreuken waarop geen vonnis rust, kan de Vlaamse overheid slechts de eerste 5 of 10 jaar (in ruimtelijk kwetsbaar gebied) na de inbreuk optreden. - Op de constructies in kwestie kan niet meer gehandhaafd worden, maar ze blijven illegaal. Werken en handelingen die aan die constructies in de toekomst gebeuren, zijn opnieuw illegaal en dus handhaafbaar. Dit betekent dat er zeer kort op de bal moet gespeeld worden bij vaststellen van werkzaamheden allerlei. - Departement Omgeving afdeling Handhaving heeft de dossiers overgemaakt waarop PV's/herstelvorderingen rusten. Veel van deze herstelvorderingen zijn ofwel nog hangende ofwel geseponeerd door het parket van de Procureur des Konings. Meestal bleven deze dossiers op het terrein zonder veel gevolg. - Taks tweede verblijven - De geïnde taksen tweede verblijf in de 4 gemeenten werden naast elkaar gezet. Voor de gemeente Zandhoven is het niet duidelijk of er een belastingreglement is mbt tweede verblijven.	

	• Opvallend is het verschil in tarieven en invalshoek van de taks voor de gemeenten Lier, Nijlen en Ranst. • Andere instrumenten: • Voorkooprecht: ANB/Vlaamse Waterweg hebben voorkooprecht, maar oefenen dit in het gebied zo goed als nooit uit. Deze percelen zijn daarna meestal voor ettelijke jaren uit de markt. • Verwervingssubsidies: beschikbaar als instrument, maar zijn feitelijk ruim onvoldoende • Communicatie naar burgers • Onteigening: Dit kan voor Nijlen alleen als dat kadert in een veel groter geheel en alle andere gemeenten hier in mee stappen... • Ruimtelijke impulsprojecten: mogelijkheid, maar uitvoeringsbesluit is nog in voorbereiding. • Sanering • Crowdfunding • Instrumentenkoffer VLM • • De vergadering is het erover eens dat er best een mix van instrumenten wordt ingezet. • Hinderpalen: • De verplichting om eenieder in te schrijven op het adres van keuze, ongeacht de feitelijke toestand, vergunningstoestand en bestemming, heeft er voor gezorgd dat een aantal constructies permanent bewoond worden (hoofdverblijfplaats). • Door de verjaringstermijn van 5 jaar (10 jaar voor ruimtelijk kwetsbaar gebied) cfr. het nieuwe handhavingsdecreet, kan tegen een heel aantal oudere inbreuken niet verder opgetreden worden. • Recht van voorkoop wordt niet uitgeoefend door De Vlaamse Waterweg / ANB. Hierdoor is er op korte termijn weinig kans om deze percelen nog te verwerven. • Natuurpunt kan slechts 1,5-2 euro/m² bieden, wat in een aantal gevallen ver onder de vraag- en verkoopprijs ligt. Gronden zijn in verleden vaak aan rel. hoge bedragen (>10/m²) gekocht en zijn daardoor, ondanks dat ze soms in onbruik zijn, buiten bereik voor regulier aankoopbeleid van Natuurpunt. • Laatste loodjes: in sommige deelzones zijn we >75% beheerder. Voor resterende puzzelstukken is een extra impuls noodzakelijk. Een sector-overschrijdend kader waarbinnen bestaand instrumentarium geoptimaliseerd wordt (bv uitdoofbeleid, onteigening laatste loodjes, ...), is ons inziens noodzakelijk. • Sectorale benadering: door de ligging binnen SBZ, overstromingsgebied, deels beschermd landschap, ... of (potentiële) bodemverontreiniging zijn er veel overheden betrokken partij (ANB, waterloopbeheerders, OE, Ovam, Dept. Omgeving, ...). Momenteel benadert echter bijna elke overheid het vanuit zijn/haar hoek waardoor er weinig vooruitgang geboekt wordt. Hiertoe is er nood om hen samen aan tafel te krijgen, zowel voor inhoudelijke afstemming als voor financiële engagementen. Om het concreet te maken kunnen twee ophogingen die Natuurpunt heeft verworven als case gebruikt worden. Inrichting van één van deze zones (ong 2,5ha) kost bv om en bij €1.000.000. Los van feit dat er momenteel slechts twee relatief vlot toegankelijke kanalen zijn (ontharding en PSN), zijn dergelijke bedragen te hoog om vanuit één sector te laten financieren (totale PSN-budget dit jaar ong 5 milj). • Indiening (09/11/2018) en goedkeuring impulsproject ontharding: • €250.000 subsidie • Dit project zal een reconversie van een gebied met de bestaande weekendverblijven naar natuurgebied realiseren (+/- 10ha). Het eerste terreinbezoek vond plaats op 27/2/2019.
--	---

	• Verder uitklaren van mogelijke instrumenten via overleg met Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Handhaving, toelichting op overlegplatform handhaving, overleg met Agentschap Wonen, onthardingsproject.
GENOMEN BESLISSINGEN	Afspraken en actiepunten: • In toepassing van het stand-still principe engageren de partijen met handhavingsbevoegdheid zich om actief oog te hebben voor nieuwe en recente (jonger dan 10 jaar) inbreuken, en hierbij telkens hun handhavingsbevoegdheid consequent uit te oefenen. • De gemeenten engageren zich om zeer rigoreus om te springen met aanvragen tot vermoeden van vergunning mbt constructies die niet in overeenstemming zijn met de hier goedgekeurde visie. • Uitklaren noodzakelijk vergunningstraject voor dempen van (illegale) vijvers tussen Departement Omgeving Afdeling GOP en Handhaving, ANB en gemeenten. • Opmaak gedetailleerde inventaris van het gebied met ook weergave oppervlakten (Bsec); • De gemeenten lijsten gewenste verwervingen (40% subsidie) binnen de projectcontour van het strategisch project op. • Departement Omgeving toetst taks tweede verblijven of mogelijke alternatieve taksen juridisch af • Indiening en goedkeuring onthardingsproject.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Natuurpunt heeft reeds een groot aantal weekendverblijven aangekocht, de bouwwerken afgebroken en de vijvers gedempt. Onderstaande kaart geeft in groen de percelen weer die beheerd worden door Natuurpunt.  • Opmaak van een lijst met mogelijke instrumenten voor de verwerving van weekendverblijven. • Informatie verzamelen over herstel in oorspronkelijke staat illegale vijvers/verblijven •

VERDERE PLANNING	• Verdere opvolging proeftuin ontharding. De kwaliteitskamer van het traject proeftuinen ontharding vraagt om visuals van de toekomstvisie voor de hele vallei. Concrete aanpak nodig. • Overleg met Agentschap Wonen op 25/10
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	• Afstemming met: Integraal project Molenbeek-Bollaak
COMMUNICATIE	Via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.2d. Herstel microreliëf
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.2d	Herstel microreliëf thv illegale storten, ophogingen en vergraven vijvers	
	<u>Actie 2.2.d herstel microreliëf t.h.v. illegale storten, ophogingen, vergraven vijvers</u> De storten worden verwijderd. Vijvers worden aangekocht en het microreliëf wordt hersteld om maximaal waterberging te creëren. Bij een doorrekening van meerdere scenario's binnen het Life-project Kleine Nete blijkt dat bij een herinrichting van de benedenloop van de Bollaak en de zone ten noorden van het Netekanaal een extra volume kan geborgen worden van respectievelijk 214.000 m3 bij een 2-jaarlijkse bui en 378.000 m3 bij een 100-jaarlijkse bui. 120 ha van het historisch maaiveld werd grondig verstoord in het projectgebied.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Natuurpunt – www.natuurpunt.be Wout Opdekamp Wout.opdekamp@natuurpunt.be Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	 
PARTNERS	Natuurpunt, VMM	
LOCATIE	Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-Bollaak.	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN	2.2.d: 2018-2020	

MIJLPALEN

Eerste bespreking op WG 26/06.

Inventaris:

Sandra Franck heeft een inventaris op hoofdlijnen gemaakt van het gebied.

Instrumenten:

- Handhaving
- Taks tweede verblijven: het merendeel van de vergraven visvijvers heeft een weekendverblijf op hetzelfde perceel.

Andere instrumenten (zie ook ppt):

- Voorkooprecht: ANB/Vlaamse Waterweg hebben voorkooprecht, maar oefenen dit in het gebied zo goed als nooit uit. Deze percelen zijn daarna meestal voor ettelijke jaren uit de markt.
- Verwervingssubsidies: beschikbaar als instrument, maar zijn feitelijk ruim onvoldoende
- Communicatie naar burgers
- Onteigening: Dit kan voor Nijlen alleen als dat kadert in een veel groter geheel en alle andere gemeenten hier in mee stappen...
- Ruimtelijke impulsprojecten: mogelijkheid, maar uitvoeringsbesluit is nog in voorbereiding.
- Sanering
- Crowdfunding
- Instrumentenkoffer VLM

De vergadering is het erover eens dat er best een mix van instrumenten wordt ingezet.

Maarten Horemans vraagt aandacht voor volgende problematiek: eigenaars krijgen af en toe geld om vijver te laten dempen. Als de vijver niet conform is, is er geen vergunning nodig om misdrijf (illegale vijver) ongedaan te maken, of wel? Afdeling Handhaving vraag input van ANB. Dit moet uitgeklaard worden zodat iedereen hier op dezelfde manier mee omgaat.

Indiening (09/11/2018) en goedkeuring impulsproject ontharding

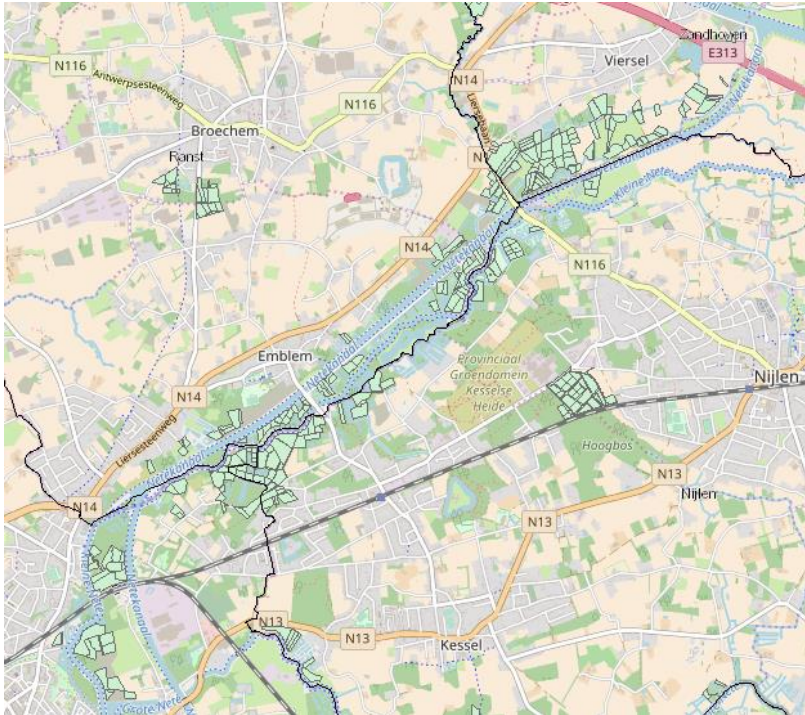
- €250.000 subsidie. Dit project zal een reconversie van een gebied met de bestaande weekendverblijven naar natuurgebied realiseren (+/- 10ha). Het eerste terreinbezoek vond plaats op 27/2/2019.

Indiening (15/05/2019) proefproject ontharding 2^{de} oproep 'verwijderen van steenpuin en waterberging in de vallei van de Kleine Nete tussen Albertkanaal en Lier'. Dit project werd niet weerhouden.

Er werden budgetten gevraagd voor de restfinanciering van volgende dossiers:

- Site Zomerklokje: wegnemen van vervuild steenpuin op 1,5 ha – 34.200 m³ extra waterberging – inrichten als 6430 (zoomvormende ruigte met zomerklokje) habitat. Zomerklokje is een rode lijst soort waarbij de verspreiding beperkt is tot de vallei van de Kleine Nete en Grote Nete.
- Site Goormans: verwerving van site door de Vlaamse Waterweg (op 29/04/2019 werd een mondeling akkoord bereikt met de eigenaar). Verwijderen van 2000 m² bedrijfsgebouwen en 4200 m² betonverharding. Ambitie vanuit de projectpartners om de site als toekomstige onthaalpoort Molternetebrug in te richten.

	Voor volgende dossiers werd een PSN-subsidie Natuur aangevraagd bij ANB. Hiertoe werd een ondersteunend schrijven vanuit de Opvolgingscommissie Kleine Nete gericht aan het Agentschap voor Natuur en Bos: ○ Site Viersels Gebroekt: Deze site ligt centraal binnen het natuurgebied Viersels Gebroekt. Dit natuurgebied kende een belangrijke impuls vanuit het Life+ project Kleine Nete (2011-2016) en vormt een belangrijke schakel in de waterberging langsheen de Molenbeek-Bollaak en zijlopen zoals de Klein Beek en de Tappelbeek. De projectindiener voor dit dossier is Natuurpunt. Overige partners die wensen bij te dragen in dit project zijn De Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). ○ Site Zomerklokje: Deze site ligt ten noorden van de Dorpsbeek en het Netekanaal. Met dit project wordt habitat voor het Zomerklokje gecreëerd (abiotiek is grotendeels beperkt tot de vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier). De projectindiener voor dit dossier is het Regionaal landschap De Voorkempen. Ook de gemeente Ranst draagt financieel bij om dit project te verwezenlijken. Natuurpunt is projectpartner in dit dossier. Deze acties zijn van strategisch belang binnen het hefboomproject en bij uitbreiding binnen de vallei van de Kleine Nete. Het toekennen van projectsubsidies natuur is een cruciale randvoorwaarde om deze acties ook effectief te kunnen uitvoeren.
GENOMEN BESLISSINGEN	Afspraken en actiepunten: • In toepassing van het stand-still principe engageren de partijen met handhavingsbevoegdheid zich om actief oog te hebben voor nieuwe en recente (jonger dan 10 jaar) inbreuken, en hierbij telkens hun handhavingsbevoegdheid consequent uit te oefenen. • De gemeenten engageren zich om zeer rigoureuus om te springen met aanvragen tot vermoeden van vergunning mbt constructies die niet in overeenstemming zijn met de hier goedgekeurde visie. • Uitklaren noodzakelijk vergunningstraject voor dempen van (illegale) vijvers tussen Departement Omgeving Afdeling GOP en Handhaving, ANB en gemeenten. • Opmaak gedetailleerde inventaris van het gebied met ook weergave oppervlakten (Bsec); • De gemeenten lijsten gewenste verwervingen (40% subsidie) binnen de projectcontour van het strategisch project op. • Departement Omgeving toetst taks tweede verblijven of mogelijke alternatieve taksen juridisch af • Indiening en goedkeuring onthardingsproject.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Natuurpunt heeft reeds een groot aantal weekendverblijven aangekocht, de bouwwerken afgebroken en de vijvers gedempt. Onderstaande kaart geeft in groen de percelen weer die beheerd worden door Natuurpunt.

	 • Opmaak van een lijst met mogelijke instrumenten voor de verwerving van weekendverblijven. • Informatie verzamelen over herstel in oorspronkelijke staat illegale vijvers/verblijven • Uitzoeken mogelijkheid overlast taks voor zone vreemde weekendverblijven
VERDERE PLANNING	• verdere opvolging proeftuin ontharding. • Overleg met Agentschap Wonen op 25/10
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Integraal project Molenbeek-Bollaak
COMMUNICATIE	Via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.3 Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.3	Opmaak RUP signaalgebied Netevallei Emblem	
	Beslissing Vlaamse Regering d.d. 31/03/2017. Conclusie signaalgebied: Het signaalgebied kent een middelgrote en deels grote overstromingskans. In het westen is het signaalgebied bestemd als recreatiegebied, in het oosten als woongebied. Binnen dit signaalgebied is een nieuwe functionele invulling noodzakelijk voor het meest kwetsbare laaggelegen woongebied. Enkel het hoger gelegen woongebied in het oosten van het signaalgebied kan ontwikkeld worden, mits strenge randvoorwaarden vanuit het watersysteem. Het vloerpeil van de toekomstige woningen moet voldoende hoog zijn. Er worden geen netto-ophogingen op perceelsniveau toegelaten, waarbij de potentiële wateroverlast wordt afgewenteld op reeds bestaande woningen in Emblem-centrum. Dit betekent onder andere dat tuinpercelen niet mogen opgehoogd worden. De bestemming recreatiegebied is compatibel met het watersysteem, mits gekozen wordt voor zachte vormen van recreatie. Bij een eventuele (liefst beperkte) inrichting van het gebied moet de waterbalans steeds in evenwicht zijn, zodat geen waterbergend vermogen verloren gaat.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Gemeente Ranst Liesbeth Luyckx Liesbeth.luyckx@ranst.be Omgevingsambtenaar	
PARTNERS	Bekkensecretariaat Netebekken, Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, departement Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, De Vlaamse Waterweg, Natuurpunt, regionaal landschap Kleine en Grote Nete	
LOCATIE	Gemeente Ranst tussen kern Emblem en Netekanaal op beide oevers van de Kesselsesteenweg 	

AFSPRAKEN FINANCIERING	
TERMIJN	
MIJLPALEN (detailleerde termijn)	
GENOMEN BESLISSINGEN	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	
VERDERE PLANNING	• Overleg inplannen met Liestbeth Luyckx
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	SBZ-gebied 'vallei van de Kleine Nete met brongebied, moerassen en heiden' Recreatieve doorsteek ism regionaal landschap Kleine en Grote Nete
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.6. uitvoeren BPA site Goormans
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.6	Uitvoeren BPA site Goormans	
	Tot op heden wordt het BPA Site Goormans niet nageleefd. Om de uitvoering van het BPA af te dwingen is een handhavingstraject noodzakelijk.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Gemeente Nijlen www.nijlen.be Maarten Horemans Maarten.horemans@nijlen.be Diensthoofd ruimte Departement Omgeving afdeling handhaving www.omgevingvlaanderen.be Wilfried Van den Acker Wilfried.vandenacker@vlaanderen.be handhavingsmanager Bekkensecretariaat Netebekken http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke	 
PARTNERS	Gemeente Nijlen, lokale politie Nijlen, Departement Omgeving afdeling handhaving, provincie Antwerpen, Departement Omgeving, IOK, OVAM, Vlaamse Waterweg, VMM, projectcoördinator SP	
LOCATIE	Grondgebied Nijlen, omgeving Molternetebrug	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN		
MIJLPALEN (detailleerde termijn)		
GENOMEN BESLISSINGEN		

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	16/01/18: agendering op OC Kleine Nete 05/03/18: Vergadering met Vlaamse overheid en gemeente Nijlen over site Goormans 04/07/18: overleg gemeente Nijlen, politie Nijlen, VMM, provincie Antwerpen Departement Omgeving, OVAM, IOK 04/10/18: afstemming Departement Omgeving afdeling Handhaving met OVAM, DVW, gemeente, lokale politie Nijlen Acties: 17/08/18: aangetekende en formele ingebrekestelling verzonden aan Goormans Handhavingstraject opgestart vanuit Departement Omgeving afdeling handhaving klasse 1 inrichting Controle door gemeente/lokale politie inzake stedenbouwkundige vaststellingen - De afdeling Handhaving (Milieu-inspectie) zal een controle doen bij de site Goormans (kanaal) aangezien hier sprake is van een klasse 1 inrichting. De andere site Goormans zal niet door Milieu-inspectie worden aangedaan, tenzij er nog elementen worden aangereikt waaruit zou blijken dat er sprake is van een klasse 1 inrichting. Er zal worden gewerkt met PV en bestuurlijke maatregel met dwangsom waarbij een periode van 3 maand wordt gegeven voor het verwijderen van het aanwezige materiaal/afval. De activiteiten in functie van de bedrijvigheid dienen onmiddellijk te worden stopgezet. - Daarnaast zal de gemeente/lokale politie een controle doen op beide sites van de firma Goormans teneinde stedenbouwkundige vaststellingen te doen. Indien er ter plaatse zou kunnen worden vastgesteld dat er sprake is van een gewoonlijk gebruik van het perceel voor opslag van materieel en materiaal werd afgesproken dat ook de staking zou worden bevolen. Hierbij is het van belang om te onderzoeken of er op heden nog actieve handelingen zijn en verplaatsen/herplaatsen/aanvoeren van nieuw materiaal waaruit het vergunningsplichtig gewoonlijk gebruik kan worden afgeleid. In principe is het bijgevolg aangewezen om voorafgaand aan de daadwerkelijke staking dan ook enkele vaststellingen te doen waaruit blijkt dat er op de sites nog verplaatsing is van materiaal en er dus geen sprake is van louter (statige) opslag. Het is me niet duidelijk of het bovenstaande in de praktijk daadwerkelijk mogelijk zal zijn om dergelijke vaststellingen te doen. - De afdeling Handhaving en de politie zullen de refertes van de eigen PV's aan elkaar doorgeven zodat er in de verschillende PV's kan worden verwezen naar de respectievelijke refertes van de andere PV's. Feb.2019: Doorbraak in het dossier. De familie Goormans is informeel in overleg met de gemeente Nijlen over een mogelijke verkoop van de site. De verschillende partners (Nijlen, VMM, De Vlaamse Waterweg) hadden een overleg over de mogelijke nabestemming van deze site. De Vlaamse Waterweg laat (start: maart 2019) de gronden schatten en maakt een eerste schatting van de kosten voor de sloop van het gebouw op. De Vlaamse Waterweg heeft in de maand mei de procedure opgestart voor het aanstellen van notaris/VLABEL voor het regelen van de akte ifv de aankoop. Het dossier proeftuin ontharding oproep 2 'verwijderen van steenpuin en waterberging in de vallei van de Kleine Nete van Albertkanaal tot Lier' werd niet weerhouden. Dit betekent dat er alternatieve budgetten moeten gezocht worden om de site Goormans te ontharden en toekomstig in te richten als onthaalpoort.
---------------------------------------	--

VERDERE PLANNING	• Overleg aankoop site met Nijlen en de eigenaars. • Overleg Nijlen, VMM, De Vlaamse Waterweg over de mogelijke nabestemming. • Eventuele mogelijkheid tot indienen onthardingssubsidie bekijken
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	/
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.8. Recreatie
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.8	Recreatie	
	<u>Actie 2.8.a. opmaak ontwerp onderzoek recreatie voor het gebied</u> Doel van deze actie is het in kaart brengen van: 1) De bestaande recreatiemogelijkheden 2) De missing links Het uitvoeren van deze actie gaat samen met het opmaken van een inrichtingsvisie voor het volledige gebied (actie 2.1). <u>Actie 2.8.b. uitrol recreatieve luik in het gebied</u> <u>Actie 2.8.c. promotie door toeristische diensten</u>	
TREKKER CONTACTPERSOON	<u>Actie 2.8.a.</u> Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck sfranck@vmm.be Planningsverantwoordelijke Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete <u>Actie 2.8.b. en 2.8.c.</u> Te bepalen	
PARTNERS	Gemeente Ranst, gemeente Nijlen, gemeente Zandhoven, stad Lier, TPA	
LOCATIE	Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-Bollaak.	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN	Eerst actie 2.1: opmaak ruimtelijke visie voor het volledige gebied. Deze visienota is gefinaliseerd.	

MIJLPALEN	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Nijlen beschikt over een Masterplan 'Open Ruimte Perspectief' en lichtte dit werk toe op een werkgroep op 14/12/2018. • Informeel overleg met Nijlen over het masterplan op 14/1/2019. • Informeel overleg met TPA op 1/3/2019 • Toelichting onthaalpoorten door Gaston Maes van TPA op WG 28/05/2019. • Opstart mogelijkheden onthaalpoorten en onderzoek missing links
VERDERE PLANNING	• Verder zetten werkgroep recreatie voor opmaak actieplan → Afstemming met de uitrol recreatie voor het volledige strategisch project/ volledig project gebied. • Verder zetten in kaart brengen bestaande mogelijkheden en missing links. •
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Integraal project Molenbeek-Bollaak • Toerisme Provincie Antwerpen (Kempen)
COMMUNICATIE	• Via werkgroep

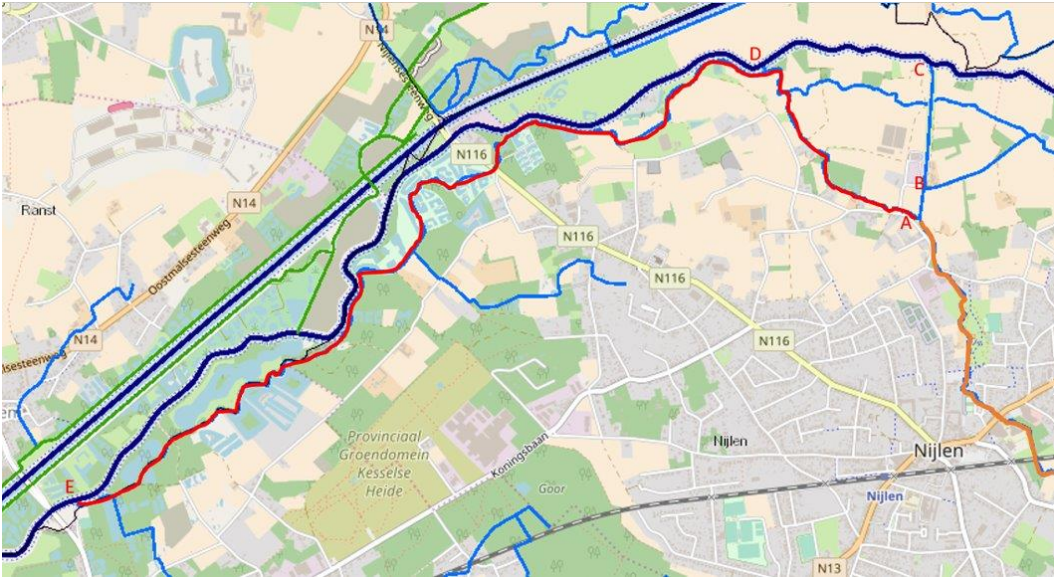
STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.12 Structuurherstel Tappelbeek
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.12	Structuurherstel voor de Tappelbeek stroomafwaarts de E313 (behorend tot beschermd gebied BE2100017) door actieve heractivatie van het meanderingsproces	
	Deze actie werd opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, bekkenspecifiek deel Benedenschelde.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html Didier Soens Didier.SOENS@provincieantwerpen.be Directeur dienst Integraal Waterbeleid Ben Spiessens ben.spiesens @provincieantwerpen.be Districtsverantwoordelijke district Nete Elsbeth De Wachter Elsbeth.dewachter@provincieantwerpen.be Adviseur Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke	 
PARTNERS	Natuurpunt, VMM, gemeente Zandhoven, gemeente Ranst	
LOCATIE	Tappelbeek afwaarts E313 tot aan monding in Bollaak in Viersels Gebroekt	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN		
MIJLPALEN		

(detaillerte termijn)	
GENOMEN BESLISSINGEN	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Er zijn potenties voor structuurherstel langs de Tappelbeek: - Natuurpunt heeft heel wat gronden verworven op de linkeroever afwaarts de E313 (blok van 9 ha). Provincie en Natuurpunt bekijken samen of ingrepen mbt structuurkwaliteit (actief vergraven, stroomdeflectoren,...) mogelijk/wenselijk zijn. Op de rechteroever heeft natuurpunt geen eigendommen. De provincie wacht de gevolgen van de nieuwe beveractiviteiten ter hoogte van deze percelen af. Deze kunnen een significante bijdrage betekenen voor de vooropgestelde doelstellingen - Er worden 3 woningen aangekocht langs de Tappelbeek door provincie, VMM, Waterlink en AWV. Hierdoor verdwijnt een belangrijk risico op wateroverlast en conflict met de waterwinning (interactie met het Netekanaal). Thv de aangekochte woning voorziet de provincie in een herinrichting. - Globaal heeft de Tappelbeek nog een goede structuurkwaliteit. Op termijn zijn er misschien nog potenties voor structuurherstel thv tussenliggende zone (omgeving Massenhovensesteenweg)? Deze zone werd mee herbestemd naar natuurgebied via het GRUP vallei van de Tappelbeek. Informeel overleg met DIW op 8/3/2019. Via kleine investeringen op terrein wordt momenteel aan deze actie gewerkt.
VERDERE PLANNING	Overleg voor verdere afstemming tussen de verschillende partners
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: - Integraal project Molenbeek-Bollaak - SBZ BE2100017 'valleigebied van de Kleine Nete met brongebied, moerassen en heide'
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.13 Studie Krekelbeek
 Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.13.	Actualisatie van de studie 'hydrologische en hydraulische studie van het stroomgebied van de Krekelbeek en de Laak' met het oog op het vernatuurlijken van de loop van de Krekelbeek. ...t volledige debiet van de Krekelbeek/Nijlense Beek wordt momenteel overgepompt naar de Kleine Nete. ...ewel de pompen goed werk leveren is het toch wenselijk om de beek opnieuw gravitair te laten monden in de ...ine Nete. De pompen werken immers niet gratis en bovendien kan een electriciteitspanne op een cruciaal ...ment voor overstromingen zorgen. De randvoorwaarden zijn nu anders dan 15 jaar geleden: oplossen van het ...migratieknelpunt, oplopend kostenplaatje voor de permanente pompkosten, installatie binnen x-aantal jaren te ...nieuwen, ingericht beekpark in de gemeente Nijlen, gronden aangekocht door Natuurpunt in zone ten noorden ...n Vogelzangstraat,... ...n update van de hydrologische en hydraulische studie kan uitsluitsel geven of een terugkeer naar een meer ...uurlijk systeem mogelijk is. De Krekelbeek afwaarts het pompstation in quasi stilstaand water, wat ook veel ...el afvoert. De randvoorwaarden voor de Krekelbeek worden mee geïntegreerd in de studie: hoogteligging van ...gebied, actief landbouwgebied in de ruimere omgeving, geen wateroverlast te Nijlen-centrum,...	
TREKKER CONTACTPERSOON	Provincie Antwerpen – dienst Integraal Waterbeleid https://www.provincieantwerpen.be/leefmilieu/waterlopen.html Didier Soens Didier.SOENS@provincieantwerpen.be Directeur dienst Integraal Waterbeleid Ben Spiessens ben.spiesens@provincieantwerpen.be Districtsverantwoordelijke district Nete Elsbeth De Wachter Elsbeth.dewachter@provincieantwerpen.be Adviseur Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke	 Provincie Antwerpen 
PARTNERS	Natuurpunt, VMM, gemeente Nijlen, gemeente Ranst, ADLO, Boerenbond	
LOCATIE	Krekelbeek/Nijlense Beek	

	 A: versperring Krekelbeek B: pomp C: huidige monding bovenloop D: oorspronkelijke monding E: huidige monding benedenloop Oranje/rode lijn: Krekelbeek
AFSPRAKEN FINANCIERING	
TERMIJN	
MIJLPALEN (detailleerde termijn)	Visionary workshop 26/04: DIW (provincie Antwerpen) stelt voor om de studie te actualiseren en met alle betrokkenen naar een consensus te zoeken.
GENOMEN BESLISSINGEN	•
HUDIGE STAND VAN ZAKEN	• Informeel overleg met DIW op 8/3/2019 waarin DIW aangeeft op korte termijn geen acties en budget op deze actie in te zetten. • Toelichting visie op college Nijlen 25/03.
VERDERE PLANNING	• Overleg met Nijlen • Overleg met betrokken partners
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Integraal project Molenbeek-Bollaak • SBZ BE2100017 'valleigebied van de Kleine Nete met brongebied, moerassen en heide'
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 2.14. opmaak van een plan van aanpak voor de gebouwen zonder aansluiting op riolering of andere afvalwatervoorziening in het projectgebied

Uitvoering Hefboomproject 'Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier'

HEFBOOMPROJECT	Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier	
ACTIE NR. 2.14	Opmaak van een plan van aanpak voor de gebouwen zonder aansluiting op riolering of andere afvalwatervoorziening in het projectgebied	
	In het projectgebied zijn een aantal frappante lozingen op kwetsbare waterlopen/gebieden gesignaleerd. Hier wordt op korte termijn een oplossing voor gezocht.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Bekkensecretariaat Netebekken – http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/bekkens/netebekken/ Sandra Franck s.franck@vmm.be Planningsverantwoordelijke	
PARTNERS	Bekkensecretariaat Netebekken, Natuurpunt, Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland, Toerisme Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen, gemeente Ranst, gemeente Nijlen, stad Lier, gemeente Zandhoven, departement Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, De Vlaamse Waterweg	
LOCATIE	Grensgebied tussen Lier, Nijlen, Ranst en Zandhoven rond Kleine Nete, Netekanaal en Molenbeek-Bollaak.	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN	2018-2020	
MIJLPALEN (gedetailleerde termijn)		
GENOMEN BESLISSINGEN		
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Toelichting op WG 26/6/18: Sandra Franck geeft een overzicht van de planning voor zowel riolerings- als individuele zuiveringsinfrastructuur (gebiedsdekkende uitvoeringsplannen en IBA's).	

	Het is de bedoeling om deze plannen verder te prioriteren ifv de doelstellingen van het strategisch project, zodat prioritair kan ingezet worden op de rioleringsstrengen en lozingen met een rechtstreekse impact op het gebied. Belangrijke bedenking hierbij: het is vermoedelijk niet aangewezen om onvergunde/ongewenste infrastructuur te gaan verplichten om het afvalwater te zuiveren. Dit zou als een bevestiging van de situatie op het terrein kunnen beschouwd worden. Opvallende knelpunten: • Rechtstreekse lozing woningen Beemdweg op natuurreservaat Steenbeemden - geen timing volgens GUP (cluster GUP-12026-161) • Rechtstreekse lozing woningen + brasserie 'opa's eethuisje' Elzestraat op Elstbeek en Krekelbeek – GUP prioriteit 8 (cluster GUP-12026-172) • Ontbrekende bovengemeentelijke rioleringsstrengen te Ranst.
VERDERE PLANNING	Opnemen met betrokken gemeenten en rioolbeheerders. Ingediende GIP-dossiers krijgen hogere prioriteit door integrale projectwerking.
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.0.
Uitvoering Hefboomproject 'Graafweide-Schupleer'

HEFBOOMPROJECT	Graafweide-Schupleer
	Het gebied Graafweide-Schupleer omvat het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa ten oosten van de kern van Grobbendonk en ten noorden van het militair domein. Het centrale deel van dit gebied is aangeduid als habitatrichtlijngebied. Het gebied is ca. 360 ha groot. Binnen het onderzoeksgebied is ca. 200 ha geregistreerd als landbouwgebruik, waarvan ca. 150 ha grasland en 50 ha akkers. Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa is zowel een habitatrichtlijngebied, een speerpuntgebied inzake waterkwaliteit als een gebied met bijzondere landschaps- en erfgoedwaarde (beschermd landschap en monumenten, vastgesteld landschapsatlasrelict). De functies landbouw, natuur, water, bos en recreatie komen er vandaag sterk verweven voor. Het gebied dat centraal in de vallei van de Kleine Nete ligt tussen de woonkernen van Grobbendonk en Vorselaar, biedt nauwelijks te onderschatten potenties om uit te groeien tot een multifunctionele, bovenlokale aantrekkelijke én toegankelijke groenpool in de vallei. Voor het Natura 2000-gebied werd in overleg met de actoren een ruimtelijk compromisvoorstel voor de realisatie van een natte natuurkern van ca. 150 ha ('voorkeursscenario') uitgewerkt dat in 2014 bekrachtigd werd door de Vlaamse Regering en in 2017 de basis zal vormen voor de bijsturing en heropstart van de procedure voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Nete en Aa. In 2016 startte een PDPO-project dat de landbouwbedrijven in het gebied begeleidt bij het uitwerken van een nieuwe toekomstperspectief in het gebied gelet op de natuurontwikkeling die voorzien is. Begin 2017 werd een ecohydrologische studie voor het gebied afgerond en werd een voorstel voor een landinrichtingsproject ingediend bij de programmacommissie landinrichting. Het Kasteel van Grobbendonk en heel wat van de omliggende gronden zijn of komen in beheer of eigendom van Kempens Landschap, Natuurpunt en VLM. De kansen voor een bovenlokaal, geïntegreerd, gebiedsgericht project rond erfgoed, natuur, water, bos, landbouw, landschap, toerisme en recreatie zijn legio en bestaan uit volgende, verder in een inrichtingsvisie te integreren bouwstenen: - de historische sites van de watermolen, de kasteelhoeve en de Priorij Onze-Lieve-Vrouw Ten Troon, plus de omliggende, beschermde, cultuurhistorische landschappen en vastgesteld landschapsrelict; het gekende en ongekende archeologisch bodemarchief, met nadruk op het hoge potentieel van valleigebieden en het brede scala van mogelijk aan te treffen vindplaatsen uit alle periodes;

	- waardevolle natuur deels in SBZ-gebied en de beoogde herbestemming (voorkeursscenario); - bestaande recreatieve faciliteiten (kinderboerderij, kano en kajak op de Kleine Nete...) en de potentie naar meer (recreatieve ontsluiting van het gebied). Via het strategische project worden de voorliggende bouwstenen geïntegreerd in een globale gebiedsgerichte en geïntegreerde inrichtingsvisie als basis voor een concreet inrichtingsproject waarbij de natuur- en waterdoelen gerealiseerd worden, de landschaps- en erfgoedwaarden versterkt worden, de verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap vorm krijgt en de toeristische-recreatieve infrastructuur in gebied verder uitgewerkt wordt op maat van het valleigebied. Het gebied Graafweide-Schupleer is exemplarisch voor de veerkrachtopgave voor de open ruimte: het valleisysteem moet op een dynamische manier water kunnen blijven opvangen en bergen waar door de klimaatveranderingen grotere extremen verwacht worden. Een multifunctionele inrichting van de open ruimte in de vallei moet robuust zijn om dergelijke schokken zonder blijvende schade te kunnen opvangen en tegelijkertijd ambitieuze Europese natuur- en waterdoelen in het gebied te realiseren. 3.1 Inrichtingsvisie 3.2 Uitrol natuurinrichtingsproject en flankerend beleid 3.3 Geïntegreerd beheerplan Kasteelhoeve en omgeving 3.4 Recreatieve ontsluiting	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Departement Omgeving Christophe Vandevoot Christophe.vandevoot@vlaanderen.be Projectleider AGNAS Vlaamse Landmaatschappij Els Remans Els.Remans@vlm.be Projectmanager Merode en Netegebied	
PARTNERS	Zie fiches	

LOCATIE	Graafweide-Schupleer
AFSPRAKEN FINANCIERING	Via PDPO, via Natuurinrichtingsproject, studiewerk inrichtingsvisie (opdrachtgever departement Omgeving)
GENOMEN BESLISSINGEN	• bijgestuurd VKS (beslissing op niveau OC en door de Vlaamse regering op 25/01/19) • instellen Natuurinrichtingsproject op 16 april 2019
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• de inrichtingsvisie Graafweide – Schupleer werd afgerond. • opstart Natuurinrichtingsproject getrokken door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij • opstartnota en infomarkten GRUP 'Kleine Nete en Aa' (breder dan dit hefboomproject)
VERDERE PLANNING	• zie fiches
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	• Hefboomproject Vallei van de Aa • Hefboomproject Groenblauwe dooradering Herentals • GRUP • Natura 2000
COMMUNICATIE	• zie fiches

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.1 Uitwerken inrichtingsvisie
Uitvoering Hefboomproject 'Graafweide/Schupleer'

HEFBOOMPROJECT	Graafweide-Schupleer	
ACTIE NR. 3.1	Uitwerken van een gedragen concrete inrichtingsvisie	
	Het samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa is zowel een habitatrichtlijngebied, een speerpuntgebied inzake waterkwaliteit als een gebied met bijzondere landschaps- en erfgoedwaarde (beschermde landschap en monumenten, vastgesteld landschapsatlasrelict). De functies landbouw, natuur, water, bos en recreatie komen er vandaag sterk verweven voor. Het gebied dat centraal in de vallei van de Kleine Nete ligt tussen de woonkernen van Grobbendonk en Vorselaar biedt nauwelijks te onderschatten potenties om uit te groeien tot een multifunctionele, bovenlokale aantrekkelijke en toegankelijke groenpool in de vallei. Deze actie heeft tot doel de voorliggende bouwstenen geïntegreerd in een globale gebiedsgerichte en geïntegreerde inrichtingsvisie te verwerken. Focus op: allocatie natuurdoelen, herstellen/toevoegen KLE's, recreatieve ontsluiting	
TREKKER CONTACTPERSOON	Departement Omgeving – www.omgevingvlaanderen.be Christophe Vandevooort christophe.vandevooort@vlaanderen.be Projectleider AGNAS LAMA Jorryt Braaksma www.lamaland.eu Venoot LAMA Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Departement Omgeving, LAMA, Driekwart Groen, Kempens Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, Natuurpunt, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Vlaamse Milieumaatschappij, provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen	
LOCATIE	Graafweide-Schupleer	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Financiering opdracht LAMA / Driekwart Groen door departement Omgeving	
TERMIJN	• januari – november 2018: inrichtingsstudie • langere termijn voor uitvoeren acties	

MIJLPALEN (detailleerde termijn)	• November 2017: gunning overheidsopdracht opmaak inrichtingsvisie aan LAMA en Driekwart Groen door departement Omgeving Tot 2/05/2018: bilaterale contacten door studie bureau met de verschillende actoren • 2/05/2018: participatieve werkgroep • Finaliseren van een geïntegreerde inrichtingsvisie met de focus op 3 thema's: de allocatie van de SBZ-H habitatypes, herstel/versterking van de kleine landschapselementen en recreatieve ontsluiting.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• 6/02/2018: eerste vergadering van de projectwerkgroep • 6/03/2018: tweede vergadering projectwerkgroep • 2/5/2018: vergadering projectwerkgroep + workshop • 11/06/2018: vergadering projectwerkgroep • 03/09/2018: vergadering projectwerkgroep • 19/10/2018: finale workshop, De verschillende acties die uit de inrichtingsvisie naar voren kwamen werden toegewezen aan de meest voor de hand liggende trekkers. De projectcoördinator van het strategisch project coördineert de verschillende alle acties. • eerste screening van de actielijst op acties die sneller kunnen opgenomen worden omdat ze los staan van de instelling van het Natuurinrichtingsproject bv. rioleringswerken (werden door Grobbendonk reeds aangemeld bij Infrax), inrichtingswerken met betrekking tot de onthaalpoorten en wandelpaden die voornamelijk zijn gelegen in natuurgebied (Natuurpunt). • Er werd reeds een eerste aanplant verwezenlijkt in functie van het versterken van de kleine landschapselementen. Het gaat om een aanplant van knotwilgen over een lengte van ongeveer 450 m langs de Graafweidelooop. • Onderzoek naar realisatie van wandelverbindingen tussen Kasteelhoeve en Schapenstal en tussen Grobbendonk Troon en de Kasteelhoeve • Opstart onderzoek naar oude watertoren die zou kunnen fungeren als toeristische uitkijktoren over het gebied
VERDERE PLANNING	• Opmaken van een timing voor uitvoeren van de eerste acties uit de inrichtingsvisie en begroting van de kosten. • Uitvoeren eerste acties uit inrichtingsvisie (mogelijkheden bekijken van de rioleringswerken en de recreatieve ontsluiting). • Verder opnemen en wegwerken knelpunten van 2 prioritaire wandelverbindingen enerzijds tussen de Kasteelhoeve en de Schapenstal en anderzijds tussen Grobbendonk (Troon) en de Kasteelhoeve; • verder onderzoek naar oude Watertoren als toeristische uitkijktoren over het gebied Graafweide/Schupleer;
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 3.3: Opmaak geïntegreerd beheerplan kasteelhoeve en omgeving • Hefboomproject vallei van de Aa wat betreft de recreatieve ontsluiting • Natura 2000 • GRUP
COMMUNICATIE	• Via projectwerkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.2 Uitrol natuurinrichtingsproject en flankerend beleid

Uitvoering Hefboomproject 'Graafweide/Schupleer'

HEFBOOMPROJECT	Graafweide-Schupleer	
ACTIE NR. 3.2	Uitrol natuurinrichtingsproject en flankerend beleid	
	Op basis van het reeds doorlopen overlegproces, de genomen tussentijdse beleidsbeslissingen en de uitgevoerde studies en onderzoeken voor het gebied Graafweide-Schupleer wordt geconcludeerd dat de inzet van het instrument natuurinrichting het meest aangewezen is op de opgave inzake de realisatie van een natte natuurkern van 150 ha, het behoud en het versterken van de landschaps- en erfgoedwaarden en de waterbergingsfunctie en het bijhorende flankerend landbouwbeleid binnen een redelijke projecttermijn tot uitvoering te brengen. De doelstellingen in het projectgebied voor de natuurkern zullen zich focussen op een hydrologische optimalisatie enerzijds en de ontwikkeling van de natuurwaarden anderzijds, rekening houdend met de landschaps- en erfgoedwaarden van het beschermd cultuurhistorisch landschap en het vastgesteld landschapsatlasrelict. Het ontwikkelen van de natuurwaarden zal in Graafweide-Schupleer vooral gericht zijn op de habitats van het SBZ-H volgens de aanwezige potenties in het gebied zoals gebleken uit de ecohydrologische studie. Natuurinrichting zal zorgen voor het noodzakelijk abiotisch herstel, het verbeteren van de randvoorwaarden voor duurzaam behoud en herstel van voorkomende en nieuw te ontwikkelen habitats, wat voor de aansluitende oppervlakten op langere termijn sowieso noodzakelijk is. Daarnaast zal via de inzet van het instrument natuurinrichting een pakket positieve maar ook milderende, stimulerende, ondersteunende en compenserende maatregelen voor landbouw ingezet worden dat noodzakelijk is om de voorgenomen natuurontwikkeling te kunnen realiseren.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Departement Omgeving – www.omgevingvlaanderen.be Els Remans <i>Els. Remans@vlm.be</i> Projectmanager Merode en Netegebied Lennert Damen Lennert.damen@vlaanderen.be Gebiedscoördinator Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Departement Omgeving, Kempens Landschap, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, Natuurpunt, Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Landmaatschappij, Boerenbond, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Vlaamse Milieumaatschappij, provincie Antwerpen, Toerisme Provincie Antwerpen	
LOCATIE	Graafweide-Schupleer	

AFSPRAKEN FINANCIERING	Belangrijke financiering vanuit Natuurinrichtingsproject. De minister maakt via Natuurinrichting een budget beschikbaar van €3.033.000,00 voor de inrichting van het gebied. Daarnaast wordt ook €2.000.000,00 gereserveerd voor eventuele bedrijfsverplaatsing.
TERMIJN	Start 2019
MIJLPALEN	• Instellen Natuurinrichting op 16 april 2019
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Voorbereiding en indienen aanvraag tot instellen Natuurinrichtingsproject Graafweide-Schupleer met als perimeter het bijgesteld voorkeursscenario. Dit Natuurinrichtingsproject beoogt enerzijds de realisatie van een natte natuurkern van 150 ha, behoud van landschaps- en erfgoedwaarden en anderzijds de inzet van positieve milderende, stimulerende, ondersteunende en compenserende maatregelen voor landbouw. Door de inzet van natuurinrichting wordt gewaakt over een evenwichtige invulling van de projectdoelstellingen en de potenties van het gebied. • Op 25 januari 2019 besliste de Vlaamse regering de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw te gelasten om het Natuurinrichtingsproject in te stellen. Tegelijkertijd werd ook het gewijzigde voorkeurscenario goedgekeurd. Dit voorkeurscenario werd mee opgenomen in de startnota van het GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk', goedgekeurd op 15 maart 2019. • Op 12/06/2019 werd er een infomoment georganiseerd voor de landbouwers in het gebied waarbij de stand van zaken van de verschillende acties en de gevolgen ervan voor de landbouwers werd uitgelegd • VLM en ANB stelden een evenwichtig projectcomité en een projectcommissie voor het natuurinrichtingsproject samen
VERDERE PLANNING	• De verdere timing voor het projectcomité en de projectcommissie wordt op punt gezet. Op 3 februari zal een eerste projectcommissie plaatsvinden en op 11 februari een eerste projectcomité • Er wordt op eind september 2020 gemikt voor een ontwerpprojectrapport dat daarna in openbaar onderzoek kan gaan •
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 3.3: Opmaak geïntegreerd beheerplan kasteelhoeve en omgeving • Hefboomproject vallei van de Aa wat betreft de recreatieve ontsluiting en wateropgave • Natura 2000 • GRUP
COMMUNICATIE	• Via stuurgroep en werkgroepen • Infomoment voor landbouwers met stand van zaken van de verschillende acties

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 3.3 Beheerplan Kasteelhoeve en omgeving
 Uitvoering Hefboomproject 'Graafweide/Schupleer'

HEFBOOMPROJECT	Graafweide-Schupleer	
ACTIE NR. 3.3	Beheerplan Kasteelhoeve en omgeving	
	De huidige erfpachtconstructie van de kasteelhoeve en omgeving (gemeente Grobbendonk / Kempens Landschap) en de zoektocht naar een invulling voor de kasteelhoeve biedt massa's opportuniteiten. Er is evenwel nood aan afstemming tussen de (zoektocht naar mogelijke ontwikkelingen in de) kasteelhoeve enerzijds en de potenties en dynamiek van de omgeving anderzijds. Het achterhalen en begrijpen van de verschillende fases van de ontwikkeling van het onroerend erfgoed / erfgoedlandschap en inventarisatie van de bovengrondse én ondergrondse erfgoedelementen zal hierbij ondersteunend werken (geïntegreerd beheerplan).	
TREKKER CONTACTPERSOON	Dienst gouverneur Antwerpen Bram Abrams Bram.abrams@provincieantwerpen.be Arrondissementscommissaris Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Kempens Landschap, Agentschap Onroerend Erfgoed, gemeente Grobbendonk, Natuurpunt, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,	
LOCATIE	Graafweide-Schupleer, Grobbendonk	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Opdrachtgever opmaak beheerplan: vzw Kempens Landschap	
TERMIJN	Oplevering beheerplan 8 maanden na gunning	
MIJLPALEN	• Afgewerkt beheerplan • Eindbestemming Kasteelhoeve	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Voorleggen van het bestek voor het beheerplan aan het Agentschap Onroerend Erfgoed voor bijkomende subsidies. Het Agentschap kende een onderzoekspremie van 20.000 € toe. • Gunning van de studie voor het geïntegreerd beheerplan aan Erfgoed en Visie; eerste stuurgroepoverleg op 13/09/19 • de aanvraag tot verwervingssubsidie voor de Kasteelhoeve werd op 30/10 ingediend	
VERDERE PLANNING	• Doorlopen van de studie de volgende 6 maanden	

AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 3.1: Inrichtingsvisie • Actie 3.2: Natuurinrichtingsproject
COMMUNICATIE	• Via stuurgroep en werkgroepen

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 4.0.
Uitvoering Hefboomproject 'Vallei van de Aa'

HEFBOOMPROJECT	Vallei van de Aa	
	De vallei van de Aa is een waardevolle openruimtestructuur die verschillende gemeente en heel wat bijzonderheden verbindt. De vallei wordt gekenmerkt door weilanden en akkers, met relictten van mooie beemdenlandschappen en gehuchten aan de rand van de vallei. De perimeter van dit hefboomproject wordt begrensd door de watermolen in Tielen (Kasterlee) stroomopwaarts tot de samenvloeiing met de Kleine Nete (en hefboomproject Graafweide-Schupleer) stroomafwaarts. Dit hefboomproject heeft een meervoudig doel, dat we bovenlokaal en geïntegreerd (landbouw, water, landschap, erfgoed, toerisme en recreatie) willen aanpakken: - Evenwicht tussen landbouw en water versterken o.a. door agrarisch stuwpeilbeheer - Het aanbod van verbindingen over de Aa tussen de dorpskernen en recreatieve netwerken vergroten - De aanwezige landschappelijke en erfgoedwaarden beter ontsluiten en versterken Gezien de intergemeentelijke materie en de interactie tussen landschap, erfgoed, recreatie en toerisme kan het uitgroeien tot een bovenlokaal, gebiedsgericht en geïntegreerd project. 4.1 Klimaatrobuuste vallei {beek.boer.bodem} 4.2 Recreatieve verbindingen	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en Provincie Antwerpen Actie 4.1 Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete Actie 4.2: Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	

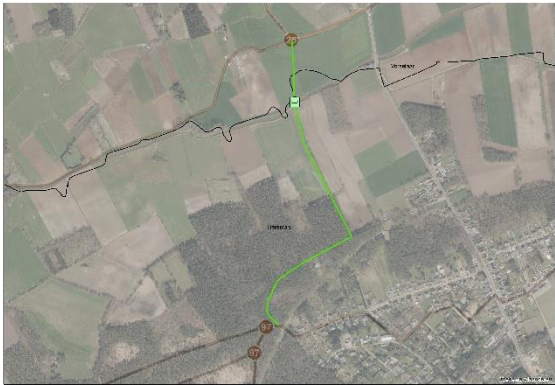
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, provincie Antwerpen (DIW, DGB), Boerenbond, Eco ² , Algemeen Boerensyndicaat, gemeente Vorselaar, gemeente Lille, gemeente Kasterlee, stad Herentals, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, departement Omgeving, bekkensecretariaat Netebekken, Agentschap Onroerend Erfgoed, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos
LOCATIE	Vallei van de Aa
AFSPRAKEN FINANCIERING	- Financiering actie 4.1 Begeleiding bij het nemen van maatregelen op terrein via het PDPO-project en het realiseren van maatregelen op terrein via het landinrichtingsproject Water-Land-Schap. - Financiering actie 4.2: bouw van brug over de Aa via co-financiering
GENOMEN BESLISSINGEN	- Indienen project voor Water-Land-Schap - Indienen PDPO-project - Studie in opdracht van ANB en Dep. Omgeving: In kaart brengen van noden en oplossingen en formuleren van de taakstelling. Eco² voert deze studie uit.
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	{beek.boer.bodem}: OOH landinrichtingsproject en PDPO goedgekeurd door de minister. - Studie ANB en Dep. Omgeving is opgestart - sondering werd uitgevoerd en aannemer aangesteld voorstudiewerk en bouwen voetgangersbrug over de Aa - start inventarisatie trage wegen en erfgoed elementen in de vallei van de Aa
VERDERE PLANNING	- verdere uitvoering van PDPO-project en landinrichtingsproject Water-Land-Schap - Studie ANB en dep. Omgeving finaliseren 10/4/2019 – Persmoment start Water-Landschap - Start begeleiding op terrein - Sondering en gunning aannemer voor voorbereidend studiewerk en het aanleveren en plaatsen voetgangers brug over de Aa - Indienen omgevingsaanvraag brug - Verdere opmaak plan van aanpak missing links trage wegen en uitvoeren quick wins
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	- Integraal project Aa - Hefboomproject 3: Graaafweide – Schupleer - Hefboomproject 5: Groenblauwe dooradering Herentals
COMMUNICATIE	- Zie fiches 10/4/2019 – Persmoment start Water-Landschap

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 4.1. beek.boer.bodem
Uitvoering Hefboomproject 'Vallei van de Aa'

HEFBOOMPROJECT	Vallei van de Aa	
ACTIE NR. 4.1	{beek.boer.bodem}	
	<u>Actie: evenwicht tussen landbouw en water versterken o.a. door agrarisch stuwpeilbeheer</u> De Aa-vallei doorsnijdt vijf verschillende gemeenten in het projectgebied en vergt dus een bovenlokale aanpak. Zoals elke beekvallei raakt ze aan heel wat deelsectoren, die elk apart een aantal doelstellingen in de vallei beogen. Als landbouwvallei is de belangrijkste uitdaging de landbouwbedrijfsvoering van voornamelijk melkveehouders in evenwicht te houden/brengen met waterkwantiteit en –kwaliteit. Het project {beek.boer.bodem} heeft tot doel om het landbouwgebruik en het fysisch systeem (bodem en water) in het afstroomgebied in van de Aa beter op elkaar af te stemmen. Dit initiatief wil: • De waterkwaliteit verbeteren. • Het overstromingsrisico in het afstroomgebied van de Aa en in de stroomafwaarts gelegen gebieden verminderen. • Het verdrogingsrisico op de hoger gelegen landbouwpercelen verminderen. • De voedselproductie in het gebied behouden. • Het landschap, zowel het landbouw- als het natuurgebied, aantrekkelijk houden voor recreanten en bewoners. Door: • Het uitvoeren van kleinschalige landbouwmaatregelen. • Het uittesten van experimentele landbouwmaatregelen. • Het inzetten van natuurgebieden. Via een coalitie van landbouwers (en hun organisaties), natuurverenigingen, overheden en brugorganisaties.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Agrobeheercentrum Eco ² , Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, gemeente Kasterlee, gemeente Lille, gemeente Vorselaar, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, stad Herentals, Hooibeekhoeve, Bekkenssecretariaat, Provincie Antwerpen, PIDPA, Dep. Omgeving, ANB.	
LOCATIE	Afstroomgebied van de Aa in Vorselaar, Herentals, Lille en Kasterlee	

AFSPRAKEN FINANCIERING	Uitvoering via volgende programma's: • Water-Land-Schap (VLM) • PDPO - Omgevingskwaliteit door samenwerking (OKW) (i.s.m. DLP-provincie Antwerpen) • Studie ANB en Departement Omgeving: In kaart brengen van noden en oplossingen en formuleren van de taakstelling. Eco² voert deze studie uit.
TERMIJN	• Studie ANB en Dep. Omgeving: Gestart op 1 januari 2019 • Goedkeuring beide projecten (W-L-S en PDPO) door de ministermaart 2019 • Uitvoeringstermijn Water-Land-Schap: 3jaar - 10 jaar • Uitvoeringstermijn PDPO (OKW): 2 jaar
MIJLPALEN	• 14 maart 2018: werkgroepvergadering • 1 maart 2018: indienen dossier Water-Land-Schap • 23 maart 2018: voorstellen projectidee aan jury • 3 mei 2018: indienen dossier PDPO • 14 december: Voorstelling W-L-S en PDPO op werkgroep integraal project Aal en Aall • 1 januari 2019: start studie ANB en Dep. Omgeving. • {beek.boer.bodem}: OOH landinrichtingsproject en PDPO ingediend, goedgekeurd en opgestart. • Toelichting Strategisch project en {beek.boer.bodem} aan de nieuwe gemeentebesturen ○ 7/2/2019: College Lille ○ 18/2/2019: College Herentals ○ 18/2/2019: College Vorselaar • 2 workshops landbouwers: 26/2/2019 en 7/3/2019. • 2 workshops gebiedsexperten: 20/3/2019 en 28/3/2019 • 10/4/2019 – Persmoment start Water-Landschap • Oplevering Studie ANB en Dep. Omgeving. Resultaat: In kaart brengen van noden en oplossingen en formuleren van de taakstelling. • Start begeleiding op terrein • Realiseren maatregelen op terrein
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Onderzoek naar opportuniteit en haalbaarheid (OOH) W-L-S afgerond en ingediend. • Project PDPO ingediend en goedgekeurd door deputatie. • 2 projectvergaderingen voor landbouwers gehouden in Herentals en Kasterlee (oktober 2018). • Studie ANB en Dep. Omgeving is opgestart. • Communicatiemoment W-L-S (10/04/2019) i.s.m. VLM uitgewerkt • Workshops gebiedsexperten • Projectoproep DEMO-maatregelen Water-Land-Schap
VERDERE PLANNING	• Finaliseren studie ANB en Dep. Omgeving • verdere uitvoering PDPO-project en W-L-SS • tuurgroep {beek.boer.bodem} op 12/11/2019
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Hefboomproject 4: Vallei van de Aa (strategisch project) • Hefboomproject 3: Graafweide-Schupleer (strategisch project) • Integraal project Aa (bekkensecretariaat)
COMMUNICATIE	• Via stuurgroep, agrobeheergroep • Folder {beek.boer.bodem}

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 4.2. recreatieve verbinding
Uitvoering Hefboomproject 'Vallei van de Aa'

HEFBOOMPROJECT	Vallei van de Aa	
ACTIE NR. 4.2	Recreatieve verbinding	
	• Missing links in fietsknooppunten voorzien (verhard of semi-verhard fietspad) zodat fietsers op een comfortabele manier van Poederlee naar Herentals kunnen geraken, langs publiekstrekken en landschappen, bijvoorbeeld tussen knooppunt 14 en Poederlee centrum en tussen knooppunt 14 en verbinding richting 16 • Missing links in het wandelknooppuntennetwerk voorzien, bijvoorbeeld tussen knooppunt 25 en 97 (aanleg voetgangersbrug Aa) • Maximale integratie van de publiektrekken en landschappen: Heggekapel Poederlee, Toeristentoren, Kempens Heuvelrug, integratie van historische trage verbindingen (vb van kerktoeren naar kerktoeren, vb Lille - Vorselaar)	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator SP	
PARTNERS	Stad Herentals, gemeente Vorselaar, gemeente Lille, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Natuurpunt, VMM, ANB	
LOCATIE	• Vallei van de Aa • Verbinding tussen wandelknooppunten 25 en 97, van Kweek, Vorselaar naar Meivuurstraat, Herentals 	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Bouw brug: Co-financiering tussen gemeente Vorselaar, stad Herentals en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete	
TERMIJN	bouw brug over de Aa 2020	

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Bouw brug over de Aa (tussen knooppunt 25 en 97) • Afspraak met grondeigenaars en –gebruikers om toegankelijkheid van de brug te verzekeren • Gunstig preadvies van leidingbeheerders Fluxys en Air Liquide oww de nabijheid van ondergrondse leidingen • Uitgevoerde sondering • gunning studiewerk en bouwen voetgangersbrug over de Aa • Opstart overkoepelende inventarisatie van alle informatie over trage wegen, recreatieve verbindingen en erfgoed elementen in de vallei van de Aa. • De 1ste fase van de trage wegen projecten in Lille en Herentals zijn afgerond door het Regionaal Landschap kleine en Grote Nete.
VERDERE PLANNING	Bouw brug over de Aa (tussen knooppunt 25 en 97) • voorbereidend studiewerk en het aanleveren en plaatsen voetgangersbrug over de Aa • Indienen omgevingsaanvraag brug • Verdere opmaak plan van aanpak missing links in recreatief netwerk waarbij vnl een plan van aanpak wordt opgemaakt voor de verbinding over de Aa tussen Herentals en Poederlee thv Sas 3
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Hefboomproject Vallei van de Aa (strategisch project) • Hefboomproject Graafweide-Schuppleer (strategisch project) • Integraal project Aa (bekkensecretariaat)
COMMUNICATIE	• Via werkgroep

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals
	De doortocht van de Kleine Nete door het kleinstedelijk gebied Herentals is een strategische plek waar zowel de stedelijke ontwikkeling als een bovenlokale openruimtestructuur elkaar raken. Op dit raakpunt ligt een potentie om de vallei van de Kleine Nete te ontwikkelen tot een groenblauwe ader van formaat door een gebied met een hoogwaardige stedelijke ontwikkeling die ook de stad via het Netepark verbindt met de Kempische Heuvelrug. Grote natuurlijke gehelen als de vallei van de Kleine Nete en de Kempense Heuvelrug dooraderen en omarmen de historische kern van Herentals. Hier ligt een enorm potentieel om de relatie tussen stad en omringende landschap te versterken, een poortfunctie uit te bouwen en daarbij ook intern de stedelijke kwaliteit te vergroten. De verbondenheid van het kleinstedelijk gebied met de omringende open ruimte is immers hoog: de Kleine Nete stroomt via de groene vinger van de Hellekens het hart van de stad binnen, de paraboolduinen op de Kempense Heuvelrug zijn op wandelafstand van het stadscentrum gelegen, de Kleine Nete stroomt de stad uit langs de recreatieve attractiepool op de overgang van vallei en heuvelrug met o.a. het BLOSO-centrum, Hidrodoe en het Netepark. De provincie Antwerpen voerde reeds een ontwerpend onderzoek uit voor de Netevallei binnen het kleinstedelijk gebied. Dat leidde tot een 'kaderplan' dat de krachtlijnen en contouren voor de toekomstige ontwikkeling van dit gebied aangeeft en betekent een doorbraak in de ruimtelijke patstelling waarin de discussie over de verschillende claims voor het gebied terecht was gekomen. Het hefboomproject zet in op de realisatie van een aaneengesloten groenstructuur complementair aan de zones waar stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden en zal ook een ruimtelijk-functionele relatie tussen de vallei en de Kempische Heuvelrug moeten realiseren. Het hefboomproject wil enerzijds de continuïteit van de vallei van de Kleine Nete tussen stedelijk gebied en buitengebied versterken en anderzijds dient de nodige aandacht geschonken te worden aan de relatie tussen de vallei en het omliggende (stedelijke) landschap. Via ontwerpend onderzoek (2016) werd gezocht op welke wijze de verschillende ruimtelijke opgaves met mekaar gecombineerd kunnen worden binnen het kleinstedelijk gebied. De laatste zin van dit ontwerpend onderzoek luidt: Het ontwerpend onderzoek toont aan dat een kwalitatieve ontwikkeling afhangt van een integrale en proactieve aanpak. Dit lijkt ook logisch voor een project binnen het kleinstedelijk gebied waar zoveel verschillende claims samen komen. Dat is exact wat dit hefboomproject binnen het strategisch project Kleine Nete beoogt. De resultaten van dat ontwerpend onderzoek zullen meegenomen worden in het afbakeningsproces voor het kleinstedelijk gebied Herentals.

	Naast de site Olympiadelaan werden er nog verschillende PRUP's opgemaakt die invulling geven aan de provinciale taakstelling naar bijkomende woningen en bedrijvigheid. Het hefboomproject omvat de historische kern van de stad Herentals en omliggende open ruimte gebieden die gevormd worden door de vallei van de Kleine Nete en de Kempense Heuvelrug tussen Lichtaart en Herentals. In het noorden vormt de Aa-vallei de grens, in het zuiden vormt het Albertkanaal de grens van het hefboomproject 'groenblauwe dooradering van de stad Herentals'. Het onderzoeksgebied bestaat binnen de stad uit volgende zones: - Olympiadelaan (16 ha): tussen de Olympiadelaan, de spoorweg en de Ringlaan; een gebied met volkstuinen naar het zuiden, valleibossen en de Nete centraal en 2 voetbalvelden en een AVEVE winkel in het noorden - Ziekenhuissite (4 ha): langsheen de Nederrij; de locatie van het huidige ziekenhuiscomplex met een rand van woningen in het zuiden en historische relictten van vorige ziekenhuisfases en de stadspoort in het noorden - Open ruimte (rest van de 60 ha): bestaande uit verschillende domeinen, functies en landschappelijke inrichtingen De toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de vallei van de Kleine Nete en de Kempense Heuvelrug hangt samen met zijn natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarde. De vallei van de Kleine Nete en de heuvelrug rijken tot in de stadskern, deze sterke verwevenheid creëert ruimtelijke troeven voor het toeristisch succes. De troeven op dit vlak, vormen vaak ook de kwetsbare punten, en vragen om een bovenlokale gebiedsgerichte afstemming van recreatieve activiteiten op de draagkracht van de open ruimte. 5.1 Kempense Heuvelrug 5.2 Haalbaarheidsstudie GEOPARK Kempense Heuvelrug 5.3 Beheerplan Le Paige 5.4 Doortocht Kleine Nete kleinstedelijk gebied Herentals 5.5 Fietsbrug fietsostrade F102 5.6 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de sport- en recreatiecluster langs de Kleine Nete in Herentals 5.7 Zoekzones boscompensatie Herentals 5.8 Aanplant op terrein van De Brink (Kempense Heuvelrug) 5.9 Recapture the Fortress Cities (Interreg project) 5.10 Kapel OLV in 't Zand (Kempense Heuvelrug) 5.11 Cursus landschapsgids Kempense Heuvelrug	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens Koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	

PARTNERS	Stad Herentals, VMM, ANB, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, provincie Antwerpen, Natuurpunt, departement Omgeving, Onroerend Erfgoed
LOCATIE	Herentals
AFSPRAKEN FINANCIERING	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Plenaire vergadering PRUP Olympiadelaan vond plaats op 17 december 2018. • Participatietraject herbestemming Olympiadelaan is afgerond (sept 2018 en dec 2018). • Opstart landschapsbiografie Kempense Heuvelrug
VERDERE PLANNING	• Verderzetten procedure PRUP Olympiadelaan en uitwerking actieplan. • Opstart onderzoek inzet instrumentenkoffer VLM. • Uitvoeren opmaak landschapsbiografie, landschaps- en inrichtingsvisie Kempense Heuvelrug Herentals
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	• Zie fiches
COMMUNICATIE	• Zie fiches

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.1. Kempense Heuvelrug
 Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.1.	Kempense Heuvelrug: landschapsbiografie	
	De aanwezige bos- en natuurgebieden op de heuvelrug maken deel uit van de natuurlijke structuur op Vlaams niveau. De eigenheid van het gebied wordt onderschreven door de veelheid aan beschermde landschappen, ankerplaatsen en relictzones. Door dit unieke kader heeft de heuvelrug een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht. De uitgestrekte bossen, natuurcomplexen en valleien vervullen vandaag al tal van ecosysteemdiensten. Voor de Kempense Heuvelrug Herentals zal een landschapsbiografie en –visie uitgewerkt worden naar analogie met het ontwikkelingsplan opgemaakt voor de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart. Voor de Herentalse heuvelrug zal de nadruk eerder liggen op landschappen, natuur en erfgoed. Ook de recreatieve ontsluiting zal verder worden aangepakt.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Natuurpunt, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, stad Herentals, gemeente Grobbendonk, gemeente Vorselaar, gemeente Kasterlee, IOED, Bosgroep, TPA	
LOCATIE	Kempense Heuvelrug	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Co-financiering door het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Herentals, Kasterlee	
TERMIJN	Eind augustus 2020	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Toezegging Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete voor significante financiële ondersteuning voor opmaak landschapsbiografie en –visie (60.000 €). • Opstart stuurgroep Kempense Heuvelrug en opmaak bestek landschapsbiografie en – visie van de Kempense heuvelrug te Herentals en omgeving • De opdracht voor de opmaak van de landschapsbiografie en –visie werd gegund aan Strootman Landschapsarchitecten. In september 2019 werd gestart met de landschapsbiografie door Shera van den Wittenboer • Terreinbezoek met het studiebureau en de gebiedskenners bij opstart van de landschapsbiografie; • Verzamelen relevante informatie als input voor de biografie door verschillende gebiedskenners;	

VERDERE PLANNING	• Verdere uitvoering van de landschapsbiografie, landschaps- en inrichtingsvisie • In kaart brengen quick-wins
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Aangrenzende hefboomprojecten 'Graafweide/Schupleer' en 'Vallei van de Aa' • Actie 5.2, 5.6, 5.8, 5.10, 5.11
COMMUNICATIE	• Via stuurgroep, via werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.2. Onderzoek haalbaarheid geopark 'Zand en water in de vallei van de Kleine Nete'
Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.2.	Onderzoek haalbaarheid geopark 'Zand en water in de vallei van de Kleine Nete'	
	Het idee van het oprichten van een geopark komt voort uit de jarenlange werking rond duurzaam landschapsbeheer en toerisme op de Kempense Heuvelrug (Slapende Reus) door Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en haar partners. Een UNESCO Global Geopark is één van de drie statuten van UNESCO (naast Werelderfgoed en Biosfeerreservaat) dat vertrekt van geo-erfgoed van internationaal belang en de vertaling ervan naar educatie en toerisme, duurzaam beheer en ontwikkeling van de streek. In de vallei van de Kleine Nete gaat het voornamelijk over Neogene zanden (waaronder de zanden van Mol en de Kempense Heuvelrug), (veen-)relicten verbonden aan de vallei en menselijk gebruik doorheen de geschiedenis. Een dergelijke status van geopark zou het mogelijk maken om op een bovenlokaal niveau kennis te delen en uit te breiden, in te zetten op duurzaam landschapsbeheer, (geo-)toerisme en educatie, inbedding van de partners in een streekverhaal (Kempen), verhogen imago van de streek en de individuele partners en een economische return naar de streek.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete <i>Bas Van der Veken</i> Sebastiaan.vanderveken@rlkgn.be Coördinator RLKGN	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Onroerend erfgoed, IOED's en KULeuven	
LOCATIE	vallei van de Kleine Nete tussen Mol en Lier.	
AFSPRAKEN FINANCIERING	/	
TERMIJN	/	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Na aftoetsing bij de Vlaamse UNESCO commissie en de globale vertegenwoordiger van UNESCO Geoparken werd de perimeter uitgebreid van de Kempense heuvelrug naar de vallei van de Kleine Nete, inclusief zanden van Mol.	
VERDERE PLANNING	• Toetsing draagvlak bij lokale en bovenlokale partners • Voorbereiden fase 1 haalbaarheidsdossier, samenstelling wetenschappelijk comité	

AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 5.1: Kempense heuvelrug • hefboomproject 6 'Zeggeloop'
COMMUNICATIE	/

**STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.3. Opmaak beheerplan kasteel en domein
Le Paige**
Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.3.	Opmaak beheerplan kasteel en domein Le Paige	
	Voor het kasteel en domein Le Paige in Herentals wordt een beheerplan opgemaakt in het kader van onroerend erfgoed. Het domein is gelegen aan de Kleine Nete en vormt een groene link tussen het centrum van Herentals en de Kempense Heuvelrug.  	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be Wim Debaene Wim.debaene@rldvk.be Overkoepelend projectmedewerker Antwerpse Regionale Landschappen Kempens Karakter – www.kempenskarakter.be Ellen Van de Velde ellen@kempenskarakter.be IOED Land van Nete en Aa Herman Adriaenssens herman@adriaenssens.eu	

	Architect	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Architect Herman Adriaenssens, Kempens Karakter, stad Herentals, vzw Ter Vesten, Vlaams Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Provincie Antwerpen, OCMW Herentals, Herentalse Geschiedkundige Kring, Kerkfabriek Herentals	
LOCATIE	Domein Le Paige, Herentals	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Gefinancierd door stad Herentals	
TERMIJN	Afwerking beheerplan zomer 2018	
MIJLPALEN	Aanleveren beheerplan	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Het beheerplan werd gefinaliseerd • De meest dringende onderhoudswerken aan het kasteel zijn uitgevoerd	
VERDERE PLANNING	• Uitvoering geven aan het beheerplan voor het omliggende kasteeldomein	
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 5.1, 5.5	
COMMUNICATIE	• Via werkgroep	

**STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.4. Doortocht Kleine Nete door
kleinstedelijk gebied Herentals**
Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.4.	Doortocht Kleine Nete door kleinstedelijk gebied Herentals	
	In 2016 werd een kaderplan opgemaakt voor de inrichting van de doortocht van de Kleine Nete door het kleinstedelijk gebied Herentals. Doel van deze actie is het verder uitwerken van het kaderplan: Kaderplan >> masterplan >> actieplan >> uitvoering (o.a. RUP) <u>Actie 5.4.a.: Inhoudelijke workshops verfijning visie binnen bestaand kaderplan uit ontwerpend onderzoek</u> <u>Actie 5.4.b.: opmaak masterplan Olympiadelaan vertrekkend van kaderplan</u> <u>Actie 5.4.c.: onderzoek grondverwerving Olympiadelaan</u> <u>Actie 5.4.d.: opmaak actieplan Olympiadelaan</u> <u>Actie 5.4.e.: coördinatie actieplan Olympiadelaan</u> <u>Actie 5.4.f.: start RUP procedure</u> <u>Actie 5.4.g.: veerkrachtige herinrichting signaalgebied Olympiadelaan (CATCH)</u>	
TREKKER CONTACTPERSOON	Actie 5.4.a, b, c, f: Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Tine Van Hoof tine.vanhoof@provincieantwerpen.be Ruimtelijk planner Actie 5.4.d, e: Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Koen Eyskens koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete Actie 5.4. g: Vlaamse Milieumaatschappij Rik Scholiers r.Scholiers@vmm.be Projectingenieur/projectleider CATCH	

PARTNERS	Provincie Antwerpen, stad Herentals, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Milieumaatschappij, Agentschap Onroerend Erfgoed, departement Omgeving, Infrabel, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, OCMW Herentals, AZ Herentals
LOCATIE	Doortocht Kleine Nete door kleinstedelijk gebied Herentals 
AFSPRAKEN FINANCIERING	
TERMIJN	
MIJLPALEN	• Participatietraject herbestemming Olympiadelaan en omgeving • Goedkeuring actieplan door de partners • Definitieve vaststelling PRUP
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Actie 5.4.a., b., d., e.: eindnota van het kaderplan met een aanzet van actieplan is opgeleverd • Actie 5.4.c.: voorstel om instrumentenkoffer VLM in te zetten • Actie 5.4.f.: plenaire vergadering PRUP Olympiadelaan vond plaats op 17 december 2018 • Participatietraject herbestemming Olympiadelaan en omgeving is afgerond • Actie 5.4.g: opdracht 'veerkrachtige herinrichting signaalgebied Olympiadelaan' gegund aan Witteveen + Bos en Cluster: twee stuurgroepvergaderingen hebben plaatsgevonden: keuze scenario's voor zowel inrichting waterbergingsgebied als herinrichting Olympiadelaan ligt voor
VERDERE PLANNING	• Onderzoeken of instrumentenkoffer VLM kan worden ingezet • Voortgang PRUP • Uitwerken van het actieplan voor de vallei binnen het kleinstedelijk gebied • Keuze uit schetsontwerpen 1-9 en ontsnipperingsniveau in functie van verder ontwerp
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 5.1, 5.3. • Heraanleg speeltuin Spaanshofpark (reeds gefinaliseerd oktober 2018) • GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk' • Studie Stramien – Netepark - In opdracht van Dep. Omgeving • CATCH: veerkrachtige herinrichting van de vallei (Witteveen + Bos en Cluster) • Aquafinproject: 'RWA-as Herentals station'
COMMUNICATIE	• Terugkoppeling naar bevolking Herentals over de volgende stappen

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.5. Fietsbrug fietsostrade F102
 Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.5.	Fietsbrug (K01 (Vlietje) en K02 (Kleine Nete)) fietsostrade F102 en F105	
	Op terrein splitsen fietsostrade F102/F105 op de Poederleseweg. Voorlopig loopt de fietsostrade F105 over de ovonde van Wellens (= missing link). Op termijn moet een ondertunneling van het spoor op de Poederleseweg zorgen voor de aansluiting van de fietsostrade F105 op de Leliestraat. Fietsostrade F102 loopt van Herentals naar Turnhout. In Herentals loopt de fietsostrade over de Kleine Nete, hiervoor moet een brug (K02) geplaatst worden. Aangezien het kaderplan voorziet in een ecologische corridor langs de Kleine Nete moet de overspanning van de brug groot genoeg zijn om ook de ecologische corridor te overspannen. Deze bijkomende overspanning zorgt ook voor een meerkost. Doel van deze actie is een oplossing vinden voor het betalen van de meerkost. Een gedeelte van deze meerkost zal door VMM en Stad Herentals betaald worden. Het ontwerp van de F102 wordt momenteel uitgewerkt door DMOB.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Provincie Antwerpen – www.provincieantwerpen.be Patrick Van Loock patrick.vanloock@provincieantwerpen.be Adviseur Chris Brouwers chris.brouwers@provincieantwerpen.be Diensthoofd Koen Eyskens Koen.eyskens@provincieantwerpen.be Gebiedscoördinator Kleine Nete	
PARTNERS	Voor de brug over de Kleine Nete: Provincie Antwerpen (dienst Ruimtelijke Planning, dienst Mobiliteit), VMM, ANB, stad Herentals	
LOCATIE	Stad Herentals	

	
AFSPRAKEN FINANCIERING	• Uit onderzoek en in overleg met ANB bleek dat de meerkost niet betaald kon worden via de subsidie van ANB – Natuur in je buurt. • De partners (provincie Antwerpen, ANB, VMM en Stad Herentals) zullen de meerkost van de brug samen betalen. De meerkost wordt gelijk verdeeld onder de vier partners. Elke partner zal dus 25% bijdragen voor de financiering van de meerkost van de brug.
TERMIJN	Nog te bepalen.
MIJLPALEN	• Week 26/02/2018: uitsturen bestek fietsstrade • Na bouwverlof 2018: gesprekken met aannemer • 05/10/2018: Gunning werken bruggen waaronder K01 en K02. • K01 en K02: Opstart onteigeningsprocedure en als voorlopige maatregel worden bezettingscontracten afgesloten. • Na goedkeuring bezettingscontracten en uitvoeringsplannen volgt het aanvangsbevel. • Realisatie fietsbrug: 2020
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• K01 en K02: Onteigeningsprocedure is lopende. • Bezettingscontract K02 gerealiseerd • De uitvoeringsplannen van de bruggen (K01 en K02) op de F102 worden momenteel uitgewerkt door de aannemer.
VERDERE PLANNING	• Afsluiten van de bezettingscontracten • Verder uitwerken uitvoeringsplannen door de aannemer • Nagaan of zand van uitgraving Hellekens ter plaatse gebruikt kan worden door de aannemer van de fiets-o-strade
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 5.3, 5.4
COMMUNICATIE	• Werkgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.6. Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de sport- en recreatiecluster langs de Kleine Nete in Herentals
Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.6.	Ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de sport- en recreatiecluster langs de Kleine Nete in Herentals	
	De opdracht voor de ruimtelijke ontwikkelingsvisie wil een antwoord vinden op het ruimtelijk vraagstuk voor de site Sport Vlaanderen/Netepark met een duidelijke afweging tussen verschillende belangen van natuur en infrastructuur.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Departement Omgeving, Vlaamse Overheid Christophe Vandevooort Christophe.vandevooort@vlaanderen.be Projectleider AGNAS	
PARTNERS	Sport Vlaanderen, Hidrodoe, Pidpa, ANB, Agentschap Onroerend Erfgoed, VMM, provincie Antwerpen, stad Herentals, RLKGN, TPA	
LOCATIE	Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan, Herentals	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Departement Omgeving	
TERMIJN	Eerste helft 2019	
MIJLPALEN	Oplevering ontwikkelingsvisie uitgevoerd door Stramien	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Output: Een eerste landschappelijk lezing van het gebied toont hoe de bebouwing evolueerde naar de huidige vrij versnipperde setting en het bijzondere fysische systeem zoals het reliëf (Kempense Heuvelrug) dat hier plaatsvindt. Op het hoogste deel van de duin bevinden zich de hoofdgebouwen van Sport Vlaanderen. De gebiedsanalyse en het behoeftenonderzoek worden in 3 thema's toegelicht: • Bereikbaarheid en parkeren: verschillende vervoersmodi, versnipperd parkeerbeleid • Infrastructuur: niet-compacte opstelling van de gebouwen • Natuur en open ruimte: onderdeel van een grotere groenstructuur Kempense Heuvelrug en aansluiting bij de vallei van de Kleine Nete De eerste uitgangspunten van Stramien voor het projectgebied werden kort toegelicht: • Netevallei: leesbaar en beleefbaar maken • Integraal verhaal van ecologische verbindingen, waterinfiltratie, energieneutraal, ...	

	• Geen bijkomende inname van waardevolle delen natuur, ... • Medegebruik stimuleren van o.a. sportinfrastructuur en parkeren • Inzetten op een landschappelijke hoofdstructuur met activiteiten kamers • Goede bereikbaarheid, modal split, • Circulaire aanpak • Ontharden Er werden in het eindrapport 3 hoofdscenario's voor het gebied uitgewerkt: • Scenario met compacte ijspiste • Scenario met 400 m ijspiste nabij het Netepark zwembad • Scenario met 400 m ijspiste nabij het sporthotel van Sport Vlaanderen In de 3 scenario's werd een locatie voorgesteld voor de hockey terreinen, een overdekte atletiekpiste, locatie voor werpnummers, een rolwagenpad, ...
VERDERE PLANNING	De ontwikkelingsvisie werd opgeleverd.
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 5.1, 5.2
COMMUNICATIE	• Stuurgroep

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.7. Zoekzones boscompensatie Herentals
 Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.7.	Zoekzones boscompensatie Herentals	
	Regelmatig wordt de stad bevraagd over mogelijkheden tot boscompensatie of wordt ze zelf geconfronteerd met ontbossing door eigen stadsontwikkeling. Compenseren in natura kan invulling geven aan gewenste bosdoelen en kan het draagvlak voor stadsontwikkeling vergroten maar dit is geen eenvoudige opgave omdat de beschikbare gronden erg beperkt zijn. Bovendien kan bebossing niet op elk perceel. Er moet rekening gehouden worden met de bindende bepalingen uit de Managementplannen, Natuurrichtplannen en het landschappelijk/cultuur historisch wenselijke.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Stad Herentals, ANB	
LOCATIE	Stad Herentals	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Niet van toepassing	
TERMIJN		
MIJLPALEN	Afronden visie eind 2018	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	De visie werd afgerond. Op basis van volgende principes werden zoekzones voor boscompensatie uitgewerkt: - Binnen de vallei van de KN moet getracht worden het valleilandschap zoveel mogelijk te behouden. De vallei moet zo veel mogelijk open gehouden worden weliswaar met de aanwezigheid van talrijke KLE's die met respect voor de cultuur historische achtergrond worden aangeplant. Bebossing is beperkt mogelijk tot ongeveer 30% in de vallei ter hoogte van Vuilvoort. Bebossing gebeurt bij voorkeur met elzenbroekbossen (evt. mét hakhoutbeheer: na kappen een aantal jaar verdere zichtlijnen). Indien verdere bebossing zou gebeuren moet er rekening gehouden worden met zichtlijnen bv. aanplant parallel met de Kleine Nete en niet haaks erop). - Buiten de vallei moet nieuwe bebossing zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande bossen en waar mogelijk boskernen verbinden of schermbos of stadsrandbos creëren. Hier kan men best gaan naar eiken/berkenbossen in de drogere stukken.	

VERDERE PLANNING	Faciliteren aankoop beschikbare grond voor boscompensatie en mogelijke invulling als stadsrandbos (ongeveer 15 ha); gesprek met eigenaar is opgestart
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	/
COMMUNICATIE	

**STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.8. Aanplant op terrein van De Brink op de
Kempense Heuvelrug**
Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.8.	Aanplant op terrein van De Brink op de Kempense Heuvelrug	
	Het Jeugdverblijf De Brink is centraal gelegen op de Kempense Heuvelrug in Herentals. Er zijn 3 gebouwen met in totaal 200 bedden en een achttal kampeerterreinen voor groepen. De Brink is er zowel voor scholen (bosklassen & openluchtklassen) als voor jeugdgroepen die op zoek zijn naar de ideale kampplaats of bivakhuis. Omwille van zijn ligging heeft het jeugdverblijf een nauwe band met de omliggende natuur wat zich weerspiegelt in het grote natuureducatieve aanbod. De Brink is sterk geïnteresseerd om het aanbod aan educatieve pakketten met betrekking tot natuur en erfgoed uit te breiden.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be Daan Janssens Daan.Janssens@rlkgn.be Projectmedewerker Landschap	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, De Brink, Natuurpunt	
LOCATIE	Jeugdverblijf De Brink, Bosbergen, Herentals	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Deels gefinancierd door RLKGN	
TERMIJN	Eind 2018	
MIJLPALEN	Het jeugdverblijf werd verrijkt met ecologisch interessante planten typisch voor de Kempense Heuvelrug. Hiermee werden de kampeerverblijven aangekleed en de parking aan het zicht onttrokken. Tegelijk werden heel wat vruchtdragende planten aangeplant waar de jonge kampeers van kunnen proeven. Sociale en ecologische winst op de Kempense Heuvelrug.	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Terreinwerk uitgevoerd (offertevragen, levering plantgoed en aanplant) • Advisering bosbeheer, beheer fruit en heg	
VERDERE PLANNING	• Opvolging van de site • Jeugdverblijf De Brink verder betrekken bij het verhaal van de Kempense Heuvelrug ifv natuureducatieve doeleinden. • Inrichten nieuw perceel ism Natuurpunt en De Brink	

AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: Actie 5.1, 5.2
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.9. Interreg project 'Recapture the fortress'
 Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals
ACTIE NR. 5.9.	Recapture the Fortress Cities (RFC) (INTERREG) Een geïntegreerd project voor de klimaatbestendige, hedendaagse en innovatieve ontwikkeling van historische stadsomwallingen, een bijzonder stukje erfgoed in de regio van Provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa**. Omdat de stadsomwallingen vaak vanuit één oogpunt worden bekeken, meestal op een conservatieve manier als beschermd erfgoed of milieu. In plaats daarvan kan het cultureel en natuurlijk erfgoed ingezet worden voor meerdere ecosysteemdiensten: • behoud en ontwikkeling van het culturele en militaire erfgoed • een aangepast natuur- en milieubeheer en onderhoud - verbetering van de biodiversiteit • aanpak van het economische aspect van promotie en toerisme • ondersteuning en sociaal gebruik van deze structuren en gebouwen als een openbare ruimte voor recreatie en vrije tijd • antwoord op (ontwikkelings-)druk in de stadsranden en het integreren van historische vestingwerken in de hedendaagse stedelijke planning, infrastructuur en functionele context • innovatieve oplossingen voor militair erfgoed (nieuwe energietechnieken, ICT-toepassingen ...) ** De stadsomwallingen zijn kenmerkend voor de Europese regio en hebben ook vormgegeven aan de huidige grenzen, streek en ontstaan van steden en landschappen (een veelbewogen geschiedenis). Het gaat over karakteristieken van het landschap en behoud van het cultureel erfgoed, het versterken en een hedendaagse invulling geven. 

TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Wim Debaene Wim.debaene@rldvk.be Overkoepelend projectmedewerker Antwerpse Regionale Landschappen	
PARTNERS	Lokaal: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, stad Herentals Bovenlokaal: Dendermonde, Lillo, Zandvliet, Lier, Mechelen, andere Europese landen (overkoepelende trekker Tsjechië)	
LOCATIE	Le Paige/Koetshuis/Spaans hof/ Olympiadelaan/ Molenvest/Nonnenvest	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN	4 jaar	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	- Het project werd goedgekeurd op 26 maart 2019 (https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2787/fourth-call-projects-approved/?no_cache=1&cHash=3a4145427580a4393be42012049c14d9) - Het startoverleg vond plaats op 21/10/19 in Herentals	
VERDERE PLANNING	- Tweedaagse kick-off meeting op 26 en 27 november 2019 - Verdere opvolging van het project	
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: Actie 5.4, 5.5	
COMMUNICATIE	/	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.10. Kapel OLV in 't Zand (Kempense Heuvelrug)
 Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.10.	Kapel OLV in 't Zand (Kempense Heuvelrug)	
	De kapel, die eigendom is van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw, was de afgelopen jaren helemaal opgeslokt door het dennenbos en vooral door het weelderig opschietende kreupelhout. De kapel moest weer zichtbaar gemaakt worden vanaf de Lichtaartseweg in Herentals. 	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be Daan Janssens Daan.Janssens@rlkgn.be Projectmedewerker Landschap	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, kerkfabriek OLV, ANB	
LOCATIE	Lichtaartseweg, Herentals	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Deels gefinancierd door RLKGN	

TERMIJN	Eind 2018
MIJLPALEN	De kapel zichtbaar maken voor de omgeving
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Overtollige bomen en struweel werden verwijderd waardoor de kapel weer zichtbaar is voor het publiek
VERDERE PLANNING	• Toegankelijkheidsreglement verder uitwerken
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 5.1, 5.2
COMMUNICATIE	https://www.gva.be/cnt/dmf20190227_04213104/kapel-olv-in-t-zand-mag-weer-gezien-worden

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 5.11. Cursus Landschapsgids
 Uitvoering Hefboomproject 'groenblauwe dooradering Herentals'

HEFBOOMPROJECT	Groenblauwe dooradering Herentals	
ACTIE NR. 5.11.	Cursus Landschapsgids	
	Aanbieden van een opleiding landschapsgids Kempense heuvelrug + plus. Het gaat om een interactief traject over natuur, geschiedenis en erfgoed in het land van Nete en Aa. De output van deze opleiding kan gebruikt worden als input voor de landschapsbiografie van de Kempense Heuvelrug.	
TREKKER CONTACTPERSOON	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be en IOED 'Land van Nete en Aa' <i>Jos Gysels</i> Josgysels55@gmail.com <i>Els Oostvogels</i> Els.oostvogels@rlkgn.be IOED Land van Nete en Aa <i>Ellen Van de Velde</i> Ellen@kempenskarakter.be IOED Land van Nete en Aa <i>Kirsten Schoonaert</i> Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, IOED Land van Nete en Aa, Natuurpunt	
LOCATIE	't Convent, begijnhof Herentals	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Deels gefinancierd door RLKGN en IOED	
TERMIJN	Tot oktober 2019	
MIJLPALEN	Opleiden van landschapsgidsen voor de Kempense Heuvelrug	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	De cursus liep van 23 april 2019 tot 8 oktober 2019	

	55 cursisten ronden met veel enthousiasme hun opleiding af tijdens het eindevent in Le Paige op 8/10/19; de cursisten stelden hun (groeps)werk voor (3 natuur/erfgoedwandelingen, 1 wandeling religieus erfgoed, 2 werkgroepen over educatieve ondersteuning jeugdverblijf De Brink, studie over toponiemen)
VERDERE PLANNING	- De cursus is afgelopen - Een groot aantal cursisten gaf zich op voor een vervolgtraject waarbij er vanuit themagroepen insteek gegeven zal worden voor de landschaps- en inrichtingsvisie van de Kempense Heuvelrug - Geïnteresseerde cursisten zullen ondersteund worden bij hun gidsenwerking op de Heuvelrug - De nauwe samenwerking met jeugdverblijf De Brink wordt behouden; educatieve pakketten worden verder uitgewerkt
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: Actie 5.1, 5.2, 5.6,
COMMUNICATIE	https://www.rlkgn.be/agenda/opleiding-landschapsgids-kempense-heuvelrug-plus-volzet

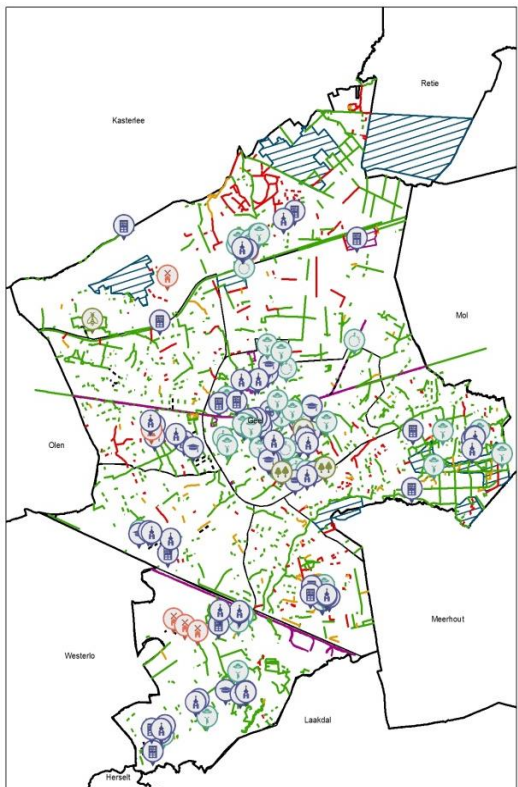
STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.0.

**Uitvoering Hefboomproject 'Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete tussen
Geel en Herentals'**

HEFBOOMPROJECT	Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete	
	De Zeggeloop is één van de vele zijlopen van de Kleine Nete die als groenblauwe aders doorheen het landschap lopen. Doel van het hefboomproject is de Zeggeloop ontwikkelen als groenblauwe openruimtestructuur die vanuit het stadscentrum van Geel een verbinding maakt met de Kleine Nete. Deze structuur biedt ademruimte in de stadskern, brengt de vallei terug naar de stad en kan tegelijkertijd dienen als recreatieve verbinding en een bijdrage leveren aan lokale waterberging. Het hefboomproject moet een evenwicht realiseren tussen de verdichting en de ontwikkeling van het stadsweefsel van Geel en het behoud en de integratie van voldoende groene ruimte die vanuit het open buitengebied tot diep in het stedelijk weefsel dringt. Het project zet in op het behoud van het groene karakter van de stad en het bestaand natuurlijk karakter van de nog niet ontwikkelde ruimten aan de stadsrand. Daar is nog ruimte voor een grote biodiversiteit, voor waterinfiltratie en buffering, stadstuinjes, educatieve projecten, enz. Dichter bij het centrum kunnen de groene ruimten de vorm aannemen van publieke parken met een intensiever gebruik. Trage wegen maken vaak deel uit van de groene dooradering en zorgen voor een veilig alternatief voor de drukke steenwegen. Ook waterlopen zijn vaak aanwezig in deze groene aders en kunnen op verschillende plaatsen ook natuurvriendelijker worden ingericht. Naast de Zeggeloop zal vanuit het hefboomproject ook onderzocht worden hoe andere zijlopen van de Kleine Nete ingezet kunnen worden voor het versterken van de groenblauwe dooradering van de ruimte. 6.1 Trage wegen Geel 6.2 DNA open ruimte Geel 6.3 Sanering Kneutersloop 6.4 Verdrogingsproblematiek Olens Broek	
TREKKER CONTACTPERSOON	Stad Geel Rob Krabbenborg Rob.Krabbenborg@geel.be Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete Kirsten Schoonaert Kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator strategisch project	
PARTNERS	Stad Geel, VMM, ANB, Natuurpunt, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, provincie Antwerpen (DIW), Boerenbond, OVAM	
LOCATIE	Geel (en de zijlopen tot Herentals)	

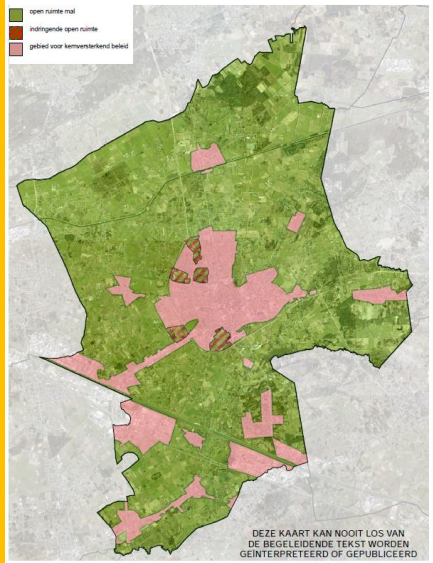
AFSPRAKEN FINANCIERING	
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Verkennend onderzoek naar kansen en opportuniteiten vanuit verschillende partners (ANB, Natuurpunt, VMM, stad Geel) • Voorbereiding opmaak bestek ifv waterbodemonderzoek ikv sanering Kneutersloop • Oplevering fase 1 trage wegen project Geel (inventarisatie) en opstart fase 2 • Lopend DNA-onderzoek Open Ruimte Geel werd afgerond •
VERDERE PLANNING	• Opstart partnerschap hefboomproject • Screening waterkwaliteit, lozingspunten en mogelijk structuurherstel Zeggeloop en Larumseloop • Inventarisatie opmaken van potentiële nieuwe ecologische verbindingen bekijken • Onderzoek missing links trage verbindingen (mogelijkheden bekijken binnen fase 2 trage wegen project) • Opmaak bestek ifv waterbodemonderzoek ikv sanering Kneutersloop
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	•
COMMUNICATIE	•

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.1. Trage wegen Geel
 Uitvoering Hefboomproject 'Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete'

HEFBOOMPROJECT	Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete	
ACTIE NR. 6.1	Trage wegen Geel	
	Onder de begeleiding van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete is voor Stad Geel een gedragen herwaarderingsplan opgemaakt voor de trage wegen in Geel. Dit herwaarderingsplan is een toekomstgericht herstel- en ontwikkelingsplan voor het lokaal patrimonium aan trage wegen. Het legt de wensen en bezorgdheden van de stad en haar inwoners bloot. Het is een goed instrument om trage wegen nog meer op de gemeentelijke kaart te zetten. 	
TREKKER	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be	
CONTACTPERSOON	Charlotte Corthals charlotte.corthals@rlkgn.be expert Trage wegen	
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Geel	
LOCATIE	Geel	

AFSPRAKEN FINANCIERING	
TERMIJN	1 ^{ste} fase afgerond
MIJLPALEN	Oplevering herwaarderingsplan (fase 1)
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Overlegmomenten met trage wegenambtenaar • Overlegmomenten met betrokken schepenen en diensten (mobiliteit, cultuur, milieu, ...) • Opstellen herwaarderings- en beheerplan over alle deelgebieden heen • Opstellen visieplan per deelgebied • Ondersteunen bij het implementeren van het herwaarderingsplan: de voorstellen uit het herwaarderingsplan vertalen naar projecten die evident en duidelijk uitvoerbaar zijn. Wegen of verbindingen die uit het voorgaande proces te ambitieus of nog te onderzoek zijn worden verder bekeken naar haalbaarheid en prioriteit • Opzetten van een communicatie- en sensibilisatiecampagne rond trage wegen in Geel. Instrumenten die hierbij ingezet worden, zijn de gemeentelijke infobladen, website van de stad Geel en het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, brede publieksactiviteiten, straatnaamborden, ...
VERDERE PLANNING	• Overlegmomenten met trage wegenambtenaar • Overlegmomenten met betrokken schepenen en diensten (mobiliteit, cultuur, milieu, ...) • Afbakenen prioritaire acties uit het herwaarderingsplan • Ondersteunen bij het implementeren van het herwaarderingsplan (fase 2): ○ de voorstellen uit het herwaarderingsplan vertalen naar projecten die evident en duidelijk uitvoerbaar zijn. Wegen of verbindingen die uit het voorgaande proces te ambitieus of nog te onderzoek zijn worden verder bekeken naar haalbaarheid en prioriteit. ○ Organiseren van een opleiding voor alle betrokken diensten (mobiliteit, cultuur, milieu, ...).
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 6.2
COMMUNICATIE	Participatief proces

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.2. DNA onderzoek open ruimte Geel
 Uitvoering Hefboomproject 'Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete'

HEFBOOMPROJECT	Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete	
ACTIE NR. 6.2.	DNA onderzoek open ruimte Geel	
	Het DNA-onderzoek open ruimte Geel vormt een vooronderzoek in het kader van de nog op te maken beleidskader open ruimte dat verder bouwt op de doelstellingen uit de strategische visienota van het beleidsplan ruimte Geel. Voornaamste doelstelling is het bijkomend ruimtebeslag en inname van open ruimte herleiden naar 0 ha/dag tegen 2030 (beter bekend als betonstop). Hiermee wil Geel de Vlaamse deadline van 2040 met 10 jaar vervroegen. De zogenaamde open ruimte 'mal' is hierbij richtinggevend. Bijkomend wil Geel bv. ook woonuitbreidingsgebieden herbestemmen naar open ruimte. KAART 1 OPEN RUIMTE SYSTEEM GEEL Stad Geel - DNA onderzoek - bron beleidsplan ruimte Geel 2017  DEZE KAART KAN NOOIT LOS VAN DE BEGELEIDENDE TEKST WORDEN GEÏNTERPRETEERD OF GEPUBLICEERD	
TREKKER	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be	
CONTACTPERSOON	Bas Van der Veken Bas.vanderveken@rlkgn.be Coördinator RLKGN Els Oostvogels Els.oostvogels@rlkgn.be RLKGN en IOED Land van Nete en Aa	

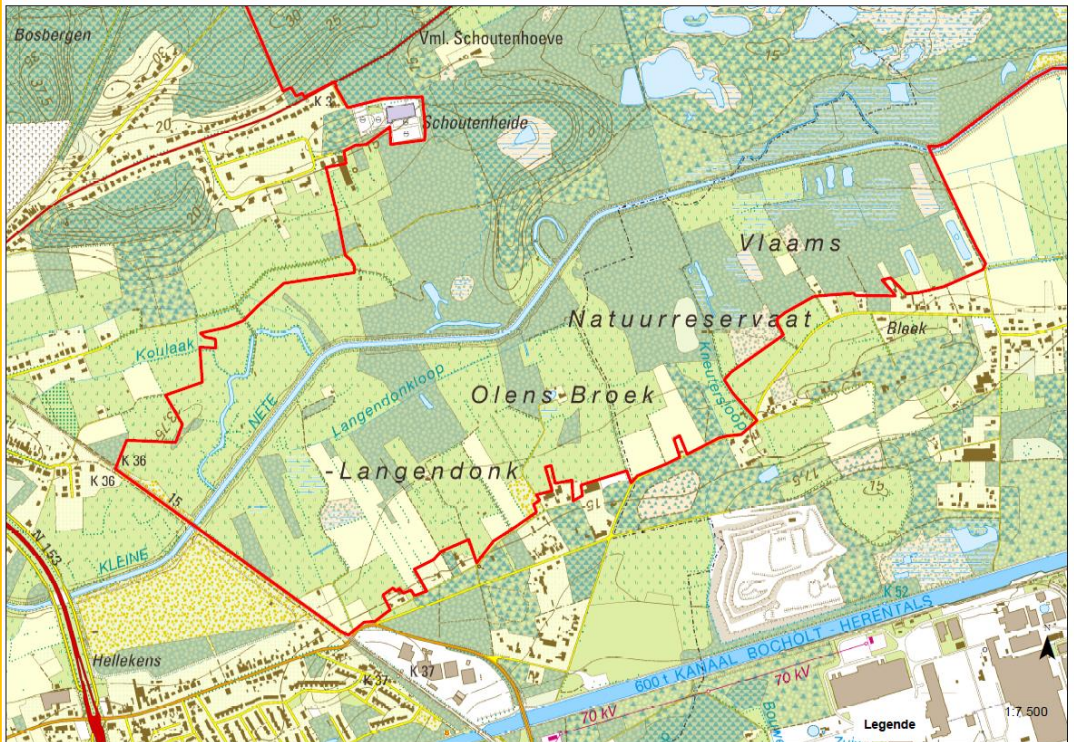
PARTNERS	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, Geel, bureau Omgeving	
LOCATIE	Geel	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN	Visienota 2 ^{de} helft 2019	
MIJLPALEN		
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	• Twee terreinbezoeken in mei, telkens van 6u: - Noordelijke helft van Geel - Zuidelijke helft van Geel • Kwaliteitsbewaking tussentijdse nota en kaartenbundel met voornamelijk analyse materiaal en omschrijving van de uitdagingen • Opmaak bestek voor studie 'Inrichtingsvisie en opmaken van ruimtelijk uitvoeringsplan voor de groene dooradering van Geel'	
VERDERE PLANNING	• De studie werd afgerond • Gunningsprocedure voor studie 'Inrichtingsvisie en opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan voor de groene dooradering van Geel'	
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Actie 6.1: Trage wegen	
COMMUNICATIE		

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.3.Sanering Kneutersloop
 Uitvoering Hefboomproject 'Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete'

HEFBOOMPROJECT	Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete	
ACTIE NR. 6.3	Sanering Kneutersloop	
	Zowel de bedding als de oevers van de Kneutersloop zijn vervuild door de lozingen/ruiming in het verleden. Aurubis loosde in het verleden bedrijfsafvalwater (effluent) in de Bouwensloop/Kneutersloop die voor een deel door het Olens Broek loopt. Verplichting ikv verleende milieuvergunning was een afkoppeling van het afvalwater van de Kneutersloop en aanleg van een effluentleiding naar Kleine Nete tegen 1 december 2015. Het bedrijf bouwde een nieuwe (geperste) effluentleiding vanaf hun waterzuiveringsinstallatie tot aan de Kleine Nete waardoor het gezuiverde afvalwater niet meer door het Olens Broek loopt. In de milieuvergunning werd eveneens opgenomen dat zij op hun site maatregelen moesten nemen om het overstort naar Kneutersloop maximaal te beperken. Nu het lozingspunt (grotendeels) verlegd is, is er de mogelijkheid om de vervuilingproblematiek aan te pakken. De noodzaak tot aanpak is duidelijk. In functie van behoud van Europees beschermde natuur zijn inrichtingswerken aan de Kneutersloop nodig. De Kneutersloop, die het Olens Broek doorsnijdt, heeft immers een verdrogend effect op de aanwezige (Europees beschermde) natuur. De loop vangt vrij veel kwelwater weg uit het natuurgebied. Wanneer dit negatief effect kan worden opgeheven, kan de natuur zich herstellen (bron: https://dokumen.tips/documents/eindrapport-ecohyd-kleinenete-finaal.html). Verondieping is één van de mogelijke remediëringen. Bovendien ligt de loop in speerpuntgebied, een gebied waar prioritair moet ingezet worden op het behalen van de goede toestand van het water. Er zijn echter nog veel openstaande vragen mbt het vervuilde slib en de oevers, aansprakelijkheid,...	
TREKKER	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be	
CONTACTPERSOON	Kirsten Schoonaert kirsten.schoonaert@rlkgn.be Projectcoördinator Strategisch project	
PARTNERS	VMM, ANB, OVAM, Olen, provincie Antwerpen	
LOCATIE	Olen, mondingsgebied Kneutersloop in Kleine Nete	
AFSPRAKEN FINANCIERING	Te bepalen	
TERMIJN	Te bepalen	
MIJLPALLEN		

HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Vorbereiding opmaak bestek ifv waterbodemonderzoek ikv sanering Kneutersloop; de verschillende partners verzamelden alle beschikbare informatie over de Kneutersloop als input voor het bestek
VERDERE PLANNING	Opmaak bestek ifv waterbodemonderzoek ikv sanering Kneutersloop
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	
COMMUNICATIE	

STAND VAN ZAKEN Actiefiche nr. 6.4. Verdrogingsproblematiek Olens Broek
Uitvoering Hefboomproject 'Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete'

HEFBOOMPROJECT	Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete	
ACTIE NR. 6.4	Verdrogingsproblematiek Olens Broek	
	Kenmerkend voor het Olens Broek/ Langendonk zijn de aanwezigheid van een mozaïek aan biotopen zoals elzenbroekbossen, traagstromende en stilstaande wateren, natte schraalgraslanden, ruigtes, rietmoerassen. De taakstelling voor dit gebied is het realiseren van een natte natuurkern van > 150 ha. Te lage grondwaterstanden zorgen echter voor een achteruitgang van de aanwezige habitats waardoor de (door Europe verplichte) stand still niet gegarandeerd wordt. De realisatie van de natte natuurkern zoals opgenomen in het S-IHD besluit wordt hierdoor gehypothekeerd. 	
TREKKER	Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete – www.rlkgn.be	
CONTACTPERSOON	Kirsten Schoonaert kirsten.schoonaert@rlkgn.be projectcoördinator strategisch project Lennert Damen Lennert.damen@vlaanderen.be	

	Gebiedscoördinator Kleine en Grote Nete	
PARTNERS	Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete	
LOCATIE	Herentals, Olen	
AFSPRAKEN FINANCIERING		
TERMIJN		
MIJLPALEN		
HUIDIGE STAND VAN ZAKEN	Eerste analyse door ANB naar mogelijke oorzaken verdroging: • Uit peilgegevens blijkt een daling van de grondwaterstand met ongeveer 1,2 m op 100 jaar (oa door rechte trekken Kleine Nete) • De bedding van de Kneutersloop ligt onder het maaiveld en werkt daardoor sterk drainerend • Grote hoeveelheden grondwater worden in de omgeving opgepompt (tot 3 mlj m³) • Er zijn eveneens grondwaterwinningen om verontreiniging vanuit aanwezige stortplaatsen te voorkomen (mogelijk vervuild percolaatwater afkomstig van de stortplaatsen) • Perioden van extreme droogte • Sterk verminderde vegetatie in de Kleine Nete zorgt mogelijk voor drainerend effect	
VERDERE PLANNING	• Bovenstaande analyse moet verder onderzocht worden zodat gerichte maatregelen kunnen genomen worden (hermeandering Kleine Nete (reeds voorzien VMM), te onderzoeken: sanering en verondieping Kneutersloop, verondiepen andere grachten, grondwatergebruik en terugpompen grondwater evalueren, ...) • Partnerschap moet nog verder samengesteld worden • Verder opvolging van de grondwaterstanden en de ecologische waarden van het gebied	
AFHANKELIJKHEID ANDERE ACTIES EN PROJECTEN.	Afstemming met: • Actie 6.3	
COMMUNICATIE		
